


</

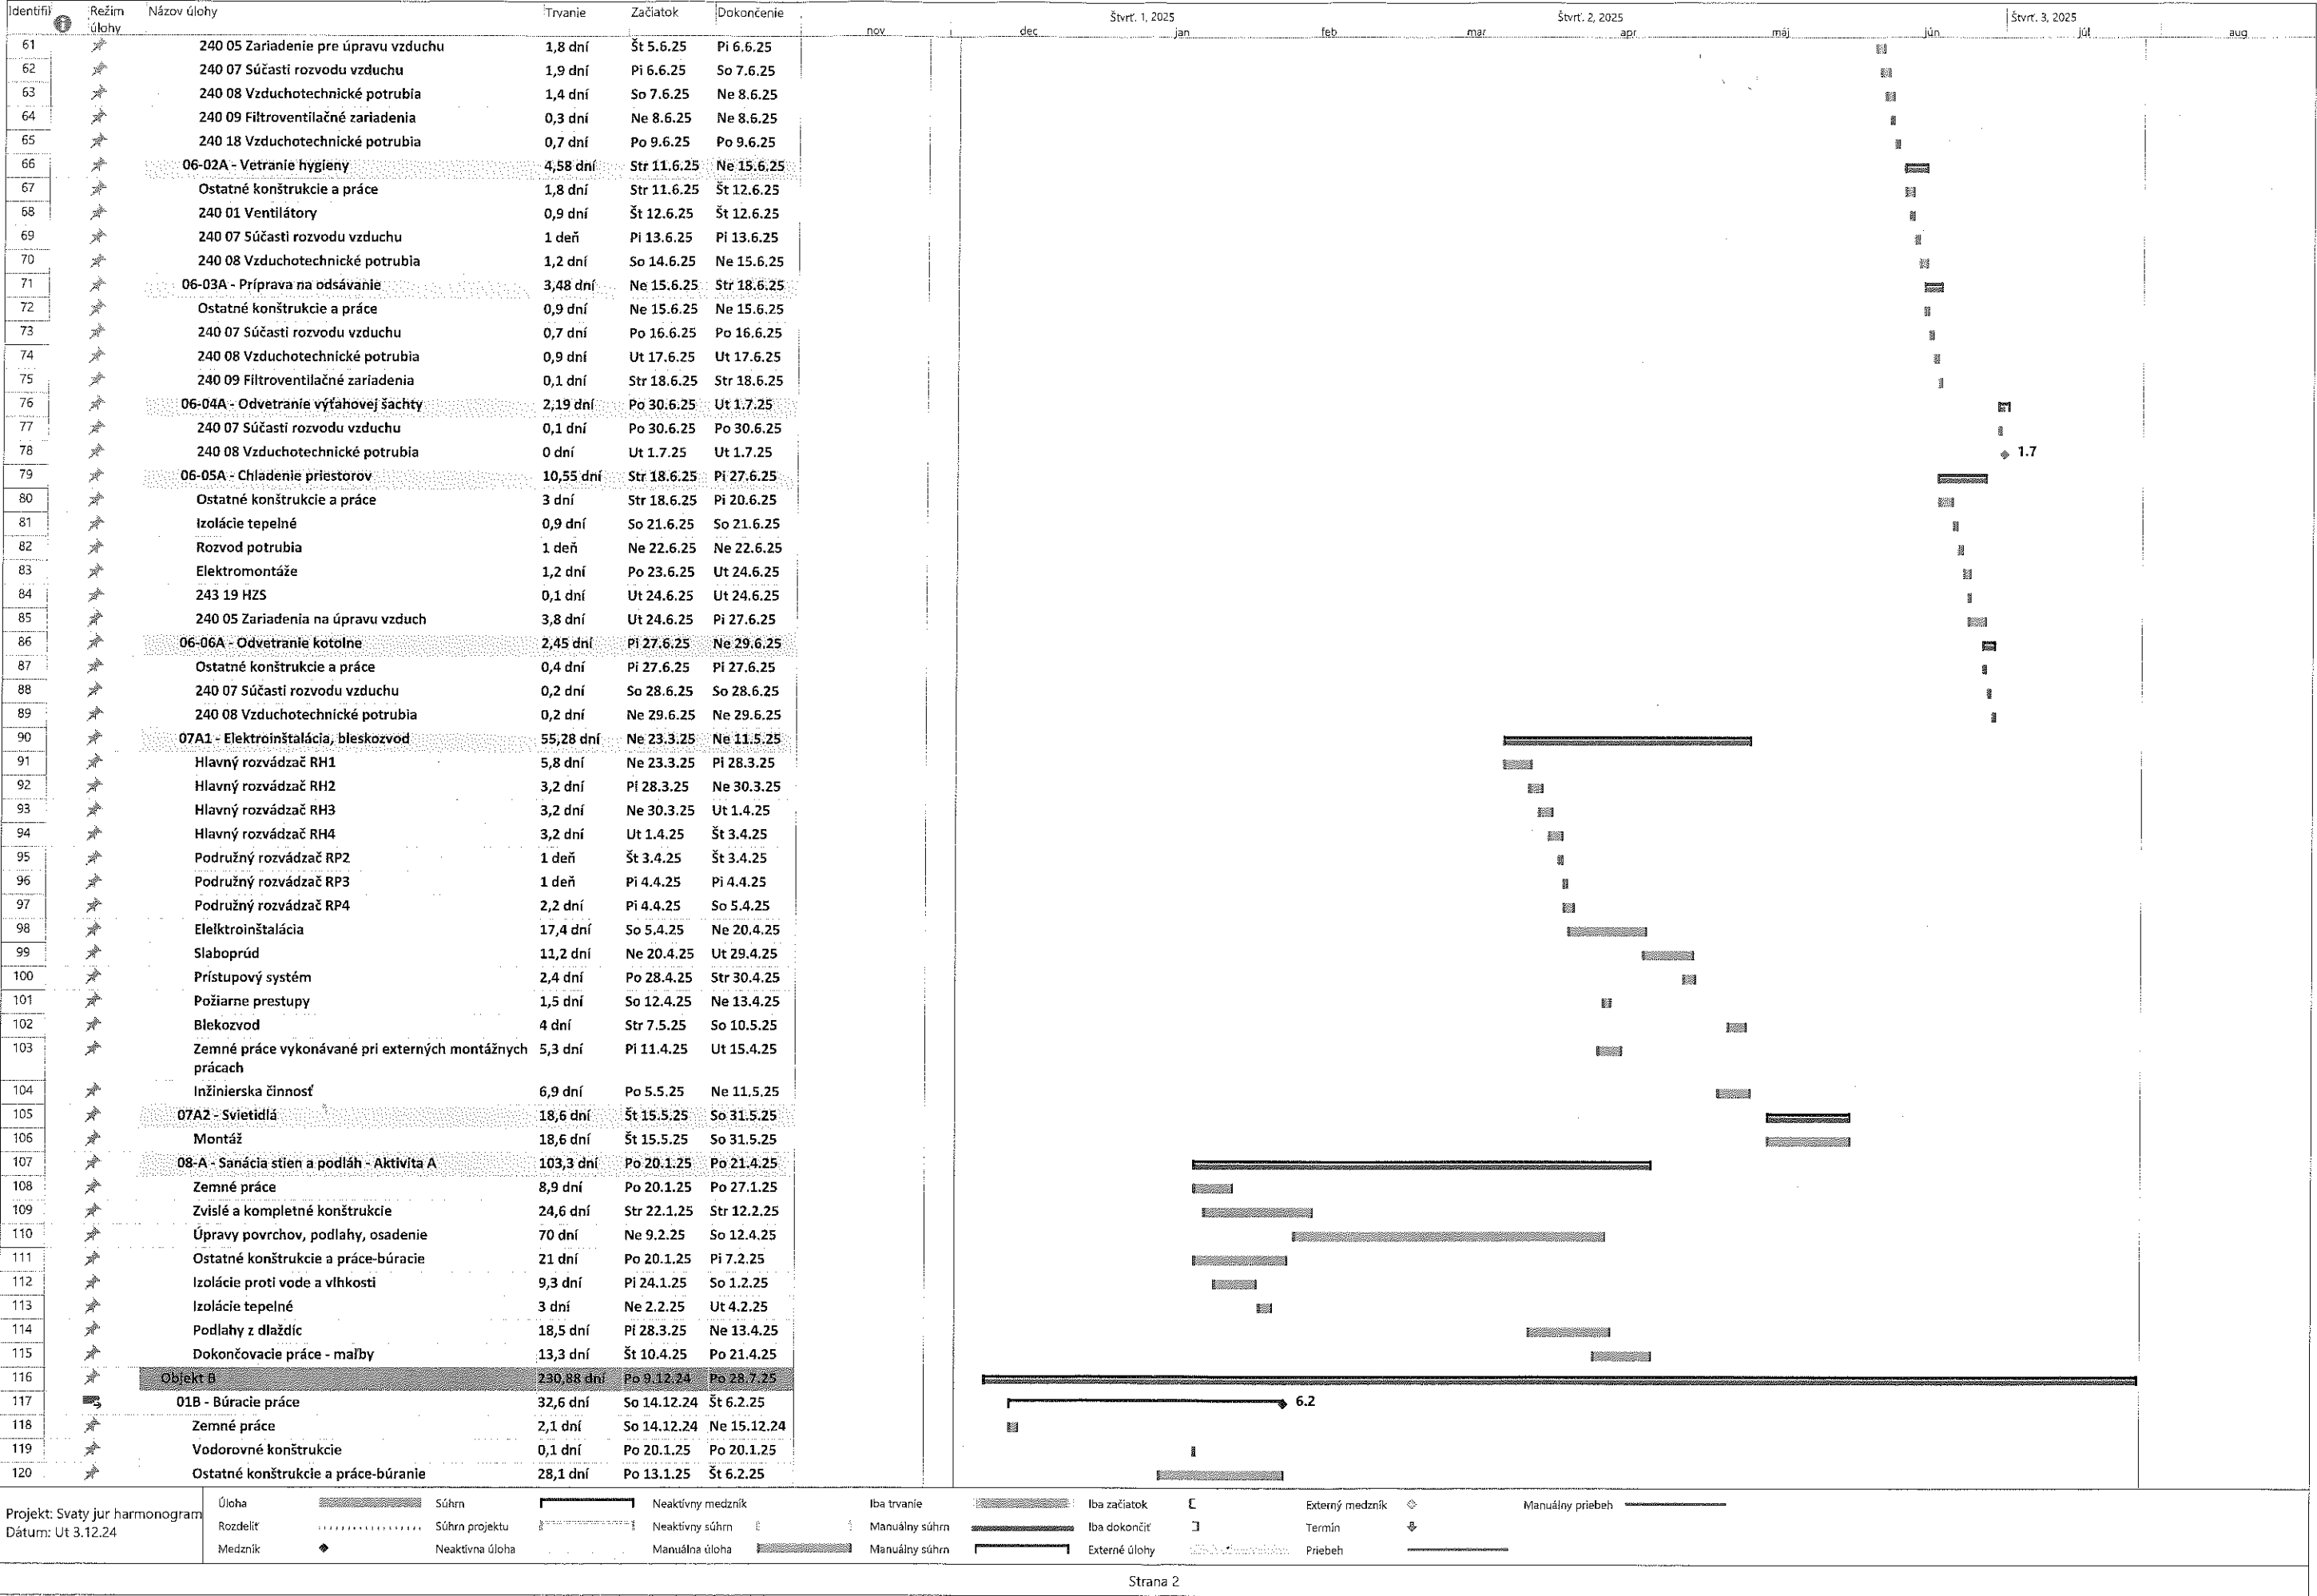

Identifik.	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	nov	dec	Štvrť. 1, 2025	jan	feb	mar	Štvrť. 2, 2025	apr	máj	jún	Štvrť. 3, 2025	júl	aug
121	✖	Zdravotechnika - zariadenie predmety	0,3 dní	Ut 17.12.24	Ut 17.12.24													
122	✖	Konštrukcie doplnkové kovové	0,9 dní	Ut 17.12.24	Ut 17.12.24													
123	✖	Podlahy vlysové a parketové	3,3 dní	Ne 15.12.24	Ut 17.12.24													
124	✖	Podlahy povlakové	0,4 dní	So 14.12.24	So 14.12.24													
125	✖	Búranie kuchynského výfahu vrátane strojovne	0,6 dní	Ut 17.12.24	Ut 17.12.24													
126	✖	02B - Návrh	140,56 dní	Po 13.1.25	So 17.5.25													
127	✖	Zakladanie	2,7 dní	Po 13.1.25	Str 15.1.25													
128	✖	Zvislé a kompletne konštrukcie	6,69 dní	Po 13.1.25	So 18.1.25													
129	✖	Zvislé a kompletne konštrukcie	14 dní	Po 20.1.25	So 1.2.25													
130	✖	Vodorovné konštrukcie	8,1 dní	Ut 21.1.25	Ut 28.1.25													
131	✖	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14,7 dní	Str 29.1.25	Ut 11.2.25													
132	✖	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6,3 dní	So 1.2.25	Št 6.2.25													
133	✖	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,6 dní	Str 29.1.25	Str 29.1.25													
134	✖	Konštrukcie tesárske	1,9 dní	Št 30.1.25	Pi 31.1.25													
135	✖	Konštrukcie - drevostavby	18,2 dní	Št 27.3.25	So 12.4.25													
136	✖	Konštrukcie stolárske	1,9 dní	Št 13.3.25	Pi 14.3.25													
137	✖	Konštrukcie doplnkové kovové	2,7 dní	So 15.3.25	Po 17.3.25													
138	✖	Podlahy z dlaždíc	4 dní	So 26.4.25	Ut 29.4.25													
139	✖	Podlahy z liateho teraca	10,8 dní	Po 14.4.25	Str 23.4.25													
140	✖	Podlahy vlysové a parketové	11,9 dní	Št 1.5.25	Ne 11.5.25													
141	✖	Podlahy povlakové	1,5 dní	Ut 29.4.25	Str 30.4.25													
142	✖	Obklady	10,5 dní	Str 16.4.25	Pi 25.4.25													
143	✖	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	11,5 dní	Str 23.4.25	So 3.5.25													
144	✖	Nátery	10,2 dní	Št 8.5.25	So 17.5.25													
145	✖	Maľby	2 dní	Ne 11.5.25	Po 12.5.25													
146	✖	Zasklievanie	2,2 dní	Po 14.4.25	Ut 15.4.25													
147	✖	Mobilná stena	1,8 dní	Str 16.4.25	Št 17.4.25													
148	✖	03B - Prístavba výfahu	47,6 dní	Pi 16.5.25	Pi 27.6.25													
149	✖	Zemné práce	1 deň	Ne 18.5.25	Ne 18.5.25													
150	✖	Zemné práce - odstránenie debnenia	0,7 dní	Št 22.5.25	Št 22.5.25													
151	✖	Zakladanie	0,7 dní	Po 19.5.25	Po 19.5.25													
152	✖	Vodorovné konštrukcie	1 deň	Ut 20.5.25	Ut 20.5.25													
153	✖	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1,1 dní	Str 21.5.25	Str 21.5.25													
154	✖	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 deň	Št 22.5.25	Št 22.5.25													
155	✖	Izolácie striech, povlakové krytiny	0,2 dní	Pi 23.5.25	Pi 23.5.25													
156	✖	Izolácie tepelné	0,4 dní	So 24.5.25	So 24.5.25													
157	✖	Konštrukcie doplnkové kovové	7,7 dní	Ne 25.5.25	So 31.5.25													
158	✖	Nátery	1 deň	So 31.5.25	So 31.5.25													
159	✖	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	47,6 dní	Pi 16.5.25	Pi 27.6.25													
160	✖	04B - podlahové konštrukcie - kamenná dlažba P14	17,75 dní	Št 3.7.25	Pi 18.7.25													
161	✖	Zakladanie	0,3 dní	Št 3.7.25	Št 3.7.25													
162	✖	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9,5 dní	Pi 4.7.25	So 12.7.25													
163	✖	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,7 dní	So 12.7.25	So 12.7.25													
164	✖	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	6,5 dní	Ne 13.7.25	Pi 18.7.25													
165	✖	05B - podlahové konštrukcie - kamenná dlažba P15	6,85 dní	Pi 18.7.25	Št 24.7.25													
166	✖	Zakladanie	0,1 dní	Pi 18.7.25	Pi 18.7.25													
167	✖	Komunikácie	1 deň	So 19.7.25	So 19.7.25													
168	✖	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3,9 dní	Ne 20.7.25	Str 23.7.25													
169	✖	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,1 dní	Št 24.7.25	Št 24.7.25													
170	✖	07B - Prípojka NN	6,69 dní	Št 13.3.25	Ut 18.3.25													
171	✖	Prípojka	0,8 dní	Po 17.3.25	Po 17.3.25													
172	✖	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1,2 dní	Pi 14.3.25	So 15.3.25													
173	✖	Inžinierska činnosť	4,8 dní	Št 13.3.25	Po 17.3.25													
174	✖	Ostatné	230,88 dní	Po 9.12.24	Po 28.7.25													
175	✖	zariadenie staveniska	5 dní	Po 9.12.24	Pi 13.12.24													
176	✖	zrušenie staveniska	4 dní	Št 24.7.25	Ne 27.7.25													
177	✖	geodetické práce + čas na opravy	12,31 dní	Št 17.7.25	Ne 27.7.25													

Projekt: Svaty Jur harmonogram
Dátum: Ut 3.12.24

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termín

Priebeh

Manuálny priebeh
