

SUMAR

Zmeny počas realizácie stavebného diela

Stavba: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava

Zmena č.	Obsah	Suma zmenového listu			Stav	Dátum predloženia	Dátum schválenia	Objekt
		SPOLU	Prípočet	Odpočet				
01	Prípočet - Požiarová nádrž	13 643,40 €	13 643,40 €		Podpísané projektantom	2.4.2019		SO 01.4 Zdravotechnika
02	Prípočet - Základové pásy pod vstavky a oceľové schodisko	3 556,34 €	3 556,34 €		Podpísané projektantom	2.4.2019		SO 01.1 Architektúra, statika
03	Prípočet - Búranie priečky v miestnosti 2.02	233,43 €	233,43 €		Podpísané projektantom	19.3.2019		SO 01.1 Architektúra, statika
04	Zmena rozmerov výťahu	2 446,02 €	26 906,20 €	-24 460,18 €	Podpísané projektantom	12.3.2019		SO 01.10 Výťah
05	Prípočet - Doplnenie elektricky ovládaných okien do svetlíka	9 638,91 €	9 638,91 €		Podpísané projektantom	12.3.2019		SO 01.6 Umelé osvetlenie
06	Prípočet - Demontáže potrubia požiarnej vody	537,00 €	537,00 €		Odsúhlasené	7.5.2019		SO 01.4 Zdravotechnika
07	Prípočet - Preklady do nových konštrukcií	274,88 €	274,88 €		Odsúhlasené	7.5.2019		SO 01.1 Architektúra, statika
08	Odpočet - Práce v trafostanici	-4 289,73 €		-4 289,73 €	Odsúhlasené	7.5.2019		SO 01.1 Architektúra, statika / SO 01.6 Umelé osvetlenie
09	Prípočet - Búranie priečok nad podhľadom a realizácia nového podhľadu	3 221,22 €	3 221,22 €		Odsúhlasené	7.5.2019		SO 01.1 Architektúra, statika
10	Prípočet - Búranie deliacich stien v úrovni svetlíkov	987,01 €	987,01 €		Odsúhlasené	7.5.2019		SO 01.1 Architektúra, statika
11	Prípočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44	7 665,47 €	7 665,47 €		Odsúhlasené	7.5.2019		SO 01.1 Architektúra, statika
12	Odpočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44	-878,08 €		-878,08 €	Odsúhlasené	7.5.2019		SO 01.1 Architektúra, statika
13	Prípočet - Úprava nadpražia pre polykarbonátové steny	1 411,76 €	1 411,76 €		Odsúhlasené	7.5.2019		SO 01.1 Architektúra, statika
14	Prípočet - Odstránenie nevyhovujúcej podkladnej vrstvy podlahy, nový cementový poter a úprava drážok po montáži káblových rozvodov na ZNP	10 390,66 €	10 390,66 €		Odsúhlasené	7.5.2019		SO 01.1 Architektúra, statika
15	Prípočet - Úprava skladby podlahy dobetónovaním	21 537,79 €	21 537,79 €		Odsúhlasené	7.5.2019		SO 01.1 Architektúra, statika
16	Prípočet - Náter oceľových profilov pod svetlíkmi	2 156,61 €	2 156,61 €		Odsúhlasené	13.5.2019		SO 01.1 Architektúra, statika
17	Prípočet - Vnútné a vonkajšie parapety k exteriérovým zaskleným stenám	6 506,13 €	6 506,13 €		Odsúhlasené	13.5.2019		SO 01.1 Architektúra, statika
18	Prípočet - Preklady nad pôvodné dverné otvory	3 615,23 €	3 615,23 €		Odsúhlasené	13.5.2019		SO 01.1 Architektúra, statika

SPOLU

82 654,05 € 112 282,04 € -29 627,99 €

Voigograd, a.s.
IČO: 44 686 921 IČDA: SK2022557749 (3)

04 0 61 9



Strana 1

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

PRÍKAZ K ZMENE č. 1
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	
		zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 01		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:			
Prípočet - Požiarná nádrž			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:			
Počas realizácie stavebných prác bol zistený nesúlad medzi DRS a výkonom výmer. Ide o nevyhnutné (doplňujúce) stavebné práce, ktoré boli zistené počas realizácie stavebných prác, a ktoré majú vplyv na získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia.			
Dohodnutá cena zmeny: 13 643,40 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):			
Má dopad na celkový termín			
Prílohy: Rozpočet 01 - Prípočet - Požiarná nádrž, Technická dokumentácia požiarna nádrže			
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE			
Od tlačok pečiatky		Meno / Podpis	Dátum
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06		 Mgr. Juraj Droba	04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		 Ing. Tomáš Saloky	04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor:		 Ing. Radoslav Štefančík	04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:		 Ing. Radoslav Štefančík	04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐			
Počet originálov: 4			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

01 - Prípočet - Požiarná nádrž

JKSO:

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 643,40

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

13 643,40

20,00%

2 728,68

Cena s DPH

v EUR

16 372,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 108
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľgogradská 9, 180 01 Prahou
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

04 0 6 1 9

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21
Objekt: Zmenové listy
Časť: 01 - Prípočet - Požiarná nádrž

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:
Projektant: ENDORFINE, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	13 643,40
HSV - Práce a dodávky HSV	13 643,40
1 - Zemné práce	4 251,41
2 - Zakladanie	1 020,65
8 - Rúrové vedenie	8 147,29
99 - Presun hmôt HSV	224,05

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

01 - Prípočet - Požiarná nádrž

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 643,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 643,40

D 1

Zemné práce

4 251,41

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	200,371	4,15	831,54
Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 2 Hĺbka výkopu: 2,15+1+0,05+0,15+0,15=3,50m Šírka výkopu: 3,7+0,8+0,8 (manipulačný priestor) = 5,3 m Dĺžka výkopu: 4,8+0,8+0,8 (manipulačný priestor) = 6,4 m Objem výkopu 3,5*5,3*6,4118,720 Medzisúčtet118,720 Svahovanie do 1,5 m (1:0,5) 5,3*1,5*0,75/2*25,963 6,4*1,5*0,75/2*27,200 Svahovanie nad 2 m (1:1) (5,3+0,75+0,75)*2*2/2*227,200 (6,4+0,75+0,75)*2*2/2*231,600 Rohy do 1,5 m 1,5*0,75*1,5/4*41,688 Rohy nad 1,5 m 2*2*2/4*48,000 Súčtet200,371							
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	200,371	0,79	158,29
Poznámka k položke: Rozbor TOV položky 03 - 02							
3	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	20,037	20,04	401,54
Poznámka k položke: Rozbor TOV položky 03 - 03 Predpoklad cca 10 % 200,371*0,120,037 Súčtet20,037							
4	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu	m	49,400	4,91	242,55
Poznámka k položke: Rozbor TOV položky 03 - 04 (5,3+0,75+2+0,5+0,75+2+0,5)*2+(6,4+0,75+2+0,5+0,75+2+0,5)*249,400 Súčtet49,400							
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50m	m3	296,630	1,38	409,35
Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 6 Premiestnenie zeminy na spätný zásyp - tam + naspäť 148,315*2296,630 Súčtet296,630							
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,056	3,64	189,48
Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 7 Prebytočná zemina odvoz na skládku (výkopy - zásyp) 200,371-148,31552,056 Súčtet52,056							
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	624,672	0,36	224,88
Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 8 Prebytočná zemina odvoz na skládku (výkopy - zásyp) Poznámka zo ZoD: Odvoz zeminy uvažovaný na skládku do 15 km, dodávateľ si nacení podľa svojich možností 52,056*12624,672							


DAG SLOVAKIA, a.s.
 Bratislava
 Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	148,315	5,29	784,59
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka zo ZOD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"</i> <i>Číslo položky 9</i>				
	W		Zemina na spätný zásyp				
	W		148,315		148,315		
	W		Súčet		148,315		
10	K	171201201	Uloženie spaniny na skládky do 100 m3	m3	148,315	0,71	105,30
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka zo ZOD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"</i> <i>Číslo položky 10</i>				
	W		Zemina na spätný zásyp				
	W		148,315		148,315		
	W		Súčet		148,315		
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	52,056	9,28	483,08
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka zo ZOD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"</i> <i>Číslo položky 11</i>				
	W		Prebytočná zemina				
	W		52,056		52,056		
	W		Súčet		52,056		
12	K	17410-1002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	148,315	2,52	373,75
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka zo ZOD rozpočtu: "SO 01.4 Zdravotechnika"</i> <i>Číslo položky 15</i>				
	W		Výkop				
	W		200,371		200,371		
	W		Odpočet: Požiarná nádrž				
	W		(3,7*4,8*2,15)*-1		-38,184		
	W		Odpočet: Kónus				
	W		2*(1*1)*-1		-2,000		
	W		Odpočet: Štrk+Piesok+Betón (hr. 0,05+0,15+0,15)				
	W		((0,05+0,15+0,15)*(5,3*6,4))*-1		-11,672		
	W		Súčet		148,315		
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	112,058	0,42	47,06
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Rozbor TOV položky 03 - 13</i>				
	W		Plocha výkopu				
	W		(5,3+2+0,75+2)*(6,4+2+0,75+2)		112,058		
	W		Súčet		112,058		
	D	2	Zakladanie				1 020,65
14	K	211571122	Výplň rýh s úpravou povrchu pieskom fr. 0-4mm	m3	1,696	28,51	48,35
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka zo ZOD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"</i> <i>Číslo položky 13</i>				
	W		Piesková lôžka 5 cm				
	W		5,3*6,4*0,05		1,696		
	W		Súčet		1,696		
15	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	33,920	0,20	6,78
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Rozbor TOV položky 03 - 15</i>				
	W		5,3*6,4		33,920		
16	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,088	39,53	201,13
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Rozbor TOV položky 03 - 16</i>				
	W		Štrkový násyp				
	W		5,3*6,4*0,15		5,088		
	W		Súčet		5,088		
17	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,266	97,36	512,70
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Rozbor TOV položky 03 - 17</i>				
	W		Podkladný betón				
	W		5,3*6,4*0,15*1,035		5,266		
	W		Súčet		5,266		
20	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	33,920	7,42	251,69
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Rozbor TOV položky 03 - 20</i>				
	W		Kari sieť v jednej vrstve				
	W		5,3*6,4		33,920		
	W		Súčet		33,920		
	D	8	Rúrové vedenie				8 147,29
21	K	894101113	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	2,000	154,19	308,38
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Rozbor TOV položky 03 - 21</i>				
22	K	894102212	Osadenie železobetónového stropu akumuláčnej nádrže, hmotnosti nad 1 t	ks	2,000	12,02	24,04
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Rozbor TOV položky 03 - 22</i>				
23	M	594340000600	Akumulačná nádrž ZAPPA, 15 m3 s využitelným objemom min. 12,5 m3, v zelenom pásme	ks	2,000	3 541,54	7 083,08
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Objem nádrže 15 m3. Hmotnosť nádrže 13 t.</i> <i>Jednotková cena: CENKROS 4</i>				


 Voig
 IČO: 47 856 021 IČPK: SK2022557749 [3]

AKUMULAČNÁ NÁDRŽ "AN 30 ZAPPA"

REZ A-A':
M 1:50

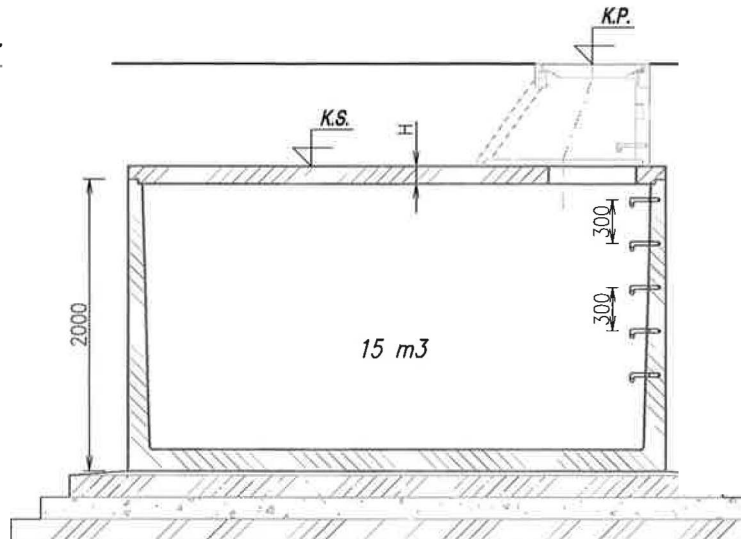


LEGENDA :

K.P. KÓTA POKLOPU
K.S. KÓTA STROPU NÁDRŽE
K.D. KÓTA DNA NÁDRŽE
K.V. KÓTA DNA VÝKOPU

K.D.



PÔDORYS:
M 1:50

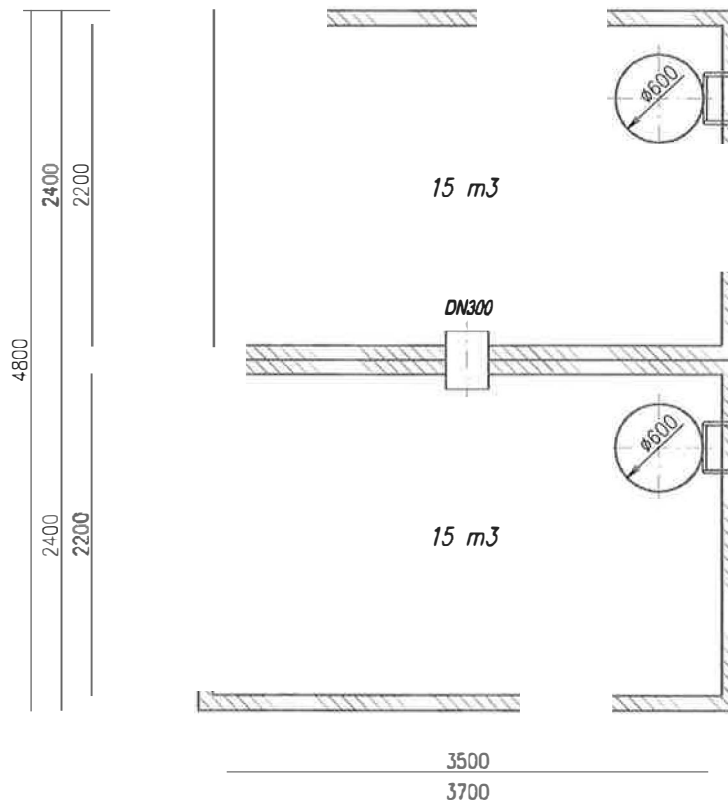

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voi 21. a 9. 080 01 Prešov
IČO : 606 021 IČPH: SK2022657749




Pozn. :

1. PREPOJENIE NÁDRŽÍ REALIZOVANÉ JADROVÝM VRTANÍM !
2. NA PREPOJENIE NÁDRŽÍ BUDE POUŽITÉ HLADKÉ POTRUBIE PVC Ø315 mm (DN300) !
3. NA UTESNENIE PREPOJOV NÁDRŽÍ BUDE POUŽITÁ TESNIACA ZMES RESP. GUMENÉ TESNENIE !
4. VÝŠKA STROPNEJ DOSKY H=120-200 mm !

VÝROBCA : ZAPPA s.r.o. Borovce č. 358, 922 09 Borovce, okres Piešťany		ZAPPA s.r.o. Ján ZÁVODNÝ mobil : +421 905 279 013, www.zappa.sk IČO : 46 491 511, DIČ : 2023416890	
HMOTNOSŤ NÁDRŽE	2 x 9,8 t	CELKOVÁ HMOTNOSŤ :	24,8 t
HMOTNOSŤ STROP. DOSKY :	2 x 2,6 t	CELKOVÝ OBJEM NÁDRŽÍ :	30 m³
NÁZOV : AKUMULAČNÁ NÁDRŽ "AN 30 ZAPPA"		MIERKA 1:50	Č. VÝKRESU

PRÍKAZ K ZMENE č. 02
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 02 Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Prípočet - Základové pásy pod vstavky a oceľové schodisko	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Ide o nepredvídateľné a nevyhnutné (doplňujúce) stavebné práce. Nesúlad vznikol medzi projektovou dokumentáciou časť statika, kde neboli zakreslené základové pásy a výkazom výmer. Ide o dodanie a montáž základových pásov pod vstavky a exteriérové schodisko spolu s príslušnými zemnými a stavebnými prácami.	
Dohodnutá cena zmeny: 3 556,34 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet 02 - Prípočet - Základové pásy pod vstavky a oceľové schodisko	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
Odtlačok pečiatky	Menlo/Podpis
Súhlas zástupcu Objednávateľa:  Ing. Pavol Liška 04 0 6 1 9	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:  04 0 6 1 9	
Súhlas Stavebný dozor:  04 0 6 1 9	
Súhlas Projektant:  04 0 6 1 9	
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐	
Počet originálov: 4	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

02 - Prípočet - Základové pásy pod vstavy a oceľové schodisko

JKSO:

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 556,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 556,34	20,00%	711,27

Cena s DPH

v EUR

4 267,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 108
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľgoveradská 9, 090 01 Prešov
IČO: 44 506 021 IČDPH: SK2022857749 (A)

04 06 19

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

02 - Prípočet - Základové pásy pod vstavky a oceľové schodisko

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 556,34

HSV - Práce a dodávky HSV

3 556,34

1 - Zemné práce

1 033,37

2 - Zakladanie

879,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 575,83

99 - Presun hmôt HSV

67,26

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

02 - Prípočet - Základové pásy pod vstavky a ocel'ové schodisko

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 556,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 556,34

D 1

Zemné práce

1 033,37

1	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	9,532	62,20	592,89
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

P
Poznámka k položke:
Rozbor TOV položky 04 - 01
 Vstavok 1.47
 (0,76-0,38)*(0,6)*(7,25*2)
 Medzisúččet
 Vstavok 1.36
 (0,76)*(0,6)*(6,5)
 Medzisúččet
 Schodisko
 (0,9)*(0,6)*(1,51)*4
 Medzisúččet
 Súčet

3,306
 3,306
 2,964
 2,964
 3,262
 3,262
 8,532

2	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	9,532	12,89	122,87
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

P
Poznámka k položke:
Rozbor TOV položky 04 - 02

3	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	9,532	8,70	82,93
---	---	------------	--	----	-------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.4 Zdravotechnika
Číslo položky 10

4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 50m	m3	3,532	1,38	13,15
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 6

0

5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,532	3,64	34,70
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 7

6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	114,384	0,36	41,18
---	---	-----------	--	----	---------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 8

7	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,532	5,29	50,42
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 9

8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,532	0,71	6,77
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 10

9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	9,532	9,28	88,46
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 11

0

D 2

Zakladanie

879,88

10	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	16,224	0,20	3,24
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

P
Poznámka k položke:
Rozbor TOV položky 04 - 10
 Vstavok 1.47
 0,6*7,25*2
 Medzisúččet
 Vstavok 1.36
 0,6*6,5
 Medzisúččet
 Schodisko
 0,6*1,51*4

8,700
 8,700
 3,900
 3,900
 3,624

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčt		3,624		
	VV		Súčt		16,224		
20	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	9,146	95,85	876,64
	VV		Vstavok 1.47				
	VV		(0,5)*0,6*7,25*2*1,035		4,502		
	VV		Medzisúčt		4,502		
	VV		Vstavok 1.36				
	VV		(0,5)*0,6*6,5*1,035		2,018		
	VV		Medzisúčt		2,018		
	VV		Schodisko				
	VV		(0,7)*0,6*1,51*4*1,035		2,626		
	VV		Medzisúčt		2,626		
	VV		Súčt		9,146		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 575,83
14	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	11,919	53,10	632,90
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 111				
	VV		Vybúranie betónu pod vstavok 1.47				
	VV		(1,5+0,1+1,8+0,8+0,25+0,8+1,55+0,15)*(0,6+3,45+0,6+3,325+0,6)*0,2		11,919		
	VV		Súčt		11,919		
15	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami (štrk), hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	11,919	9,38	111,80
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 120				
	VV		Vybúranie násypu pod vstavok 1.47				
	VV		(1,5+0,1+1,8+0,8+0,25+0,8+1,55+0,15)*(0,6+3,45+0,6+3,325+0,6)*0,2		11,919		
	VV		Súčt		11,919		
16	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	42,908	6,65	285,34
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 165				
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,908	6,72	288,34
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 168				
18	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	343,264	0,75	257,45
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 169				
	VV		42,908*8 'Přepočítané koeficientom množstva		343,264		
D	99		Presun hmôt HSV				67,26
19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,260	3,32	67,26
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 173				

PRÍKAZ K ZMENE č. 03
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia ČOV Ivanská cesta 21			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 03		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:			
Prípočet - Búranie priečky v miestnosti 2.02			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:			
Počas realizácie stavebných prác bol zistený nesúlad medzi DRS a výkazom výmer. Ide o nevyhnutné (doplňujúce) stavebné práce, nakoľko DRS neuvažovala s vybúraním tejto priečky ani s príslúchajúcimi stavebnými prácami.			
Dohodnutá cena zmeny: 233,43 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):			
Má dopad na celkový termín			
Prílohy: Rozpočet 03 - Prípočet - Búranie priečky v miestnosti 2.02			
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE			
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Medo. Podpis	Dátum
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06		Ing. Pavol Liška	04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			04 0 6 1 9
DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov IČO: 44 886 021 DIČ: SK2022857749/131			04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor:			04 0 6 1 9
Ing. Adriano ORANUSOVA			04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:			04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐			
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

03 - Prípočet - Búranie priečky v miestnosti 2.02

JKSO:

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36436771

SK 2022090653

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

233,43

DPH základná
znižená

Základ dane

233,43

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

46,69

Cena s DPH

v EUR

280,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

04 0 6 1 9

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

03 - Prípočet - Búranie priečky v miestnosti 2.02

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

233,43

HSV - Práce a dodávky HSV

233,43

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

210,22

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23,21

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

03 - Prípočet - Búranie priečky v miestnosti 2.02

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

233,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

233,43

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

210,22

1	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t - B03	m2	33,108	1,76	58,27
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 102

VV

Vybúranie priečky v miestnosti 2.02

VV

(9,335+2,82)*3,02-(2*0,9*2)

33,108

VV

Súčet

33,108

2	K	967031132	Príkreslenie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	1,598	6,05	9,67
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

P

Poznámka k položke:
Rozbor TOV položky 05 - 02
Po vybúraní priečky v miestnosti 2.02

VV

0,15*3,55*3

1,598

VV

Súčet

1,598

3	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t - B02	ks	2,000	0,37	0,74
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 125

VV

Vyvesenie dvier v miestnosti 2,02

VV

2

2,000

VV

Súčet

2,000

4	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,780	2,70	10,21
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 131

VV

Vybúranie zárubní v miestnosti 2.02

VV

2,1*0,9*2

3,780

VV

Súčet

3,780

5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,780	6,65	45,09
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 165

6	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,780	6,72	45,56
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 168

7	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	54,240	0,75	40,68
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 169

VV

6,78*8 'Přepočítané koeficientom množstva

54,240

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23,21

8	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,091	113,80	10,36
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 65

VV

Vyspravenie podkladu pod vybúranú priečku v miestnosti 2.02

VV

(9,335+2,82)*0,15*0,05

0,091

VV

Súčet

0,091

9	K	632477131r	Samonivelačná vyrovnávací vrstva a vysprávková hmota (hr. cca 3mm)	m2	1,823	7,05	12,85
---	---	------------	--	----	-------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 85

VV

Nivelačka po vybúraní priečok v miestnosti 2.02

VV

(9,335+2,82)*0,15

1,823

VV

Súčet

1,823

PRÍKAZ K ZMENE č. 04
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 04 Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Zmena rozmerov výťahu	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Ide o nevyhnutné (dopĺňajúce) stavebné práce. Nesúlad vznikol medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou v zameraní existujúcej výťahovej šachty, kde bolo zistené, že projektovaný výťah nie je možné do existujúcej šachty osadiť. Zhotoviteľ predložil technický návrh atypického riešenia výťahu, ktorý svojimi rozmermi a vybavením spĺňa požiadavky pre imobilné osoby.	
Dohodnutá cena zmeny: 2 446,02 € Prípočet: 26 906,20 € Odpočet: -24 460,18 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Aktualizovaný výkres výťahu doplnený o popis, Rozpočet 04 - Zmena rozmerov výťahu	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa: 	04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: 	04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor: 	04 0 6 1 9
Súhlas Projektant: 	04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐	
Počet originálov: 4	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

04 - Zmena rozmerov výťahu

JKSO:

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 446,02

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

2 446,02

20,00%

489,20

Cena s DPH

v EUR

2 935,22

04 0 6 1 9

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21
Objekt: Zmenové listy
Časť:

04 - Zmena rozmerov výťahu

Miesto:	Ivanská cesta 21, Bratislava	Dátum:	
Objednávateľ:	Bratislavský samosprávny kraj	Projektant:	ENDORFINE, s.r.o.
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 446,02
--------------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt: Zmenové listy

Časť: 04 - Zmena rozmerov výťahu

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

Projektant: ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 446,02

1	K	1.	Montáž a dodávka osobno-nákladný výťah. Nosnosť: 800kg/10osôb Menovitá rýchlosť: 1m/s Strojovňa: bez strojovne, stroj umiestnený pod stropom šachty Pohon: elektrický lanový s plynulou reguláciou frekvenčným meničom Počet podlaží	ks	-1,000	24 460,18	-24 460,18
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka zo ZsD rozpočtu: "SO 01.10 Výťah "</i> <i>Číslo položky 1</i>				
2	K	Výťah 01	Montáž a dodávka osobno-nákladný výťah. Nosnosť: 825kg/9osôb Menovitá rýchlosť: 1m/s, Vnútorň rozmer kabíny 1216x1400x2200 mm	ks	1,000	26 906,20	26 906,20

synergy 200

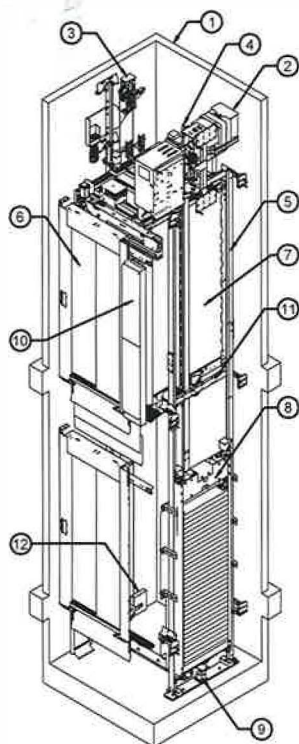

HLAVNÉ DIELY

1. Šachta
2. Stroj
3. Obmedzovač rýchlosti
4. Vodidlá kabíny
5. Vodidlá vyvažacieho závažia
6. Šachtové dvere
7. Kabína
8. Vyvažovacie závažie
9. Nárazník vyvažovacieho závažia
10. Skriňa rozvádzača
11. Konzoly vodidiel
12. Napínacia kladka

Vojtech SLOVAKIA, a.s.
 Vojtechova 9, 080 01 Prešov
 IČO: 44 886 021 KŠCH: SK202857149

POŽIADAVKY KTORÉ MUSÍ ZABEZPEČIŤ ZÁKAZNÍK V ZHODE S UZAVRETOU ZMLUVOU O DIELE:

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

- E1. Rozmery "SW" a "SD" sú rozmery merané vo zvislici, steny musia byť v tolerancii SW: -20/+20 mm, SD: -20/+20 mm.
- E2. Priehľbení musí byť chránená proti prieniku vody, podlaha priehľbne musí byť hladká a približne vodorovná (čl. 5.2.1.9).
- E3. Vyhotovenie šachty musí zodpovedať národným stavebným predpisom a musí odolovať riedkov, nakladanie a vykladanie kabiny atď. (čl. 5.2.1.8.1)
- E4. Vo výťahovej šachte sa nesmú umiestniť žiadne elektrické vedenia alebo iné diely ktoré nepatria k výťahu (čl. 5.2.1.2.1).
- E5. Šachta musí byť vyhotovená z materiálov, ktoré sú schopné izolovať hluk voči príslušným priestorom v súlade s platnými miestnymi národnými nariadeniami.
- E6. Kvalita betónu pri kotvení do betónu by mala byť najmenej C20/25 (25 N/mm²) 250kg/cm² (EN 206). Dôležité pre zaťaženia HR1,HR2,HR3 a HR4 v hlave šachty.
- E7. Šachta musí byť primerane vetraná podľa národných stavebných predpisov, na zaistenie správnej funkcie zariadenia v šachte a v priestore pre strojové zariadenie sa berie do úvahy vyžarovanie tepla zariadením, pričom sa predpokladá udržiavanie teploty od +5° a +40°C (čl. 0.4.16 a 0.4.17). Zariadenie odvádza približne 25% výkonu motora.
- E8. Telefónnu prípojku priviesť do podlažia kde je umiestnený rozvádzač, v prípade keď sa vyžaduje 24 hod. núdzový alarm.
- E9. Osvetlenie nástupišť musí mať v blízkosti šachtových dverí intenzitu min. 50 luxov merané na podlahe (čl. 5.3.7.1).
- E10. Dverné otvory by mali byť opatrené zábradlím zabráňujúce pádu do šachty až do inštalácie šachtových dverí podľa EN 12811 a miestnych predpisov.

VŠEOBECNÉ (Dodáva hlavný dodávateľ, ak nie je uvedené inak)

- G1. Hlavný privod el. energie by mal byť trojfázový s nulovým vodičom a s uzemňovacou svorkou (3P+N+G). Pre každý výťah mal byť dimenzovaný na max. prúd uvedený v rozpiske (čl. 5.10.5). Hlavný privod priviesť k rozvádzaču a bude mať dĺžku od rozvádzača +4 m. Sietový spínač je podľa typu záťaže (frekvenčný menič) odporúča sa s citlivosťou 300mA. Sietový spínač triedy B je podľa normy EN50178.
- G2. Rozvádzač nesmie byť umiestnený v súkromných priestoroch (čl. 5.2.2.1).
- G3. Rozvádzač neumiestňovať v priestoroch garáží, pokiaľ výťah nemá samostatnú predsieň (rozdielny požiarny úsek).
- G4. Svetlá výška pracovného priestoru v mieste rozvádzača by mala byť 2.10 m. Vodorovná plocha pred rozvádzačom by mala byť 0,50 x 0,70 m (čl. 5.2.6.3.2.1).
- G5. Pred začatím montáže je dôležité overiť pracovné náradie a projekt výťahu.
- G6. Zabezpečiť uzavretý priestor pre uskladnenie výťahových dielov prichádzajúce zo skladu na pracovné miesto. (vodidlá majú vo všeobecnosti dĺžku 5,0 m, preto je potrebný vhodný prístup na umiestnenie).

Spomenuté články prislúchajú nomen EN 81-20/50 / EN 81-77 CAT. 0
Deformácia budovy uvažovaná pri výpočte vodidiel je 1 mm.

ZABEZPEČÍ ZÁKAZNÍK

POZ	POČET	POPIS
1	3	ZÁVESNÉ OKÁ/NOSNIKY Q=29.4 kN
3	-	ZAHĽBENIE V PODLAHE PRE DVERE A / ALEBO PRE UMIESTNENIE ROZVÁDZAČA
4	-	DOKONČENIE NÁSTUPIŠŤ PO MONTÁŽI DVERÍ
5	1	POLOHU VETRAČIEHO OTVORU STANOVI STAVEBNÍK (POZRI BOD E7)
6	1	NÚDZOVÉ OSVETLENIE PRED ROZVÁDZAČOM (MIN. 50 lx)
7	-	VODEODOLNÁ PRIEHLBENÁ (POZRI DETAIL: REZ PRIEHLBŇOU)
26	-	PREPÁŽKA V PRIEHLBNI
28	-	TELEFONNÁ LINKA

OZNAČENIE DIELOV

A: MAGNETICKÝ SNÍMAČ
 B: KONCOVÝ SPÍNAČ
 C: LANO OBMEDZOVAČA RÝCHLOSTI
 D: NOSNÍK VLEČNÉHO KÁBLA
 E: OVLÁDACÍ PANEL V KABÍNE
 F: PRÍVOLAČ V STANICI
 G: OSVETLENIE ŠACHTY
 H: ROZVÁDZAČ (ROPES EXIT OVER DOOR)
 I: ZABRADLIE
 J: KĽADKA KABÍNY Ø240 mm
 J1: KĽADKA VYVAŽ. ZÁVAŽIA Ø240 mm
 K: NAPÍNAČIA KĽADKA
 L: OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI
 M: REBRÍK DO PRIEHLBNE
 N: BEZPEČNOSTNÝ PRIESTOR PODLA CL: 5.2.5.8.1, (x1)
 N1: BEZPEČNOSTNÝ PRIESTOR PODLA CL: 5.2.5.7.1 (x1)
 O: NÁRAZNÍK KABÍNY
 P: NÁRAZNÍK VYVAŽ. ZÁVAŽIA
 Q: VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIE
 R: OCHRANNÁ ZÁBRANA VYVAŽ. ZÁVAŽIA
 S: MOTOR
 T: STANICOVÝ INDIKÁTOR (LEN V HLAVNOM PODLAŽÍ)
 T1: INDIKÁTOR SMERU JAZDY (OKREM HLAVNEJ STANICE)
 U: FREKVENČNÝ POHON
 V: BRZDOVÝ ODPOR
 X: U.P.S.

OZNAČENIE ROZMEROV

SW: ŠÍRKA ŠACHTY
 SD: HLĽKA ŠACHTY
 CI: VNÚTORNÝ ROZMER KABÍNY
 CO: VONKAJŠÍ ROZMER KABÍNY
 DBG: VZDIALENOSŤ MEDZI VODIDLAMI
 MPL: MINIMÁLNY ROZMER OD ZVISLICE
 OH: HORNÝ PREJAZD
 HH: VÝŠKA HÁKU
 TH: DOPRAVNÝ ZDVÍH
 PT: PRIEHLBEN
 SH: VÝŠKA ŠACHTY
 LB: PREKLADOVÝ NOSNÍK
 DO: DVERE
 ROD: DVERNÝ OTVOR
 COH: SVETLA VÝŠKA
 ICH: SVETLA VÝŠKA KABÍNY
 TPH: A: VÝŠKA NAPÍNAČEJ KĽADKY
 CWP: VÝŠKA OCHRANNÉHO KRYTU VYVAŽ. ZÁVAŽIA
 CWBH: VÝŠKA NÁRAZNÍKA VYVAŽ. ZÁVAŽIA
 CBH: VÝŠKA NÁRAZNÍKA KABÍNY
 CGR: KONIEC VODIDLA KABÍNY OD KONEČNEJ PODLAHY
 CWGR: KONIEC VODIDLA VYVAŽ. ZÁVAŽIA OD KONEČNEJ PODLAHY
 SGS: OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI OD KONEČNEJ PODLAHY
 RCS: NOSNÍK ZÁVESU LÁN OD KONEČNEJ PODLAHY
 GRB: OD KONEČNEJ PODLAHY PO KOSLEDNÚ KONZOLU VODIDLA
 FFL: UROVEŇ KONEČNEJ PODLAHY
 CS: BETÓNOVÁ DOSKA

POR.Č.	DÁTUM	PREPRACOVAL	OPRAVA	
2				
1				
KRESLIL:		MENO	PODPIS	ZÁKAZNÍK:
KONTROLOVAL:		Ing. KOVÁCS		
DÁTUM:		23. 8. 2019		
MIEKA:				
ADRESA STAVBY:		Ivanská cesta 21, Bratislava		
ThyssenKrupp		ThyssenKrupp Výťahy		
Nové záhrady 1/13A, Bratislava		ČÍSLO ZÁK. A ZK. Y (PODROBNE)		
Tel.: +421-2-4020 8888		VÝROBNÉ ČÍSLO:		
		ČÍSLO VÝKRESU:		
		LIST 1		
		7		

INFORMÁCIE O VÝTAHU

TYP VÝTAHU	OSOBNÝ
MENOVITÁ NOSNOSŤ	825 kg
POČET OSOB	9 OSOB
MENOVITÝ ROZMER KABÍNY	1240x1410 mm
VNÚTORNÝ ROZMER KABÍNY	1216x1400 mm
SLING	NIE
RÝCHLOSŤ	1 m/s
LANOVANIE	2:1
SÚČINITEL VYVÁŽENIA	45%
TYP VODIDLA KABÍNY	T 89B
TYP VODIDLA VYVAŽOVACIEHO ZÁVAŽIA	T 45 - A
VODIACI SYSTÉM	KLZNÉ VODIACE ČELUSTE

INFORMÁCIE O POHONE

STROJ	TKAW PMC 125L 003
TRAKČNÝ KOTUČ	240 mm
POČET LÁN	7/8/9
PRÍJEMER LANA	6 mm
MAX. VÝKON	5.9 kW
POČET ŠTARTOV/HOD.	18
ÚČINNOSŤ STROJA	0.91

ŠACHTA

DOPRAVNÝ ZDVIH	3550 mm
HLAVA ŠACHTY	4240 mm
PRIEHLBEŇ	900 mm
POČET STANÍC	2

ZAŤAŽENIA V MIESTE KOTVENIA VODIDIEL

VODIDLÁ KABÍNY		Fx= 1.9 kN	Fy= 2.8 kN
VODIDLÁ VYVAŽ. ZÁVAŽIA		Fx= 0.4 kN	Fy= 2.0 kN

UPEVNENIE VODIDIEL

NA PLATNE	BETÓN
MEZI PLYNAMI	BETÓN

SALENOSŤ MEDZI KOTVENIAMI: 2,0 m OD PRVÉHO KOTVIACEHO MIESTA. (POZRI KOTVENIA)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŠACHYTÁVAČOV KABÍNY	THYSSENKRUPP
ŠACHYTÁVAČOV KABÍNY	TK-3B
ŠACHYTÁVAČOV VYVAŽ. ZÁVAŽIA	
ŠACHYTÁVAČOV VYVAŽ. ZÁVAŽIA	

HLAVNÉ ÚDAJE PRE NAPÁJANIE

PRÍVOD	380V/415V-50Hz
OSVETLENIE	230V/50 Hz
NAPÁJACIA SIEŤ	TN-S / TT

MAX. POVOLENÉ KOLÍSANIE NAPATIE PODĽA IEC 60038 +/-10% (TYPICAL<5%)

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

MENOVITÝ VÝKON	7.22 kW
PRACOVNÝ PRÚD (IN)	21A
ZÁBEROVÝ PRÚD (IS)	34A

PRÍVOD NAPÁJANIA

- Vlastnosti drôtu: Tri drôty s neutrálnym uzemnením (3F + N + G) podľa miestnych noriem. vodiče musia byť chránené pred preťažením a skratom.
- Max. prierez hlavného napájania = 10 mm
- Vedenie káblov: Nezávislá linka na ovládanie rozvádzača (H) + 4m.
- Zvodový prúd: filter EMC meniča môže spôsobiť značné zvodové prúdy (3,5mm-15mA)
- Skratový prúd: musí byť vypočítaný elektrikárom podľa platných noriem.
- Ochrana: pre každý výťah neexistujú žiadne nezávislé okruhy.
- Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom a priamemu kontaktu: musí byť inštalovaná elektrická ochrana (minimálne 300 mA, doporučená hodnota 500 mA), aby nedošlo k odpojeniu napätia.
- V prípade použitia RDC cez prírodné vedenia, čo je ochrana Typ B (acc. EN 50178) min. odporúča sa používať 300 mA, odporúčané 500 mA, s vhodnou krivkou pre zaťaženia s invertormi
- Pri začatí inštalácie musí byť zabezpečené napájanie pre pracovné nástroje a neskôr pre konečnú skúšku výťahu.
- Pre pripojenie k hlavnému zdroju napájania musí byť vyhradená trojfázová linka
- Napájanie podľa EN 50150

Okrem toho musia byť v inštalácii použité národné predpisy pre zabezpečenie elektrickej bezpečnosti

SILOVÉ ÚČINKY

UVEDENÉ SILOVÉ ÚČINKY SA VZŤAHUJÚ K DYNAMICKÝM ÚČINKOM, HMOTNOSŤ NOSIČA MOTORA NIE JE ZAHNUTÁ (SÍLY NEPOSOBIA SÚČASNE)

R1	POD KAŽDÝM NÁRAZNÍKOM KABÍNY:	49.0 kN
R2	POD KAŽDÝM NÁRAZNÍKOM CW:	78.0 kN
R3	POD KAŽDÝM VODIDLOM KABÍNY:	82.0 kN

HORIZONTÁLNE SILOVÉ ÚČINKY V HORNEJ ČASTI ŠACHTY

HR1	ROVNOBEŽNE SO STENOU:	4.3 kN
HR2	KOLMO NA STENU:	0.2 kN
HR3	ROVNOBEŽNE SO STENOU:	9.4kN
HR4	KOLMO NA STENU:	9.2kN

ŠPECIFIKÁCIA DVERÍ

KABÍNOVÉ DVERE	STANICA	PREDNÁ STRANA
VÝROBCA	TKE F-Type	G1
TYP	CD10	G1
KONEČNÁ ÚPRAVA	Nerez Gr.220D	
DVERNÁ UZÁVIERKA	ÁNO	
ŠACHTOVÉ DVERE		
VÝROBCA	TKE F-Type	
TYP	LD10	

SADA DVERÍ


SKUPINA 1 (G1)

POŽIARNA ODOLNOSŤ	E 120
KONEČNÁ ÚPRAVA	NEREZ Gr.220D
PLNÉ PRIEČELIE DVERÍ	NIE

VÝBAVA

- Fotobunka: svetelná clona po celej výške dverí
- Maolo: Nerez - 2 x zadná stena, 2x stena oproti COP, dvojúrovňové vo výške 750 a 900 mm
- Zrkadlo: Na zadnej stene kabíny, bezpečnostné EN81 - 70
- Dorozumievacie zariadenie s GSM modulom
- EBD (batériový dojazd do najbližšej stanice v prípade výpadku el. prúdu)
- Hlások poschodí
- IMO výbava (sklopná sedačka) na stene s COP panelom.

POR.Č.	DÁTUM	PREPRACOVAL	OPRAVA	
2				
1				
		MENO	PODPIS	ZÁKAZNÍK:
KRESLIL:	Ing. KOVÁCS			
KONTOLOVAL:				NÁZOV PROJEKTU (STAVBY):
DÁTUM:	23.01.2019			Vytvorenie a rekonštrukcia COVP
MIERKA:				
ADRESA STAVBY:		Ivónska cesta 21, Bratislava		
 ThyssenKrupp		ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A, Bratislava Tel.: +421-2-4020 8888		ČÍSLO ZÁKAZKY (PONUKY): -- VÝROBNÉ ČÍSLO: -- ČÍSLO VÝKRESU: --
				LIST 2 2 Počet list.



Rez A-A, pozri stranu 4
Detaily dverných otvorov, pozri stranu 6




PRIEHLBEŇ



ZABRADLIA			
	POLOHA		
	L	B	R
VÝŠKA	1100	-	-
Typ	PEVNÉ	-	-



POR.Č.	DÁTUM	PREPRAČOVAN	OPRAVA
2			
1			
		MENO	PODPIS
KRESIL:	Ing. KOVÁCS		
KONTROLOVAL:			
DÁTUM:	23.01.2019		NÁZOV PROJEKTU (STAVBY):
MIERKA:			Vytvorenie a rekonštrukcia COVP
ADRESA STAVBY: Iľánska cesta 21, Bratislava			
 ThyssenKrupp		ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A, Bratislava Tel.: +421-2-4020 8888	ČÍSLO ZÁKAZKY (PONUKY): - VÝROB NĚ ČÍSLO: - ČÍSLO VÝKRESU: -
			LIST 3 Podobití 7

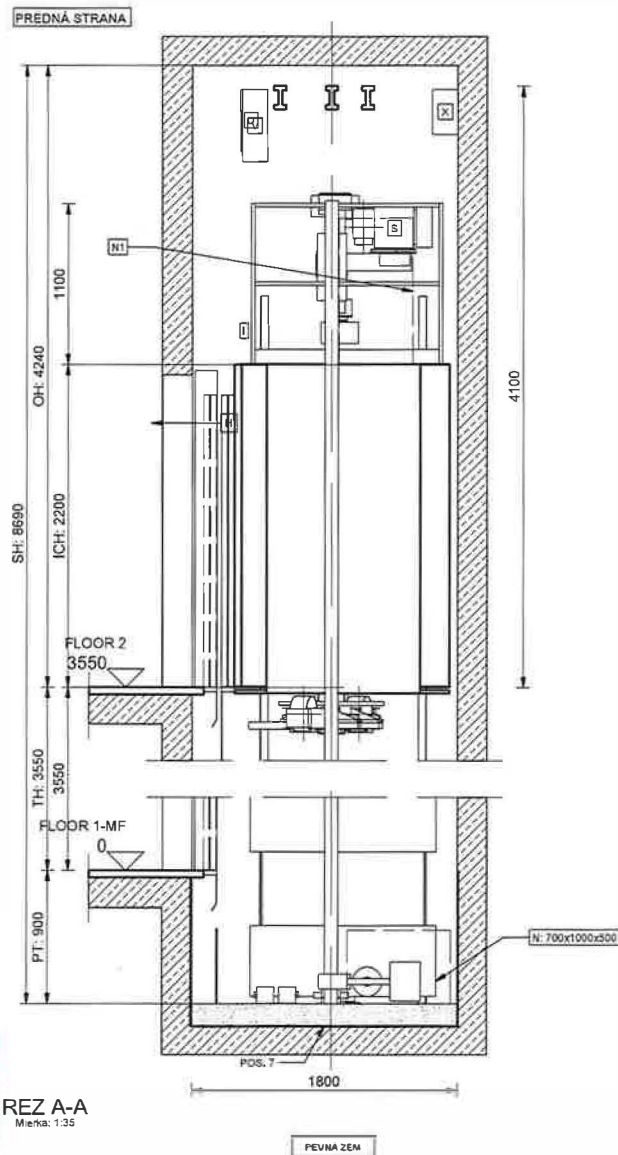


TABUĽKA PREJAZDOV	
Chod vyvažacieho závažia stlačením nárazníka	70
Chod kabíny stlačením nárazníka	385

Stlačenie nárazníka = 72 mm





DETAIL UKONČENIA PODLAHY

HRúbKA KONEČNEJ PODLAHY: PFT < 70mm
MIERKA: 1:50



DETAIL UKONČENIA PODLAHY

HRúbKA KONEČNEJ PODLAHY: PFT < 70mm
ŠPECIFIKÁCIA BETÓNU: EN200, C20/25
MIERKA: 1:50

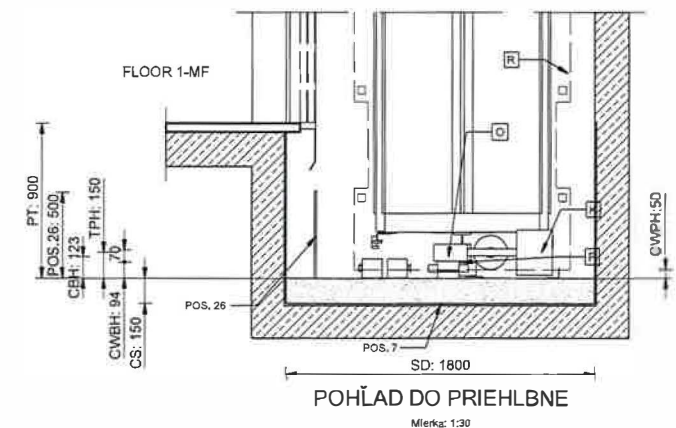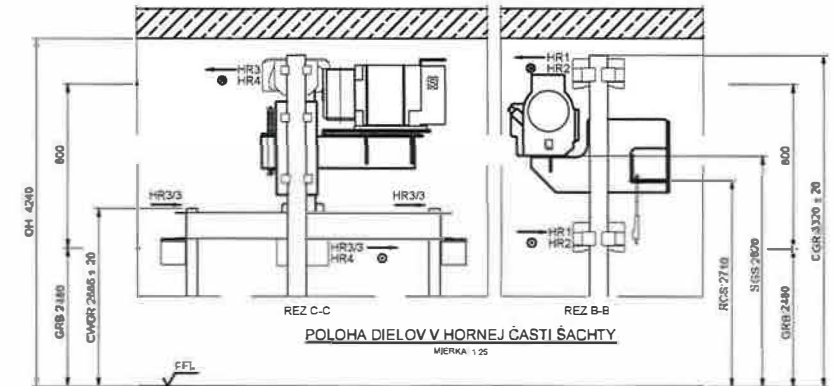


PRI POŽIADAVKE ODOLNOSTI PROTI PRIESAKU SPODNEJ VODY, HRúbKA STIEN MUŠI UMOŽNIŤ
POUŽITIE ŠTANDARDNÝCH KOTVIACICH KONZOL PRE UPEVNENIE NAŠICH ZARIADENÍ
HRúbKA DOSKY DŇA PRIEHLBNE JE MIN. 150 mm PRE UPEVNENIE ZARIADENÍ V PRIEHLBNI

POR.Č.	DÁTUM	PREPRACOVAL	OPRAVA	
2				
1				
		MENO	PODPIS	ZAKAZNIK:
KRESLIL:	Ing. KOVÁCS			
KONTROLOVAL:				
DÁTUM:	23.01.2019		NÁZOV PROJEKTU (STAVBY):	
MIERKA:			Vytvorenie a rekonštrukcia COVP	
ADRESA STAVBY:		Ivánska cesta 21, Bratislava		
 ThyssenKrupp		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o. Nové záhrady I./13A, Bratislava Tel.: +421-2-4020 8888		ČÍSLO ZAKAZKY (PONUKY): - VÝROBNÉ ČÍSLO: - ČÍSLO VÝKRESU: -
				LIST 2 4 Počet listov 7

LIST 2
4
Počet list.
7


ÚROVEŇ KOTVENÍ		
Úroveň	Výška vzhľadom na projektovú úroveň	Výškový rozdiel na projektovú úroveň
1	+750	750
2	+2570	1820
3	+4570	2000
4	+5750	1180
5	+6930	1180
6	+7730	800

VODIDLÁ				
Úroveň	Vozidlá kabíny		Vozidlá výťah. zariadenia	
	Výška od dna priehlbne (EPP)	Dĺžka vozidla	Výška od dna priehlbne (EPP)	Dĺžka vozidla
1	+0	2770	+0	2116
2	+2770	5000	+2116	5000



DETAIL UKONČENIA PODLAHY

HRúbKA KONEČNEJ PODLAHY FFT > 70mm
MIERKA 1:50



DETAIL UKONČENIA PODLAHY

HRúbKA KONEČNEJ PODLAHY FFT > 70mm
SPECIFIKÁCIA BETÓNU EN206 C20/25
MIERKA 1:50

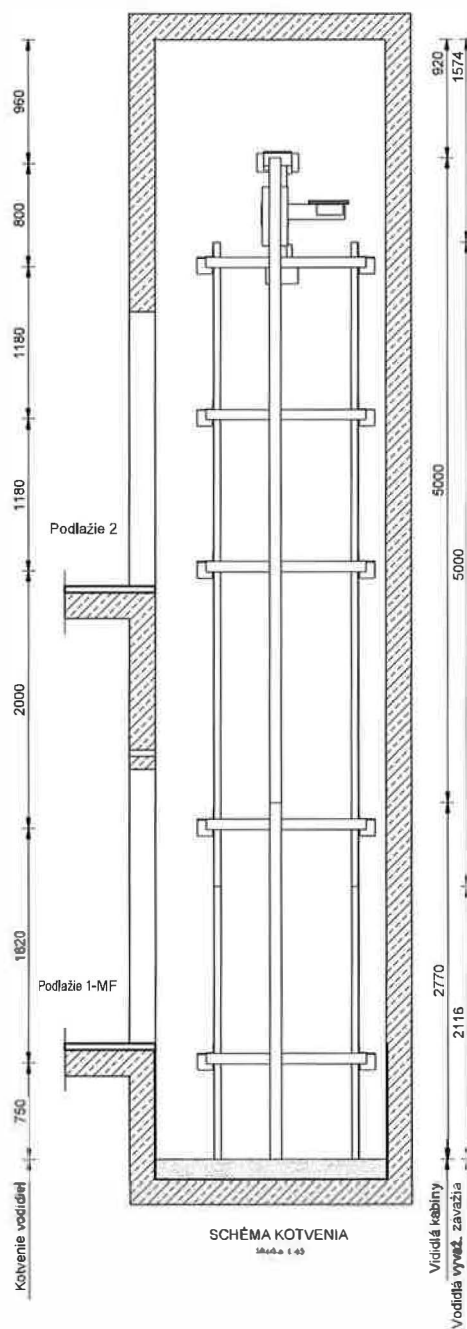


SCHÉMA KOTVENIA
Mierka 1:40

POR.Č.	DÁTUM	PREPRACOVAL	OPRAVA	
2				
1				
		MENO	PODPIS	ZÁKAZNÍK:
KRESLIL:		Ing. KOVÁCS		
KONTROL. MAL:				
DÁTUM:		23.01.2019	NÁZOV PROJEKTU (STAVBY):	
MIERKA:			Vytvorenie a rekonštrukcia COVP	
ADRESA STAVBY:		Ivánska cesta 21, Bratislava		
 ThyssenKrupp		ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové zohradby 1./13A, Bratislava Tel.: +421-2-4020 8888		ČÍSLO ZÁKAZKY (PONUKY): VÝROBNÉ ČÍSLO : ČÍSLO VÝKRESU:
				LIST 6. 5 Podstat.

SW:-20/+20 mm
SD:-20/+20 mm



OHRADENIE DVER, OTVORU

Pohľad zo šachty
 Pozri bod E10 (Výťahová šachta)
 Pozri detail na strane 7
 Mierka: 1:50




OHRADENIE DVER. OTVORU (Rozvádzač)

Pohľad zo šachty
Pozri bod E10 (Výťahová šachta)
Pozri detail na strane 7
Mierka: 1:50




REZ DVERNÉHO OTVORU

REZ D-D
MIERKA: 1:50

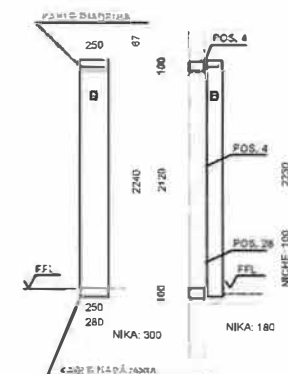


**MONTÁŽ ROZVADZAČA
POHLAD A REZ**

STANICA 2
MIERKA: 1:50




DETAIL Ž'ABU
(ROZVÁDZAČ)

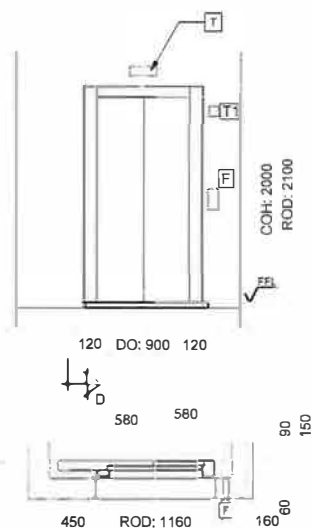

DVERNÝ OTVOR

Ostatné podlažia
Ak je panel na stene, pozri detail otvoru na strane 6
Mierka: 1:50

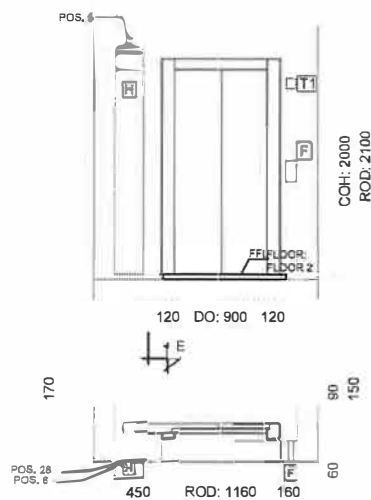


DVERNÝ OTVOR
(ROZVÁDZAČ)

Podlaże: 2
Ak je panel na stene, pozri detail otvoru na strane 6
Mierka: 1:50


V prípade že rozvádzač je umiestnený v požiarom úseku odlišného od ostatných podľa 2) alebo priestorov (veľmi výnimočná situácia, pretože len vo zvláštnych prípadoch sú rozdielne požiarne úseky), rozvádzač musí byť umiestnený na stene alebo musí byť zvolený variant "full front" (plný priečok).

POR.Č.	DÁTUM	PREPRACOVAL	OPRAVA	
2				
1				
KRESLIL:		MENO	PODPIS	ZÁKAZNÍK:
		Ing. KOVÁCS		
KONTROLÓVA L:				
DÁTUM:		23.01.2019		NÁZOV PROJEKTU (STAVBY):
MIERKA:		-		Vytvorenie a rekonštrukcia COVP
ADRESA STAVBY:		Ivánska cesta 21, Bratislava		
		ThysenKrupp Výtahy		DISLO ZÁKAZKY (PONUKY):
		Nové záhrady I/L/13A, Bratislava		VÝROBNÉ ČÍSLO:
		Tel.: +421-2-4020 6668		ČÍSLO VÝKRESU:
				LIST 2. 6 Počet listov
				7

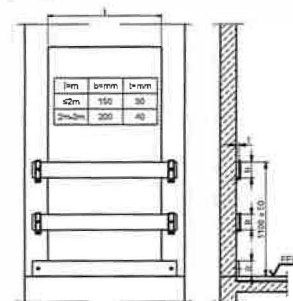


DETAIL OHRADENIA DVERNEHO OTVORU

POZRI BCD E10
MERKA 1:50
MIN 1% HORIZONTÁLNEHOREZU




ŠTANDARDNÁ DŮŽKA VODIČOV MAX 1,5 m



POLOHA PRIVOLÁVAČOV - LENAK
EN81-70


MIERKA 1:50
PRIKLAD RIESENIA



30 kN

DETAIL NOSNIKA

POZ. 1
MERKA 1:25
Příklad řešení



OTVOR PRE PRIVOLÁVAČ A
SIGNALIZÁCIU


MIERKA 1:25

IC: 44 886 021 ICDPH: SK202857749



POR.Č.	DÁTUM	PREPRACOVAL	OPRAVA	
2				
1				
KRESLIL:	MENO	PODPIS	ZAKAZNIK:	
KONTROLOVAL:	Ing. KOVÁCS			
DÁTUM:	23.01.2019		NÁZOV PROJEKTU (STAVBY):	
MIERKA:	-		Vytvorenie a rekonštrukcia COVP	
ADRESA STAVBY:			Ivónska cesta 21, Bratislava	
ThyssenKrupp			ČÍSLO ZAKAZKY (POMUKY):	-
ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.			VÝROBNÉ ČÍSLO:	-
Nové záhrady 1/13A, Bratislava			ČÍSLO VÝKRESU:	-
Tel.: +421-2-4020 8888				7

DETAIL OVLÁDACIEHO PANELA

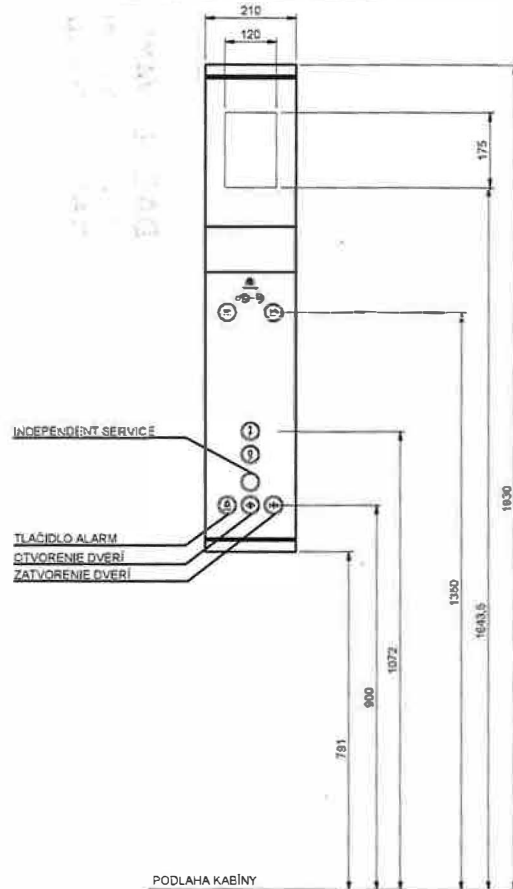


PODLAHA KABÍNY

Poznámka: Umiestnenie tlačidiel a symbolov sa môže líšiť


ŠPECIFIKÁCIA OVLÁDACIEHO PANELU V KABÍNE

Hlavné podlažie so zeleným lemom:	DB-01
Tlačidlá	DB-01
Syntetizér:	YES
BRAILE označenie:	EN81
Bzučiak	YES
Núdzový alarm na diaľku:	2N GSM

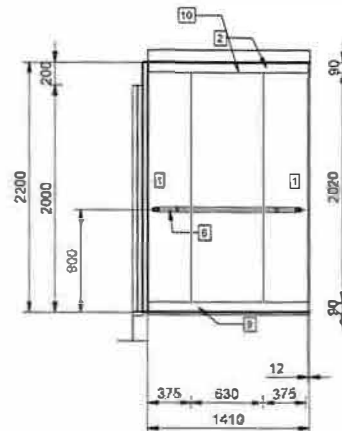


Ľavá strana

Mierka 1:40

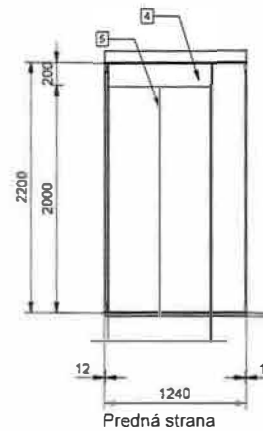


Predná strana

Mierka 1:40

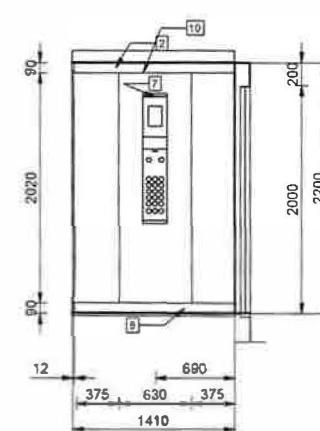

Pravá strana

Mierka 1:40

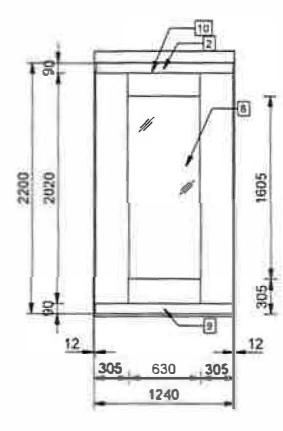


Zadná strana

Mierka 1:40


DIZAJN KABÍNY: E

1	POVRCH DIELOV	PureE02
2	PODHLAD	Spot LED
3	PODLAHA KABÍNY	Viny Nature Black
4	ČELNÝ PANEL	Stainless Steel G2200
5	KAB/NOVÉ OVERE	900 x 2000 - Stranová 2 priečlyá
6	MADLO	Stainless Steel Satin Silver
7	OVLÁDACÍ PANEL	EDGE - Stainless Steel G2200
8	ZRKADLO	Silver Tempered glass acc. EN81-70
9	SOKLOVÁ LIŠTA	Stainless Steel G2200
10	LIŠTA PODHEADU	Stainless Steel G2200



Pôdorys

Mierka 1:40



Strop

Mierka 1:40

Dizaj kabíny

Dizaj kabíny			
KR ESUL:	MENO	PODPIS	ZAKAZNIK:
KONTROLOVAL:	Ing. KOVÁCS		
DÁTUM:	23.01.2019		NÁZOV PROJEKTU (STAVBY):
MIERKA:			Vytvorenie a rekonštrukcia COVP
ADRESA STAVBY:		Ivanska cesta 21, Bratislava	
ThyssenKrupp		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	ČÍSLO ZÁK. A DOKUM. : -
Nové záhrady 1/13A, Bratislava		Nové záhrady 1/13A, Bratislava	VÝROBNÉ ČÍSLO:
Tel.: +421-2-4020 8888			ČÍSLO VKR ESU:
			LIST 2. 1
			Podpis
			1

PRÍKAZ K ZMENE č. 05
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 05
Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: Prípočet - Doplnenie elektricky ovládaných okien do svetlíka	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Ide o nepredvídateľné a nevyhnutné (doplňujúce) stavebné práce, ktoré sa musia realizovať podľa požiadaviek BOZP zamestnancov a študentov z dôvodu umiestnenia svetlíkov vo výške a súvisiacej zákonnej regulácii prác vo výškach. Ako aj nemožnosť vystavovať nový strešný plášť pravidelnému zaťažovaniu, ktoré by bolo spôsobené častým vychádzaním na strechu z dôvodu otvárania a zatvárania okenných otvorov svetlíka, aby nedošlo ku škodám na živote a majetku v prípade nepredvídaných poveternostných vplyvov. Táto skutočnosť bude zabezpečená dažďovým senzorom, ktorý tento mechanizmus otvárania obsahuje.	
Dohodnutá cena zmeny: 9 638,91 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet 05 - Prípočet - Doplnenie elektricky ovládaných okien do svetlíka	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
Odtlačok pečiatky  Súhlas zástupcu Objednávateľa	Meno, Podpis Ing. Pávo LIŠKA
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor:	04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:	04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

05 - Prípočet - Doplnenie elektricky ovládaných okien do svetlíka

JKSO:

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 638,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 638,91	20,00%	1 927,78

Cena s DPH

v EUR

11 566,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľgogradská 16, Bratislava
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

04.06.19

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

05 - Prípočet - Doplnenie elektricky ovládaných okien do svetlíka

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel
Karkoška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 638,91

M - Práce a dodávky M

2 566,22

21-M - Elektromontáže

1 796,22

OST - Ostatné HZS

770,00

N01 - Výplňové konštrukcie

7 072,69

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

05 - Prípočet - Doplnenie elektricky ovládaných okien do svetlíka

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel
Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 638,91

D M

Práce a dodávky M

2 566,22

D 21-M

Elektromontáže

1 796,22

1	K	210010059	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, uložená pevne	m	200,000	1,21	242,00
2	M	345710001400	Rúrka tuhá PVC-U, VRM DN 25	m	200,000	0,54	108,00
3	M	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	200,000	0,13	26,00
4	M	345710017900	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	ks	100,000	0,26	26,00
5	M	345710007900	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX DN 25	ks	1,000	25,00	25,00
6	K	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	ks	172,000	0,88	151,36
7	K	210011309	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	50,000	1,01	50,50
8	M	311310006500	Hmoždinka so zatíkačou skrutkou M 6x60 mm, typ TB670, TRACON Elektríc	ks	222,000	0,10	22,20
9	M	385990010400	Krabica pre montáž na povrch, LOGUS 90	ks	2,000	1,72	3,44
10	M	EKR000000059	Krabica rozbočovacia 2000016 A8 75x75x36,2mm bez vývodiek sivá	ks	9,000	0,96	8,64
11	K	210800186	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	0,92	18,40
12	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	20,000	0,40	8,00
13	K	210800187	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	0,92	18,40
14	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	20,000	0,63	12,60
15	K	210800198	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	460,000	0,92	423,20
16	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²	m	460,000	0,66	303,60
18	K	M330	Preprava zariadenia a mimostavenisková doprava	ks	1,000	130,00	130,00
19	K	Pol571	Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-6, vrátane vydania písomnej správy	hod	10,000	15,00	150,00
20	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	11,48	68,88

D OST

Ostatné HZS

770,00

21	K	Pol447	Výkon autožeriava / vysokozdvížnej plošiny	hod	10,000	77,00	770,00
----	---	--------	--	-----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie,
vnút. silnoprúd.rozvod,bleskozvod a uzemnenie"
Číslo položky 196

D N01

Výplňové konštrukcie

7 072,69

22	K	Pol 01	Dodávka a montáž nových vetracích krídel so sendvičovým presklením z polykarbonátu v rozmere 1050x3500 mm otváraných pomocou elektricky lineárnych pohonov	ks	9,000	632,15	5 689,35
23	K	Pol 02	Dodávka a montáž riadiacej ústredne s meteo stanicou a ovládacími tlačidlami	ks	1,000	1 383,34	1 383,34

PRÍKAZ K ZMENE č. 06
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 06 Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Prípočet - Demontáže potrubia požiarnej vody	
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Ide o nepredvídateľné a nevyhnutné (doplňujúce) stavebné práce, ktoré sa vyskytli po demontážnych prácach na objekte - demontáž vstavkov. Bola zistená skutočnosť existencie pôvodných požiarnych rozvodov (PPR), ktoré bolo nutné demontovať. Pri vypracovávaní DRS nebolo možné túto skutočnosť predvídať nakoľko tieto požiarne rozvody boli zastavané vnútorným vybavením haly (pevne namontovaným).	
Dohodnutá cena zmeny: 537,00 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet: 06 - Prípočet - Demontáže potrubia požiarnej vody	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06 - 31 -	Dátum 04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	Ing. Pavol Liška
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor:	04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:	04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant	
Počet originálov: 4	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

06 - Prípočet - Demontáže potrubia požiarnej vody

JKSO:

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

537,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	537,00	20,00%	107,40

Cena s DPH

v EUR

644,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 108
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA

Voigodianska 3, 080 203 Prešov
IČO: 44 806 021 IČDPH: SK2022857749

07.11.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

06 - Prípočet - Demontáže potrubia požiarnej vody

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

537,00

PSV - Práce a dodávky PSV

537,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

537,00

DAG SLOVAKIA

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

06 - Prípočet - Demontáže potrubia požiarnej vody

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

537,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

537,00

D 722


Zdravotechnika - vnútorný vodovod

537,00

1	K	722130804.1	Demontáž potrubia DN 65, -0,00959t (za vodomermom + požiarne voda)	m	150,000	3,04	456,00
P			Poznámka k položke: Rozbor TOV 10 - 01				
VV			Za vodomermom				
VV			15				
VV			Požiarna voda 1.NP + 2.NP				
VV			70+50				
VV			1.NP - 1,35 (Buracie práce)				
VV			15				
VV			Súčet				
			150,000				
2	K	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	1,439	56,29	81,00
P			Poznámka k položke: Rozbor TOV 10 - 02				

PRÍKAZ K ZMENE č.07
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Salocky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 07	Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: Prípocet - Preklady do nových konštrukcií			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny: Ide o nevyhnutné stavebné práce, bez ktorých nie je možné stavebné otvory nových konštrukcií zrealizovať.			
Dohodnutá cena zmeny: 274,88 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):			
Má dopad na celkový termín			
Prílohy: Rozpočet: 07 - Preklady do nových konštrukcií			
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE			
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Dátum	
 BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06		04 0 6 1 9	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		Dátum	
 DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 08001 Prešov IČO: 44 88 60 21		04 0 6 1 9	
Súhlas Stavebný dozor:		Dátum	
 Adriana ORFANUSOVA stavebný dozor SKS		04 0 6 1 9	
Súhlas Projektant:		Dátum	
		04 0 6 1 9	
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐			
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové I sty

Časť:

07 - Pripočet - Preklady do nových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

274,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	274,88	20,00%	54,98

Cena s DPH

v EUR

329,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľdubská 1, 080 01 Prešov
IČO: 44 806 021 IČDPH: SK2022857749
04 0 6 1 9
Adriana ORFANUSOVA
stavebný dozor
pečiatka
Ev. č. 10936
Výkresová komora stavebných inžinierov

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

07 - Prípočet - Preklady do nových konštrukcií

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

274,88

HSV - Práce a dodávky HSV

274,88

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

273,38

99 - Presun hmôt HSV

1,50

IB: 44 806 021 IČDPH: SK2022657743

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

07 - Prípočet - Preklady do nových konštrukcií

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

274,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

274,88

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

273,38

1	K	317161272	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	13,88	27,76
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:

Rozbor TOV 11 - 01

VV

1.NP

VV

2

2,000

2	K	317161273	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	17,06	51,18
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:

Rozbor TOV 11 - 02

VV

1.NP (D7)

VV

2

2,000

VV

2.NP

VV

1

1,000

VV

Súčet

3,000

3	K	317161278	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2750 mm	ks	4,000	31,26	125,04
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Rozbor TOV 11 - 03

VV

2.NP

VV

4

4,000

VV

Súčet

4,000

4	K	317161279	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	34,70	69,40
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:

Rozbor TOV 11 - 04

VV

1.NP

VV

2

2,000

D 99

Presun hmôt HSV

1,50

5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,451	3,32	1,50
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

P


Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 173

PRÍKAZ K ZMENE č. 08
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 08 Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Odpočet - Práce v trafostanici	
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Projektované stavebné práce v trafostanici, predovšetkým mokré procesy, nie je možné realizovať bez opakovaného vypínania dodávky elektrickej energie z trafostanice. Z dôvodu napojenia okolitých objektov na trafostanicu, je obtiažne zosúladiť ich odpojenie pri odstávke od elektrickej energie, (Lidl, tlačiareň cenných papierov). Na základe vyššie uvedeného a z dôvodu BOZP sú práce v trafostanici vyňaté z realizácie.	
Dohodnutá cena zmeny: -4 289,73 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet: 08 - Odpočet - Práce v trafostanici	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
Odtiačok pečiatky	Meno, Podpis
 SÚHLAS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA Sabinovská 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06	Ing. Pavol Liška 04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	 04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor:	 04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:	 04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐	
Počet originálov: 4	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

08 - Odpočet - Práce v trafostanici

JKSO:

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-4 289,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-4 289,73	20,00%	-857,95

Cena s DPH

v EUR

-5 147,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 108
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

DAG SLOVAKIA, a.s.

Vojvodinská 22, Bratislava
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

04 08 19

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

08 - Odpočet - Práce v trafostanici

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-4 289,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 169,23

783 - Dokončovacie práce - nátery

-2 130,26

784 - Dokončovacie práce - maľby

-1 038,97

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 120,50

D1 - Vypínače, spínače

-1 120,50

DAG SLOVAKIA, a.s.

K5

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

08 - Odpočet - Práce v trafostanici

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-4 289,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

-3 169,23

D 783

Dokončovacie práce - nátery

-2 130,26

1	K	783801812r	Bezprašný vodoodpudivý náter do výšky v=150 mm, vrátane prípravy podkladu - sokel SK02	m	-71,780	3,15	-226,11
---	---	------------	--	---	---------	------	---------

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 388

P

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

"1.01

(3,16*2+1,77*2)*-1

-9,860

(-1,45*3)*-1

4,350

"1.02

(3,16*2+6,765*2)*-1

-19,850

(-1,45)*-1

1,450

"1.03

(6,505*2+4,155*2)*-1

-21,320

(-1,45)*-1

1,450

"1.04

(3,23*2+4,245*2+0,45*2)*-1

-15,850

(-1,7)*-1

1,700

"1.05

(3,08*2+4,245*2+0,45*2)*-1

-15,550

(-1,7)*-1

1,700

Súčet

-71,780

2	K	783891110r	Uzatvárací (bezprašný) vodoodpudivý náter, vrátane prípravy podkladu	m2	-80,650	23,61	-1 904,15
---	---	------------	--	----	---------	-------	-----------

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 389

P

W

W

W

1.01 až 1.05

(5,6+21,4+27,05+13,55+13,05)*-1

-80,650

Súčet

-80,650

D 784

Dokončovacie práce - maľby

-1 038,97

3	K	784152272	Maľby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, výšky nad 3, 80 m	m2	-494,749	1,39	-687,70
---	---	-----------	--	----	----------	------	---------

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 391

P

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

"1.01

(6,45*(1,77*2+3,16*2))*-1

-63,597

(-1,45*2,5*3)*-1

10,875

"1.02

(6,45*(3,16*2+6,765*2))*-1

-128,033

(-1,45*2,5)*-1

3,625

"1.03

(6,45*(6,505*2+4,155*2))*-1

-137,514

(-1,45*2,5)*-1

3,625

"1.04

(6,5*(4,245*2+3,23*2))*-1

-97,175

(-1,7*2,55)*-1

4,335

"1.05

(6,5*(4,245*2+3,08*2))*-1

-95,225

(-1,7*2,55)*-1

4,335

Súčet

-494,749

4	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	-494,749	0,71	-351,27
---	---	-----------	--	----	----------	------	---------

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 393

P

D PSV

Práce a dodávky PSV

-1 120,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D1		Vypínače, spínače				-1 120,50
5	K	Pol163	Svietidlo žiarivkové, sročné, 2x54W, vrátane zdrojov, (referenčný výrobok : VYRTYCH, EUROPA-PC-254-EP) -montáž	ks	-12,000	9,35	-112,20
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 163				
6	M	Pol164	Svietidlo žiarivkové, sročné, 2x54W, vrátane zdrojov, (referenčný výrobok : VYRTYCH, EUROPA-PC-254-EP) -montáž	ks	-12,000	29,70	-356,40
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 164				
7	K	Pol17	Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 (referenčný výrobok : LEGRAND - NEPTO) -montáž	ks	-4,000	3,96	-15,84
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 17				
8	M	Pol18	Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 (referenčný výrobok : LEGRAND - NEPTO)	ks	-4,000	3,65	-14,60
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 18				
9	K	Pol177	Núdzové svietidlo s piktogramom, LED 3h -montáž	ks	-5,000	9,35	-46,75
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 177				
10	M	Pol178	Núdzové svietidlo s piktogramom, LED 3h	ks	-5,000	35,20	-176,00
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 178				
11	K	Pol19	Tlačidlo 10A/230V, na povrch, havarijne, CENTRAL STOP -montáž	ks	-1,000	9,35	-9,35
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 19				
12	M	Pol20	Tlačidlo 10A/230V, na povrch, havarijne, CENTRAL STOP	ks	-1,000	41,80	-41,80
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 20				
13	K	Pol21	Tlačidlo 10A/230V, na povrch, havarijne, TOTAL STOP -montáž	ks	-1,000	9,35	-9,35
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 21				
14	M	Pol22	Tlačidlo 10A/230V, na povrch, havarijne, TOTAL STOP	ks	-1,000	49,50	-49,50
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 22				
15	K	Pol29	Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE (referenčný výrobok : LEGRAND) -montáž	ks	-2,000	5,39	-10,78
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 29				
16	M	Pol30	Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE (referenčný výrobok : LEGRAND)	ks	-2,000	8,65	-17,30
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 30				
17	K	Pol3	Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44 (referenčný výrobok : LEGRAND - NEPTO) -montáž	ks	-4,000	3,63	-14,52
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 3				
18	M	Pol4	Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44 (referenčný výrobok : LEGRAND - NEPTO)	ks	-4,000	3,74	-14,96
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút. silnoprád.rozvedky,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 4				
19	K	Pol42	Kábel CXKE-R-O 3x1,5 -montáž	m	-15,000	1,01	-15,15

DAG SLOVAKIA

Číslo účtu: 44 306 021 IČPH: SK202255

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 42				
20	M	Pol43	Kábel CXKE-R-O 3x1,5	m	-15,000	0,57	-8,55
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 43				
21	K	Pol44	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 -montáž	m	-50,000	1,01	-50,50
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 44				
22	M	Pol45	Kábel CXKE-R-J 3x1,5	m	-50,000	0,57	-28,50
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 45				
23	K	Pol46	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 -montáž	m	-20,000	1,01	-20,20
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 46				
24	M	Pol47	Kábel CXKE-R-J 3x2,5	m	-20,000	0,81	-16,20
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 47				
25	K	Pol58	Kábel CXKE-R-J 5x2,5 -montáž	m	-15,000	1,01	-15,15
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 58				
26	M	Pol59	Kábel CXKE-R-J 5x2,5	m	-15,000	1,32	-19,80
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 59				
27	K	Pol62	Kábel NHXH-O FE180/E90 3x1,5 vrátane funkčnej trasy E30 -montáž	m	-5,000	1,01	-5,05
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 62				
28	M	Pol63	Kábel NHXH-O FE180/E90 3x1,5 vrátane funkčnej trasy E30	m	-5,000	1,27	-6,35
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 63				
29	K	Pol84	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová -montáž	m	-20,000	1,08	-21,60
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 84				
30	M	Pol85	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	m	-20,000	0,68	-13,60
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 85				
31	K	Pol86	I-Trubka HFX 32 - bezhalogénová -montáž	m	-5,000	1,08	-5,40
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 86				
32	M	Pol87	I-Trubka HFX 32 - bezhalogénová	m	-5,000	1,02	-5,10
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.6 Umelé osvetelenie, vnút.silnoprúd.rozvody,bleskozvod a uzemnenie" Položka č. 87				

DAG SL
SIA, s.r.o.
44 806 021

PRÍKAZ K ZMENE č. 09
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 09
Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: Prípočet - Búranie priečok nad podhľadom a realizácia nového podhľadu	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Ide o nepredvídateľné a nevyhnutné (doplňujúce) stavebné práce. Skutočnosť bola zistená počas realizácie stavebných prác (búracie práce). Pri vyhotovení DRS ich nebolo možné predvídať, nakoľko konštrukcie sa nachádzali nad uzatvoreným celoplošným zníženým podhľadom z rabinového pletiva s omietkou. Nakoľko v DRS bolo uvažované s demontážou priečok z hľadiska BOZP, ako aj v zmysle dodržania technologických postupov je nevyhnutné tieto práce vykonať.	
Dohodnutá cena zmeny: 3 221,22 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet: 09 - Búranie priečok nad podhľadom a realizácia nového podhľadu	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
Odňačok pečiatky	
Súhlas zástupcu Objednávateľa: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06	Dátum 04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 08001 Prešov IČO: 44 88 60 21 IČ DPH: SK2022857749	04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor:	04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:	04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐	
Počet originálov: 4	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

09 - Pripočít - Búranie priečok nad podhl'adom a realizácia nového podhl'adu

JKSO:

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 221,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

3 221,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

Ing. Pavol Líška

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľanská 16, 820 01 Bratislava
IČO: 44 806 021 IČ DPH: SK2022857749

04 06 19

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

09 - Prípočet - Búranie priečok nad podhl'adom a realizácia nového podhl'adu

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 221,22

HSV - Práce a dodávky HSV

872,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

872,83

PSV - Práce a dodávky PSV

2 348,39

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

428,40

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 919,99

03.03.21 KČMH: SK2022657749

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

09 - Prípočet - Búranie priečok nad podhľadom a realizácia nového podhľadu

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 221,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

872,83

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

872,83

1	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t - B03	m2	18,620	1,76	32,77
	P	<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 102					
	W	Miestnosti 2.17 a 2.18					
	W	6,25*1				6,250	
	W	Miestnosti 2.19 a 2.20					
	W	6,25*1				6,250	
	W	Miestnosti 2.23 a 2.24					
	W	(3,775+2,345)*1				6,120	
	W	Súčet				18,620	
2	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	3,694	6,05	22,35
	P	<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZL 05 Rozbor TOV položky 05 - 02					
	W	Miestnosti 2.17 a 2.18					
	W	(6,25+1*2)*0,15				1,238	
	W	Miestnosti 2.19 a 2.20					
	W	(6,25+1*2)*0,15				1,238	
	W	Miestnosti 2.23 a 2.24					
	W	(3,775+2,345+1*2)*0,15				1,218	
	W	Súčet				3,694	
3	K	975032241	Podchytenie priečok do výšky 3 m pri hr. muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	18,620	31,79	591,93
	P	<i>Poznámka k položke:</i> Rozbor TOV položky 15 - 03					
	W	Miestnosti 2.17 a 2.18					
	W	6,25				6,250	
	W	Miestnosti 2.19 a 2.20					
	W	6,25				6,250	
	W	Miestnosti 2.23 a 2.24					
	W	(3,775+2,345)				6,120	
	W	Súčet				18,620	
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,514	6,65	30,02
	P	<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 165					
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,514	10,08	45,50
	P	<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 166					
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (uvažovaný odvoz na skládku vzd. do 20km, dodávateľ si nacení podľa svojich možností)	t	85,766	0,35	30,02
	P	<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 167					
	W	4,514*19 'Přepočítané koeficientom množstva				85,766	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,514	6,72	30,33
P Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 168							
8	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	36,112	0,75	27,08
P Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 169 VV 4,514*8 'Přepočítané koeficientom množstva 36,112							
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,514	13,92	62,83
P Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 170							
D PSV Práce a dodávky PSV							2 348,39
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							428,40
10	K	767581801	Demontaz podhládov všetkých druhov, -0,00500t - B22	m2	93,350	3,82	356,60
P Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 307 VV Búranie poškodeného podhľadu VV Miestnosti 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.23, 2.24, 2.12 VV 14,9+20,35+15+20,65+4,35+16,35+1,75 93,350 VV Súčet 93,350							
11	K	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t - B22	m2	93,350	0,74	69,08
P Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 308							
12	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,257	0,64	2,72
P Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 347							
D 763 Konštrukcie - drevostavby							1 919,99
13	K	763138220	Podhlád SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	82,460	21,36	1 761,35
P Poznámka k položke: Rozbor TOV položky 15 - 13 VV Nový podhlád do miestností po vybúraní pôvodného podhľadu VV Miestnosť 2.25 (nový stav) VV 14,9 14,900 VV Miestnosť 2.24 (nový stav) VV 20,35 20,350 VV Miestnosť 2.23 (nový stav) VV 36,56 36,560 VV Miestnosť 2.17 (nový stav) VV 10,65 10,650 VV Súčet 82,460							
14	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murívom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	73,800	1,36	100,37
P Poznámka k položke: Rozbor TOV položky 15 - 14 VV Miestnosť 2.25 (nový stav) VV 6,25*2+2,4*2 17,300 VV Miestnosť 2.24 (nový stav) VV 6,25*2+3,3*2 19,100 VV Miestnosť 2.23 (nový stav) VV 6,25*2+5,85*2 24,200 VV Miestnosť 2.17 (nový stav) VV 3,775*2+2,825*2 13,200 VV Súčet 73,800							
15	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	18,617	3,13	58,27
P Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 243							

PRÍKAZ K ZMENE č. 10
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 10 Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Prípočet - Búranie deliacich stien v úrovni svetlíkov	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Počas realizácie stavebných prác bol zistený nesúlad medzi DRS a výkazom výmer. Ide o nevyhnutné (doplňujúce) stavebné práce, ktoré počas vyhotovenia DRS nebolo možné predvídať. Časti strešnej konštrukcie boli zakryté, respektíve neboli viditeľné z dôvodu existujúcich vnútorných vstakov objektu.	
Dohodnutá cena zmeny: 987,01 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet: 10 - Búranie deliacich stien v úrovni svetlíkov	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
Odľáčok pečiatky BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06	Meho, Podpis Ing. Pavol Liška Dátum 04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor:	04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:	04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

10 - Búranie deliacich stien v úrovni svetlíkov

JKSO:

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

987,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

987,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

Ing. Pavol Liška

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voľňová 2, 820 05 Bratislava
IČO: 44 586 921 IČDPH: SK2022857749

04 0 6 1 9

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

10 - Búranie deliacich stien v úrovni svetlíkov

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

987,01

HSV - Práce a dodávky HSV

987,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

961,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24,96

99 - Presun hmôt HSV

0,29

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové I sty

Časť:

10 - Búranie deliacich stien v úrovni svetlíkov

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

987,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

987,01

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

961,76

1	K	962032631	Búranie muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	2,040	30,97	63,18
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:

Rozbor TOV položky 16 - 01

VV

Plocha predelovacej stany svetlika = 6,8 m2, 2 ks

VV

6,8*0,15*2

2,040

VV

Súčet

2,040

2	K	967031132	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	0,840	6,05	5,08
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

P

Poznámka k položke:

Rozbor TOV položky 16 - 02

VV

Spojenie búranej priečky s prievlakom a strechou (hrúbka steny 15 cm)

VV

0,15*(4,4+0,6*2)

0,840

VV

Súčet

0,840

3	K	979011131	Zvislá doprava sutiny ručne do 3,5 m	t	3,379	24,79	83,77
---	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:

Rozbor TOV položky 16 - 03

4	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3,5 m	t	6,758	7,78	52,58
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Rozbor TOV položky 16 - 04

VV

3,379*2 *Přepočítané koeficientom množstva

6,758

5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,379	10,08	34,06
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 166

6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (uvažovaný odvoz na skládku vzd. do 20km, dodávateľ si nacení podľa svojich možností)	t	64,201	0,35	22,47
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 167

VV

3,379*19 *Přepočítané koeficientom množstva

64,201

7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,379	6,72	22,71
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 168

8	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	27,032	0,75	20,27
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 169

VV

3,379*8 *Přepočítané koeficientom množstva

27,032

9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,379	13,92	47,04
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 170

10	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	10,000	61,06	610,60
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Rozbor TOV položky 16 - 10

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24,96

Výsledok výpočtu
Kód: 44 806 021 IČDPH: S7022657743

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,840	9,60	8,06
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
			<i>Rozbor TOV položky 16 - 11</i>				
	VV		Oprava prievlaku a obruby po vybúraní priečky				
	VV		0,15*(4,4+0,6*2)		0,840		
	VV		Súčet		0,840		
12	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	8,800	1,92	16,90
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
			<i>Rozbor TOV položky 16 - 12</i>				
	VV		Hrany prievlaku				
	VV		4,4*2		8,800		
	VV		Súčet		8,800		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,29
13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,088	3,32	0,29
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
			<i>Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"</i>				
			<i>Číslo položky 173</i>				

PRÍKAZ K ZMENE č. 11

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 11		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:			
Prípočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny: Ide o nevyhnutné (doplňujúce) stavebné práce, ktoré sa zistili počas realizácie stavebných prác. Pri realizácii burákových prác bola zistená nekvalitná skladba podlahy, ktorá sa nedala predvídať. Pre splnenie funkčnosti a technických vlastností podlahy je nevyhnutné zrealizovať uvedené stavebné práce.			
Dohodnutá cena zmeny: 7 665,47 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):			
Má dopad na celkový termín			
Prílohy: Rozpočet: 11 - Prípočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44			
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE			
Odtlačok pečiatky		Meno / Podpis	Dátum
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06		Ing. Pavol Liska	04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor:			04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:			04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

11 - Prípočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44

JKSO:

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 665,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 665,47	20,00%	1 533,09

Cena s DPH

v EUR

9 198,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

11 - Prípočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel
Karkoška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 665,47

HSV - Práce a dodávky HSV

7 444,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 568,03

2 - Zakladanie

1 239,83

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 418,19

99 - Presun hmôt HSV

218,81

PSV - Práce a dodávky PSV

220,61

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

220,61

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

Ing. Pavol Liška



DAG SLOVAKIA, a.s.
Kč: 44 806 071 IČO: SK2022657749

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

11 - Prípočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel
Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 665,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 444,86

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 568,03

1	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,783	49,92	688,05
<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 117 Miestnosť 1,44 (Nový stav) - Vybúranie zvyšných 220 mm betónu 62,65*0,220 Súčet							
					13,783		
					13,783		
2	K	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaŕiny so sieťou, výstužou alebo inými kovovými časťami hr. nad 100 mm	m3	13,783	44,06	607,28
<i>Poznámka k položke:</i> Rozbor TOV položky 17 - 02							
3	K	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	9,398	10,41	97,83
<i>Poznámka k položke:</i> Rozbor TOV položky 17 - 03 Miestnosť 1,44 (Nový stav) - Odstránenie štrkového násypu pod betónom 150 mm 62,65*0,15 Súčet							
					9,398		
					9,398		
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	43,480	6,65	289,14
<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 165							
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,480	10,08	438,28
<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 166							
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (uvažovaný odvoz na skládku vzd. do 20km, dodávateľ si nacení podľa svojich možností)	t	826,120	0,35	289,14
<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 167 43,48*19 'Přepočítané koeficientom množstva							
					826,120		
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,480	6,72	292,19
<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 168							
8	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	347,840	0,75	260,88
<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 169 43,48*8 'Přepočítané koeficientom množstva							
					347,840		
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	43,480	13,92	605,24
<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 170							
D 2 Zakladanie							
							1 239,83
10	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z homína súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	62,650	0,20	12,53

IC: 44 898 621 IČPH: SK2022057749

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka zo ZL 03</i> <i>Rozbor TOV položky 03 - 15</i>				
VV			Miestnosť 1,44 (Nový stav)				
VV			62,65		62,650		
VV			Súčet		62,650		
11	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	9,398	39,53	371,50
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka zo ZL 03</i> <i>Rozbor TOV položky 03 - 16</i>				
VV			Miestnosť 1,44 (Nový stav) - Nový štrkový násyp 150 mm				
VV			62,65*0,15		9,398		
VV			Súčet		9,398		
12	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	125,300	6,83	855,80
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka zo ZL 03 - Rozbor TOV položky 03 - 20</i>				
VV			Kari sieť v jednej vrstve				
VV			62,65*2		125,300		
VV			Súčet		125,300		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 418,19
13	K	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	18,750	120,89	2 266,69
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Robor TOV 17 - 13</i>				
VV			Miestnosť 1,44 (Nový stav) - Podkladný betón 300 mm				
VV			62,5*0,30		18,750		
VV			Súčet		18,750		
14	K	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm	m3	18,750	8,08	151,50
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Robor TOV 17 - 14</i>				
D	99		Presun hmôt HSV				218,81
15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	65,906	3,32	218,81
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"</i> <i>Číslo položky 173</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				220,61
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				220,61
16	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	62,500	0,34	21,25
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Robor TOV 17 - 15</i>				
17	M	693110001600	Geotextília polypropylénová	m2	71,875	2,70	194,06
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena Cenkros</i>				
VV			62,5*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		71,875		
18	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,153	2,46	5,30

PRÍKAZ K ZMENE č. 12

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 12	Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:			
Odpočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:			
Na základe zisteného stavu podlažia počas búracích prác, je nevyhnutná realizácia novej skladby podlahy.			
Dohodnutá cena zmeny: -878,08 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):			
Má dopad na celkový termín			
Prílohy: Rozpočet: 12 - Odpočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44			
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE			
Odličok pečiatky		Mend. Podpis	Dátum
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06		Ing. Pavol Liška	04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			
DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 08001 Prešov IČO: 44 886 021 / IČ DPH: SK2022857749		Ing. Adriana Orfánová	04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			
Súhlas Stavebný dozor:			04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:			04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐			
Počet originálov: 4			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

12 - Odpočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44

JKSO:

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-878,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-878,08	20,00%	-175,62

Cena s DPH

v EUR

-1 053,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 108
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 08 36 08
- 31 -

DAG SLOVAKIA, a.s.
IČO: 44 005 021 IČDPH: SK2022857749

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

12 - Odpočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-878,08

HSV - Práce a dodávky HSV

-878,08

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-837,50

99 - Presun hmôt HSV

-40,58

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

12 - Odpočet - Skladba podlahy v miestnosti 1.44

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-878,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

-878,08

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-837,50

1	K	631325743	Mazanina z betónu prostého (m2) vystužená oceľovými vláknami (refer. Dramix), betón tr. C 25/30 hr. min. 80 mm - P03a	m2	-62,500	13,40	-837,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 76

D 99

Presun hmôt HSV

-40,58

2	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-12,222	3,32	-40,58
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 173

PRÍKAZ K ZMENE č. 13 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	
	zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt:	Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 13	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:		
Prípočet - Úprava nadpražia pre polykarbonátové steny		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny:		
Ide o nevyhnutné a nepredvídateľné (doplňujúce) stavebné práce, ktoré sa zistili až pri osadzaní polykarbonátových stien. Bola zistená krivosť existujúceho nadpražia, ako aj jeho nedostatočná pevnosť. Aby boli tieto zistenia eliminované je nevyhnutné zabezpečiť existujúce nadpražie oceľovými L - profilmi v celom rozsahu nadpražia. Z dôvodu nedostatočnej pevnosti a krivosti existujúceho nadpražia je potrebné spevniť nadpražie oceľovým L- profilom. Práce je nevyhnutné realizovať, aby sme zabránili deformácii polykarbonátovej steny.		
Dohodnutá cena zmeny: 1 411,76 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):		
Má dopad na celkový termín		
Prílohy: Rozpočet: 13 - Prípočet - Úprava ostenia pre polykarbonátové steny		
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE		
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06 Odošiel pečaťky Mgr. Pavol Liška Ing. Pavol Liška Dátum 04 0 6 1 9		
Súhlas zástupcu Objednávateľa: 04 0 6 1 9		
Súhlas Stavebný dozor: 04 0 6 1 9		
Súhlas Projektant: 04 0 6 1 9		
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

13 - Prípočet - Úprava nadpražia pre polykarbonátové steny

JKSO:

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 411,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

1 411,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21
Objekt: Zmenové listy
Časť: 13 - Prípočet - Úprava nadpražia pre polykarbonátové steny

Miesto:	Ivanská cesta 21, Bratislava	Dátum:	
Objednávateľ:	Bratislavský samosprávny kraj	Projektant:	ENDORFINE, s.r.o.
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	1 411,76
PSV - Práce a dodávky PSV	1 411,76
764 - Konštrukcie klampiarske	1 411,76

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

13 - Prípočet - Úprava nadpražia pre polykarbonátové steny

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 411,76

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 411,76

D 764

Konštrukcie klampiarske

1 411,76

1	K	764430731	Montáž oplechovania muriva z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	78,800	12,21	962,15
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Rozbor TOV 23 - 01

VV

Nadpražie a ostenia polykarbonátových stien

VV

(33,4+3+3)*2

78,800

VV

Súčet

78,800

2	M	194240000200	Plech hliníkový, hr. 2,00 mm	m2	31,520	13,30	419,22
---	---	--------------	------------------------------	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena Cenkos

VV

78,8*0,4

31,520

VV

Súčet

31,520

3	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,814	2,20	30,39
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 248

PRÍKAZ K ZMENE č. 14
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 14 Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Prípočet - Odstránenie nevyhovujúcej podkladnej vrstvy podlahy, nový cementový poter a úprava drážok po montáži káblových rozvodov na 2NP	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Ide o nevyhnutné a nepredvídateľné (doplňujúce) stavebné práce. Počas realizácie búracích prác (demontáži nášlapnej vrstvy) na podlažiach 2. NP sa zistil nevyhovujúci stav pôvodného cementového poteru a je potrebné ho v niektorých miestach vybúrať, urobiť nový cementový poter a vyspraviť drážky po inštalácii ELI rozvodov. Z dôvodu dodržania technologických postupov je nevyhnutné zvetralé (nesúrodé) časti podlahy odstrániť - vybúrať a nahradiť ich novým cementovým poterom. Aby bol zachovaný technologický postup pri realizácii podlahy ako celku, je nevyhnutné drážky po inštalácii ELI rozvodov vyspraviť. Jedná sa o miestnosti 2.02;2.03;2.04;2.05;2.06;2.07;	
Dohodnutá cena zmeny: 10 390,66 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet: 14 - Prípočet - Odstránenie nevyhovujúcej podkladnej vrstvy podlahy, nový cementový poter a úprava drážok po montáži káblových rozvodov na 2NP	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa  Ing. Pavol Liška	04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa  Ing. Adrián	04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor  Ing. Jozef	04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:  Ing. Jozef	04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐	
Počet originálov: 4	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

**14 - Prípočet - Odstránenie nevyhovujúcej podkladnej vrstvy podlahy,
nový cementový poter a úprava drážok po montáži káblových rozvodov
na 2NP**

JKSO:

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 390,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 390,66	20,00%	2 078,13

Cena s DPH

v EUR

12 468,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

04 0 6 1 9

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt: Zmenové listy

Časť: **14 - Prípočet - Odstránenie nevyhovujúcej podkladnej vrstvy podlahy, nový cementový poter a úprava drážok po montáži káblových rozvodov na 2NP**

Miesto:	Ivanská cesta 21, Bratislava	Dátum:	
Objednávateľ:	Bratislavský samosprávny kraj	Projektant:	ENDORFINE, s.r.o.
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	10 390,66
A - Odstránenie nevyhovujúcej podlahy a nový cementový poter na 2.NP	9 221,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 169,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 983,91
99 - Presun hmôt HSV	68,61
B - Úprava drážok po inštalácii ELI rozvodov	1 169,14
6a - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 163,38
HSV - Práce a dodávky HSV	5,76

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

14 - Prípočet - Odstránenie nevyhovujúcej podkladnej vrstvy podlahy, nový cementový poter a úprava drážok po montáži káblových rozvodov na 2NP

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 390,66

D A

Odstránenie nevyhovujúcej podlahy a nový cementový poter na 2.NP

9 221,52

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 169,00

1	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín, betón s poterom, hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	11,325	81,48	922,76
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Rozbor TOV položky 24 - 01

VV

Miestnosť 2.01 (Búracie práce)

VV

161,5*0,03

4,845

VV

Miestnosť 2.02 (Búracie práce) 50 %

VV

76,6*0,030*0,5

1,149

VV

Miestnosť 2.03/2.04/2.05 (Búracie práce) 50 %

VV

(20,15+6+54,4)*0,030*0,5

1,208

VV

Miestnosť 2.06 (Búracie práce) - Pás

VV

2,5*9,33*0,030

0,700

VV

Miestnosť 2.07 (Búracie práce)

VV

114,10*0,03

3,423

VV

Súčet

11,325

2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,915	6,65	165,68
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 165

3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,915	10,08	251,14
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 166

4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (uvažovaný odvoz na skládku vzd. do 20km, dodávateľ si nacení podľa svojich možností)	t	473,385	0,35	165,68
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 167

VV

24,915*19 'Přepočítané koeficientom množstva

473,385

5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,915	6,72	167,43
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 168

6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	199,320	0,75	149,49
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 169

VV

24,915*8 'Přepočítané koeficientom množstva

199,320

7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	24,915	13,92	346,82
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 170

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 983,91

8	K	776990110	Ošetrenie podkladu penetrovaním	m2	351,480	0,65	228,46
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Rozbor TOV položky 24 - 08

VV

Miestnosť 2.01 (Nový stav) 100 %

VV

161,5

161,500

VV

Miestnosť 2.02 (Nový stav) 30 %

VV

76,6*0,3

22,980

DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO: 44 306 021 IČDPH: SK2022657749

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Miestnosť 2.03 (Nový stav) 100 %				
	VV		82,00		82,000		
	VV		Miestnosť 2.04 (Nový stav) 25 % + pás				
	VV		2,5*9,33		23,325		
	VV		109,9*0,25		27,475		
	VV		Miestnosť 2.05 (Nový stav) 30 %				
	VV		114,00*0,3		34,200		
	VV		Súčet		351,480		
9	K	632452245	Cementový poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. do 30 mm	m2	351,480	19,22	6 755,45
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Rozbor TOV položky 24 - C9				
	VV		Miestnosť 2.01 (Nový stav) 100 %				
	VV		161,5		161,500		
	VV		Miestnosť 2.02 (Nový stav) 30 %				
	VV		76,6*0,3		22,980		
	VV		Miestnosť 2.03 (Nový stav) 100 %				
	VV		82,00		82,000		
	VV		Miestnosť 2.04 (Nový stav) 25 % + pás				
	VV		2,5*9,33		23,325		
	VV		109,9*0,25		27,475		
	VV		Miestnosť 2.05 (Nový stav) 30 %				
	VV		114,00*0,3		34,200		
	VV		Súčet		351,480		
	D	99	Presun hmôt HSV				68,61
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,665	3,32	68,61
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 173				
	D	B	Úprava drážok po inštalácii ELI rozvodov				1 169,14
	D	6a	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 163,38
11	K	632450451	Opravný poter, zaliatie drážok v poteroch, hr. do 50 mm	m2	16,722	68,93	1 152,65
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Rozbor TOV 24 - 11				
	VV		Drážky šírka x dĺžka x počet ks				
	VV		0,14*3,5		0,490		
	VV		0,10*5		0,500		
	VV		0,08*(2,8)*2		0,448		
	VV		0,04*7,8		0,312		
	VV		0,04*(8,4+11,5)		0,796		
	VV		0,10*7,8		0,780		
	VV		0,03*7,7		0,231		
	VV		0,03*8,7*3		0,783		
	VV		0,03*(5,6+2)		0,228		
	VV		0,03*(8,7+9,5)		0,546		
	VV		0,14*8,2		1,148		
	VV		0,04*7,5		0,300		
	VV		0,06*1,7*2		0,204		
	VV		0,04*1,7*4		0,272		
	VV		0,04*(12,5+8,5)		0,840		
	VV		0,10*5		0,500		
	VV		0,04*(3,8)*3		0,456		
	VV		0,04*(5,3+8,3)		0,544		
	VV		0,13*3,71		0,482		
	VV		0,09*4,95		0,446		
	VV		0,07*(2,2*2)		0,308		
	VV		0,04*(1,5*4)		0,240		
	VV		0,04*7,3		0,292		
	VV		0,04*(8,3+8,3)		0,664		
	VV		0,16*3,3*3		1,584		
	VV		0,13*3,1*3		1,209		
	VV		0,08*1,5*3		0,360		
	VV		0,25*3,9		0,975		
	VV		0,16*1,8		0,288		
	VV		0,04*(3,05+2,15+7,2)		0,496		
	VV		Súčet		16,722		
12	K	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre opravný cementový poter cementovým mliekom	m2	16,772	0,64	10,73
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Rozbor TOV 24 - 12				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5,76
13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,736	3,32	5,76
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika" Číslo položky 173				

PRÍKAZ K ZMENE č. 15 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 15 Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Prípočet - Úprava skladby podlahy dobetónovaním	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Ide o nevyhnutné a nepredvídateľné (doplňujúce) stavebné práce. Počas realizácie búracích prác bola zistená skutočnosť, ktorá nemožňuje pôvodne plánovanému postupu realizácie stavebných prác v zmysle harmonogramu. V pôvodných podlahách, ktoré majú byť odstránené frézovaním sa nachádza veľké množstvo oceľových prvkov (skrutky, zbytky výstuží...), čo znemožnilo navrhnutý technologický postup. Na základe vyššie uvedeného je nevyhnutné pristúpiť k vybúraciu celej vrstvy podlahy a nahradiť ju novou podlahou so skladbou, ktorá bola konzultovaná so zodpovedným projektantom. Jedná sa o miestnosti 1.35;1.37;1.38+1.39;1.43;1.36;1.41;1.42.	
Dohodnutá cena zmeny: 21 537,79 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet: 15 - Prípočet - Úprava skladby podlahy dobetónovaním	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06 - 31 - Súhlas zástupcu Objednávateľa:	Odstavec pečiatky Mand. Podpis Ing. Pavol Lisák Dátum 04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor:	04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:	04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐	
Počet originálov: 4	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

15 - Prípočet - Úprava skladby podlahy dobetónovaním

JKSO:

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 537,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	21 537,79	20,00%	4 307,56

Cena s DPH

v EUR

25 845,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

Ing. Pavol Líška

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO: 44 886 021 IČDPH: SK222857749

04.06.19



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Čast':

15 - Prípočet - Úprava skladby podlahy dobetónovaním

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotovitel':

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 537,79

HSV - Práce a dodávky HSV

21 537,79

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20 055,93
2 - Zakladanie	259,21
99 - Presun hmôt HSV	1 222,65

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

15 - Prípočet - Úprava skladby podlahy dobetónovaním

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 537,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 537,79

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20 055,93

1	K	631313711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	152,447	124,02	18 906,48
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

P

Poznámka k položke:

Rozbor TOV 26 - 01

VV

Miestnosť 1,35 (Nový stav) (Hrúbka betónu v priemere 200 mm; Betón v rozpočte 80 mm = Dobetónovanie 120 mm)

VV

389,7*0,12

46,764

VV

Miestnosť 1,37 (Nový stav) (Hrúbka betónu v priemere 200 mm; Betón v rozpočte 80 mm = Dobetónovanie 120 mm)

VV

286,8*0,12

34,416

VV

Miestnosť 1,38 + 1,39 (Nový stav) (Hrúbka betónu v priemere 200 mm; Betón v rozpočte 80 mm = Dobetónovanie 120 mm)

VV

(215,9+14,35)*0,12

27,630

VV

Miestnosť 1,43 (Nový stav) (Hrúbka betónu v priemere 200 mm; Betón v rozpočte 80 mm = Dobetónovanie 120 mm)

VV

142,85*0,12

17,142

VV

Miestnosť 1,36 (Nový stav) (Hrúbka betónu v priemere 200 mm; Betón v rozpočte 80 mm = Dobetónovanie 120 mm)

VV

37,35*0,12

4,482

VV

Miestnosť 1,41 (Nový stav) (Hrúbka betónu v priemere 180 mm; Betón v rozpočte 80 mm = Dobetónovanie 100 mm)

VV

153,95*0,10

15,395

VV

Miestnosť 1,42 (Nový stav) (Hrúbka betónu v priemere 180 mm; Betón v rozpočte 80 mm = Dobetónovanie 100 mm)

VV

55,15*0,12

6,618

VV

Súčet

152,447

2	K	631319155	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny mín. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm	m3	152,447	7,54	1 149,45
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 71

D 2

Zakladanie

259,21

3	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 296,050	0,20	259,21
---	---	-----------	--	----	-----------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZL 03

Rozbor TOV položky 03 - 15

VV

Miestnosť 1,35 (Nový stav)

VV

389,7

389,700

VV

Miestnosť 1,37 (Nový stav)

VV

286,8

286,800

VV

Miestnosť 1,38 + 1,39 (Nový stav)

VV

215,9+14,35

230,250

VV

Miestnosť 1,43 (Nový stav)

VV

142,85

142,850

VV

Miestnosť 1,36 (Nový stav)

VV

37,35

37,350

VV

Miestnosť 1,41 (Nový stav)

VV

153,95

153,950

VV

Miestnosť 1,42 (Nový stav)

VV

55,15

55,150

VV

Súčet

1 296,050

D 99

Presun hmôt HSV

1 222,65

4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	368,269	3,32	1 222,65
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 173

PRÍKAZ K ZMENE č. 16

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 16		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:			
Prípočet - Náter ocelových profilov pod svetlíkmi			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:			
Ide o nevyhnutné a nepredvídateľné (doplňujúce) stavebné práce. Po demontáži stropnej konštrukcie bol zistený nevyhovujúci stav existujúcich stavebných prvkov - ocelových U - profilov (zakryté pod strešnou konštrukciou), ktoré staticky spolupôsobia so stropnou konštrukciou. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu týchto prvkov je nevyhnutné vykonať ošetrovanie a povrchovú úpravu - náter týchto prvkov.			
Dohodnutá cena zmeny: 2 156,61 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):			
Má dopad na celkový termín			
Prílohy: Rozpočet: 16 - Prípočet - Náter ocelových profilov pod svetlíkmi			
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE			
Odtlačok pečiatky		Meno/ Podpis	Dátum
 BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06		Ing. Pávo Liska	04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor:			04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:			04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický ☐			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

16 - Prípočet - Náter oceľových profilov pod svetlíkmi

JKSO:

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 156,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 156,61	20,00%	431,32

Cena s DPH

v EUR

2 587,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 06 08
- 31 -

DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO: 44 806 021 IČDPH: SK2022857749

04 0 6 1 9

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21
Objekt: Zmenové listy

Časť: 16 - Prípočet - Náter oceľových profilov pod svetlíkmi

Miesto:	Ivanská cesta 21, Bratislava	Dátum:	
Objednávateľ:	Bratislavský samosprávny kraj	Projektant:	ENDORFINE, s.r.o.
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 156,61
783 - Dokončovacie práce - nátery	935,37
HSV - Práce a dodávky HSV	1 221,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 221,20
99 - Presun hmôt HSV	0,04

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

16 - Prípočet - Náter ocel'ových profilov pod svetlíkmi

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel
Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 156,61

D		783	Dokončovacie práce - nátery	935,37			
1	K	783201813	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií (obrušením, očistením od hrdze)	m2	61,740	6,94	428,48

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 384
VV 0,45*4,4*9*2 35,640
VV 0,45*5,8*10 26,100
VV Súčet 61,740

2	K	783122952	Oprava náterov ocel'.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	61,740	8,21	506,89
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Rozbor TOV 28 - 02

D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 221,24			
---	--	-----	---------------------	----------	--	--	--

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 221,20			
3	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	20,000	61,06	1 221,20

P

Poznámka k položke:
Rozbor TOV 28 - 03

D		99	Presun hmôt HSV	0,04			
4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,013	3,32	0,04

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 173

PRÍKAZ K ZMENE č. 17
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 17 Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Prípočet - Vnútorne a vonkajšie parapety k exterierným zaskleným stenám	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Ide o nevyhnutné (doplňujúce) stavebné práce. Z dôvodu zamedzenia vnikania vody a vlhkosti je nevyhnutné okenné otvory zabezpečiť prekrytím - osadením parapetných dosák.	
Dohodnutá cena zmeny: 6 506,13 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet: 17 - Prípočet - Vnútorne a vonkajšie parapety k exterierným zaskleným stenám	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06	Ing. Pavol Džiska
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	04 0 6 1 9
DAG SLOVAKIA, a.s. IČO: 44 88 60 21 IČ DPH: SK2022857749	Ing. Tomáš Saloky
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor:	04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:	04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐	
Počet originálov: 4	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

17 - Prípočet - Vnútorne a vonkajšie parapety k exteriérovým zaskleneným stenám

JKSO:

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 506,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 506,13	20,00%	1 301,23

Cena s DPH

v EUR

7 807,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

Ing. Pavol Líška

04 0 6 1 9

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

17 - Prípočet - Vnútorne a vonkajšie parapety k exterierným zaskleneným stenám

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 506,13

PSV - Práce a dodávky PSV

6 506,13

764 - Konštrukcie klampiarske

2 899,16

766 - Konštrukcie stolárske

3 606,97

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

17 - Prípočet - Vnútorne a vonkajšie parapety k exterierným zaskleným stenám

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 506,13

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 506,13

D 764

Konštrukcie klampiarske

2 899,16

1	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm, biela	m	205,860	13,78	2 836,75
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

P Poznámka k položke:

Rozbor TOV 29 - 01

VV

ZE2a

33,440

VV

ZE2b

33,440

VV

ZE3

35,160

VV

ZE4

5,160

VV

ZE5

34,300

VV

ZE6

22,300

VV

ZE7

10,300

VV

ZE8

8,560

VV

ZE9

0,900

VV

ZE10

22,300

VV

Súčet

205,860

2	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28,368	2,20	62,41
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

P Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 248

D 766

Konštrukcie stolárske

3 606,97

3	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	205,860	5,51	1 134,29
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

P Poznámka k položke:

Rozbor TOV 29 - 03

VV

ZE2a

33,440

VV

ZE2b

33,440

VV

ZE3

35,160

VV

ZE4

5,160

VV

ZE5

34,300

VV

ZE6

22,300

VV

ZE7

10,300

VV

ZE8

8,560

VV

ZE9

0,900

VV

ZE10

22,300

VV

Súčet

205,860

4	M	611560000200	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná, biela	m	205,860	11,85	2 439,44
---	---	--------------	---	---	---------	-------	----------

P Poznámka k položke:

Jednotková cena Cenikras

5	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,737	0,93	33,24
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

P Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"

Číslo položky 265

PRÍKAZ K ZMENE č. 18
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 18 Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Prípočet - Preklady nad pôvodné dverné otvory	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Ide o nevyhnutné a nepredvídateľné (doplňujúce) stavebné práce. Skutočnosť, že existujúce stavebné otvory (dvere) sú bez prekladov bola zistená pri realizácii stavebných prác (búracie práce). Pri tvorbe DRS ich nebolo možné zistiť, nakoľko dverné otvory boli pri vyhotovení projektovej dokumentácie zakryté.	
Dohodnutá cena zmeny: 3 615,23 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet: 18 - Prípočet - Preklady nad pôvodné dverné otvory	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
Odtlačok pečiatky	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa  Ing. Pavol Liška	04 0 6 1 9
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	04 0 6 1 9
Súhlas Stavebný dozor:	04 0 6 1 9
Súhlas Projektant:	04 0 6 1 9
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

18 - Prípočet - Preklady nad pôvodné dverné otvory

JKSO:

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

36436771

IČ DPH:

SK 2022090653

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 615,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 615,23	20,00%	723,05

Cena s DPH

v EUR

4 338,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a.s.

Va
IČO: 44 806 021 IČDPH: SK2022857749

Ing. Pavol Liška

04 0 6 1 9

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

18 - Prípočet - Preklady nad pôvodné dverné otvory

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 615,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

231,09

HSV - Práce a dodávky HSV

3 384,14

4 - Vodorovné konštrukcie

3 307,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

68,46

99 - Presun hmôt HSV

7,88

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Objekt:

Zmenové listy

Časť:

18 - Prípočet - Preklady nad pôvodné dverné otvory

Miesto:

Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ENDORFINE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 615,23

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 231,09

1	K	974031664	Vysekávanie rýh v stenách pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	45,400	5,09	231,09
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 154
Oceľové preklady, dĺžka+2x200 mm x jednotková hmotnosť x počet ks /1000
VV
2.NP
VV 1,9*7 13,300
VV 2,1*1 2,100
VV 1,3*13 16,900
VV 1.NP
VV 1,9*2 3,800
VV 2,0*1 2,000
VV 2,1*2 4,200
VV 3,1*1 3,100
VV Súčet 45,400

D HSV Práce a dodávky HSV 3 384,14

D 4 Vodorovnné konštrukcie 3 307,80

2	K	413941200r	Montáž oceľových profilov a pomocných prvkov - preklady	t	1,067	1 648,78	1 759,25
---	---	------------	---	---	-------	----------	----------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 48
Oceľové preklady, dĺžka+2x200 mm x jednotková hmotnosť x počet ks /1000
VV 2.NP
VV 1,9*23,5*7/1000 0,313
VV 2,1*23,5*1/1000 0,049
VV 1,3*23,5*13/1000 0,397
VV 1.NP
VV 1,9*23,5*2/1000 0,089
VV 2,0*23,5*1/1000 0,047
VV 2,1*23,5*2/1000 0,099
VV 3,1*23,5*1/1000 0,073
VV Súčet 1,067

3	M	134808300r	Dodávka oceľových profilov a pomocných prvkov - preklady z ocele S235, vrátane povrchovej úpravy	t	1,174	1 319,04	1 548,55
---	---	------------	--	---	-------	----------	----------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 49
VV +10% detaily
VV 1,067*1,1 1,174
VV Súčet 1,174

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 68,46

4	K	612465131	Vnútoraná omietka stien vápenno-cementová, prehladená hr. 10 mm	m2	9,080	7,54	68,46
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 58
VV Nová omietka
VV 45,4*0,2 9,080
VV Súčet 9,080

D 99 Presun hmôt HSV 7,88

5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 2,5 m	t	0,74		7,88
---	---	-----------	--	---	------	--	------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu: "SO 01.1 Architektúra, statika"
Číslo položky 173

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 100
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
- 31 -

Ing. Pavol Liska



DAG SLOVAKIA, a.s.
IČO: 36 06 36 06 IČDPH: SK2022657749
