



ZMLUVA O DIELO č. 68/2018
na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami
obchodného zákonníka Číslo 513/91 Zb.

I. Zmluvne strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

V zastúpení: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta

Zástupca splnomocnený

na rokovanie vo veciach

a) zmluvných: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta

b) technických:

IČO: 00312347

DIČ: 2021133697

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu

IBAN: SK74 0200 0000 0036 9222 1456

1.2. ZHOTOVITEĽ:

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - vedúci člen skupiny

V zastúpení:

Ing. Peter Russegger, konateľ

Miroslav Dornák, konateľ

Zástupca splnomocnený

na rokovanie

vo veciach

a) zmluvných:

Ing. Mgr. Štefan Hozzán

b) technických:

Ing. Martin Sul'a

IČO:

34 112 103

DIČ:

2020358021

IČ DPH:

SK2020358021

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

Číslo účtu: IBAN:

SK22 0200 0000 002225903656

Zapísaný:

OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.13112/B

a

ALPINE Bau CZ a.s. _ člen skupiny

V zastúpení:

Ing. Peter Russegger, predseda predstavenstva

Miroslav Dornák, člen predstavenstva

Zástupca splnomocnený

na rokovanie

vo veciach

a) zmluvných:

Ing. Mgr. Stefan Hozzán

b) technických:

Ing. Martin Sul'a

IČO:

026 04 795

DIČ:

CZ02604795

IČ DPH:

-

Bankové spojenie:

Česka spořitelna a.s.

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

Číslo účtu : 994404-0745137001/0800
Zapísaný: Obchodný register Krajského súdu Ostrava
Spisová značka B 10609

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v podlimitnej zákazke s predmetom zákazky „**Cyklotrasy v obci Cífer, 1. etapa**“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 63/2018 zo dňa 29.3.2018, pod číslom 4468-WYP.
- 2.2 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov v rozsahu definovanom v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.5 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.
- 2.6 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.

Článok III

Čas plnenia

- 3.1 Do 30 dní od účinnosti zmluvy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 30 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty.
- 3.2 Objednávateľ upozorňuje na to, že na úsekoch predmetu zákazky:

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

- a) km 0,379 – km 0,407 (to je pri býv. hydinárskych)
- b) km 1,824 - km 2,067 (to je časť ulice M. R. Štefánika),

bude prebiehať súbežne s výstavbou tohto predmetu zákazky aj iná výstavba stavby: „Protipovodňové opatrenia v obci Cífer“. Objednávateľ upozorňuje, že v týchto úsekoch je potrebné najskôr vykonať práce súvisiace so zákazkou: „Protipovodňové opatrenia v obci Cífer“ a následne uskutočniť výstavbu stavby: „Cyklotrasy v obci Cífer, 1. Etapa“. Z uvedeného dôvodu objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska na týchto 2 úsekoch v závislosti od uskutočnenia výstavby protipovodňových opatrení. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko na týchto 2 úsekoch do 30 dní od doručenia výzvy verejného obstarávateľa a zhotoviteľ zhotoví obidva úseky tak, aby bola lehota na zhotovenie celého predmetu zákazky zachovaná - do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní)

3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:

- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
- b) prerušení prác na diele Objednávateľom;
- c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
- d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
- e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska.
- f) Nemožnosť vykonávať stavebné práce z dôvodu nepriaznivého počasia

3.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Objednávateľovi. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

3.6 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.

3.7 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

Článok IV

Cena diela

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	334 458,34 EUR
DPH 20 %:	66 891,66 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	401 350,00 EUR.

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
- b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
- c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
- d) **zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou** vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých prác, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela nasledovne: po odovzdaní a prevzatí celého diela objednávatel'om a po tom, ako budú riadne odstránené, pri preberaní diela uplatnené, vady alebo nedorobky, táto faktúra bude vystavená po riadnom odstránení pri preberaní diela uplatnených väd alebo nedorobkov. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohami budú:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávatel'ovi

5.2. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie diela;
- d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- e) dátum dodania plnenia;
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.4. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

5.6. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok VI

Spôsob realizácie diela.

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- Objednávateľovi,
- stavebnému dozoru,
- orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6

a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:

- projektovú dokumentáciu,
- stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým

- ich časový postup,
- údaje o počasi (maximálna a minimálna teplota),
- údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
- rozsah a kvalita prác,
- prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- prípadné vyjadrenia projektanta,
- prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázat zo stavby.

6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.

6.20 Zhotoviteľ bol povinný mať pred uzatvorením tejto zmluvy uzatvorené:

- poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH
- poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH.
- poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR.
- poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom Zmluvy voči zamestnancom Zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu Objednávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať.

6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §552 Obchodného zákonníka.

6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a



Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dna podpísania tejto Zmluvy obomi Zmluvnými stranami predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázat' zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.

6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch v znení neskorších predpisov a musia byť riadne certifikované. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na ne vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zariadenia všetkých prípojek a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

6.30 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami, službami kedykoľvek počas platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednávatelom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva SR v zastúpení Trnavským samosprávnym krajom ako poskytovateľom príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok (ktoré tvoria prílohu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. „Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu“ sú najmä:

- a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby
- b. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,
- d. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- e. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
- f. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
- g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až písmene d) tohto bodu v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto zmluvou, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.



Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

7.7 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto porušenie povinností.

7.8 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto zmluvy, je povinný objednávaťovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.

7.9 Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

7.10 Ku dňu účinnosti tejto zmluvy Zhotoviteľ zloží na bankový účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 10 % zo zmluvnej ceny s DPH, t.j. vo výške 40 135,-EUR s DPH. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 40 135,- EUR.. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

7.11 Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby zodpovedala požadovanej výške, teda,-EUR. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo.
- d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2.Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

8.4.Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve.

8.5.Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
- zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
- Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.6.Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

8.7.Obidve zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu odstúpením v prípade, ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami.

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady



Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- kópiu Stavebného denníka,
- doklady o uložení likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.

9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- základné údaje o diele,
- zoznam odovzdaných dokladov,
- prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - dĺžku trvania záručnej lehoty,
 - termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.

9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vadu diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie vád diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X.

Využitie subdodávateľov

10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

10.4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité na preukázanie splnenia podmienok účasti:

1 Ing. Martin Sul'a

2.. ..

3.

..... (uvedie sa podľa potreby)

11.2. Osoby uvedené v bode 11.1. zodpovedajú za plnenie tejto zmluvy spoločne a nerozdielne spolu so Zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods.1 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči Objednávateľovi splní Zhotoviteľ alebo jedna z osôb uvedených v bode 11.2. tejto zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti podielov na dlhu u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto Zmluvy. Osoby uvedené v bode 11.1. tejto zmluvy svoj záväzok spoločný so Zhotoviteľom potvrdzujú podpisom tejto Zmluvy.

11.3. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: Ing. Martin Sul'a (musí sa zhodovať s osobami, ktoré úspešný uchádzač uviedol pri preukazovaní splnenia podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti.)

11.4. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.5. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto



Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

11.6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávatelom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplataenie z akéhokoľvek dôvodu

11.7. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:

- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby dorúčením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

11.8. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

11.9. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

11.10. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.

11.11. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.12. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

Príloha č. 1 – Harmonogram prác

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č.3 – zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 – doklad o zložení realizačnej zábezpeky v súlade s článkom 7.10 zmluvy

11.13. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo strán.

11.14. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

- dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa a
- proces verejného obstarávania, výsledkom ktorého je uzavretie tejto zmluvy, bude preukázateľne schválený poskytovateľom finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky.

V Bratislave, dňa 25-10-2018

V Bratislave, dňa 15.10.2018

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....


.....

Ing. Juraš
na zákl.

Spoludlžník na strane Zhotoviteľa (počet podľa potreby)

..... (nevzťahuje sa)

SK SLOVAKIA, spol. s r. o.
IČO: 324/90
821 07 Bratislava
IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021
IČ DPH: SK2020358021

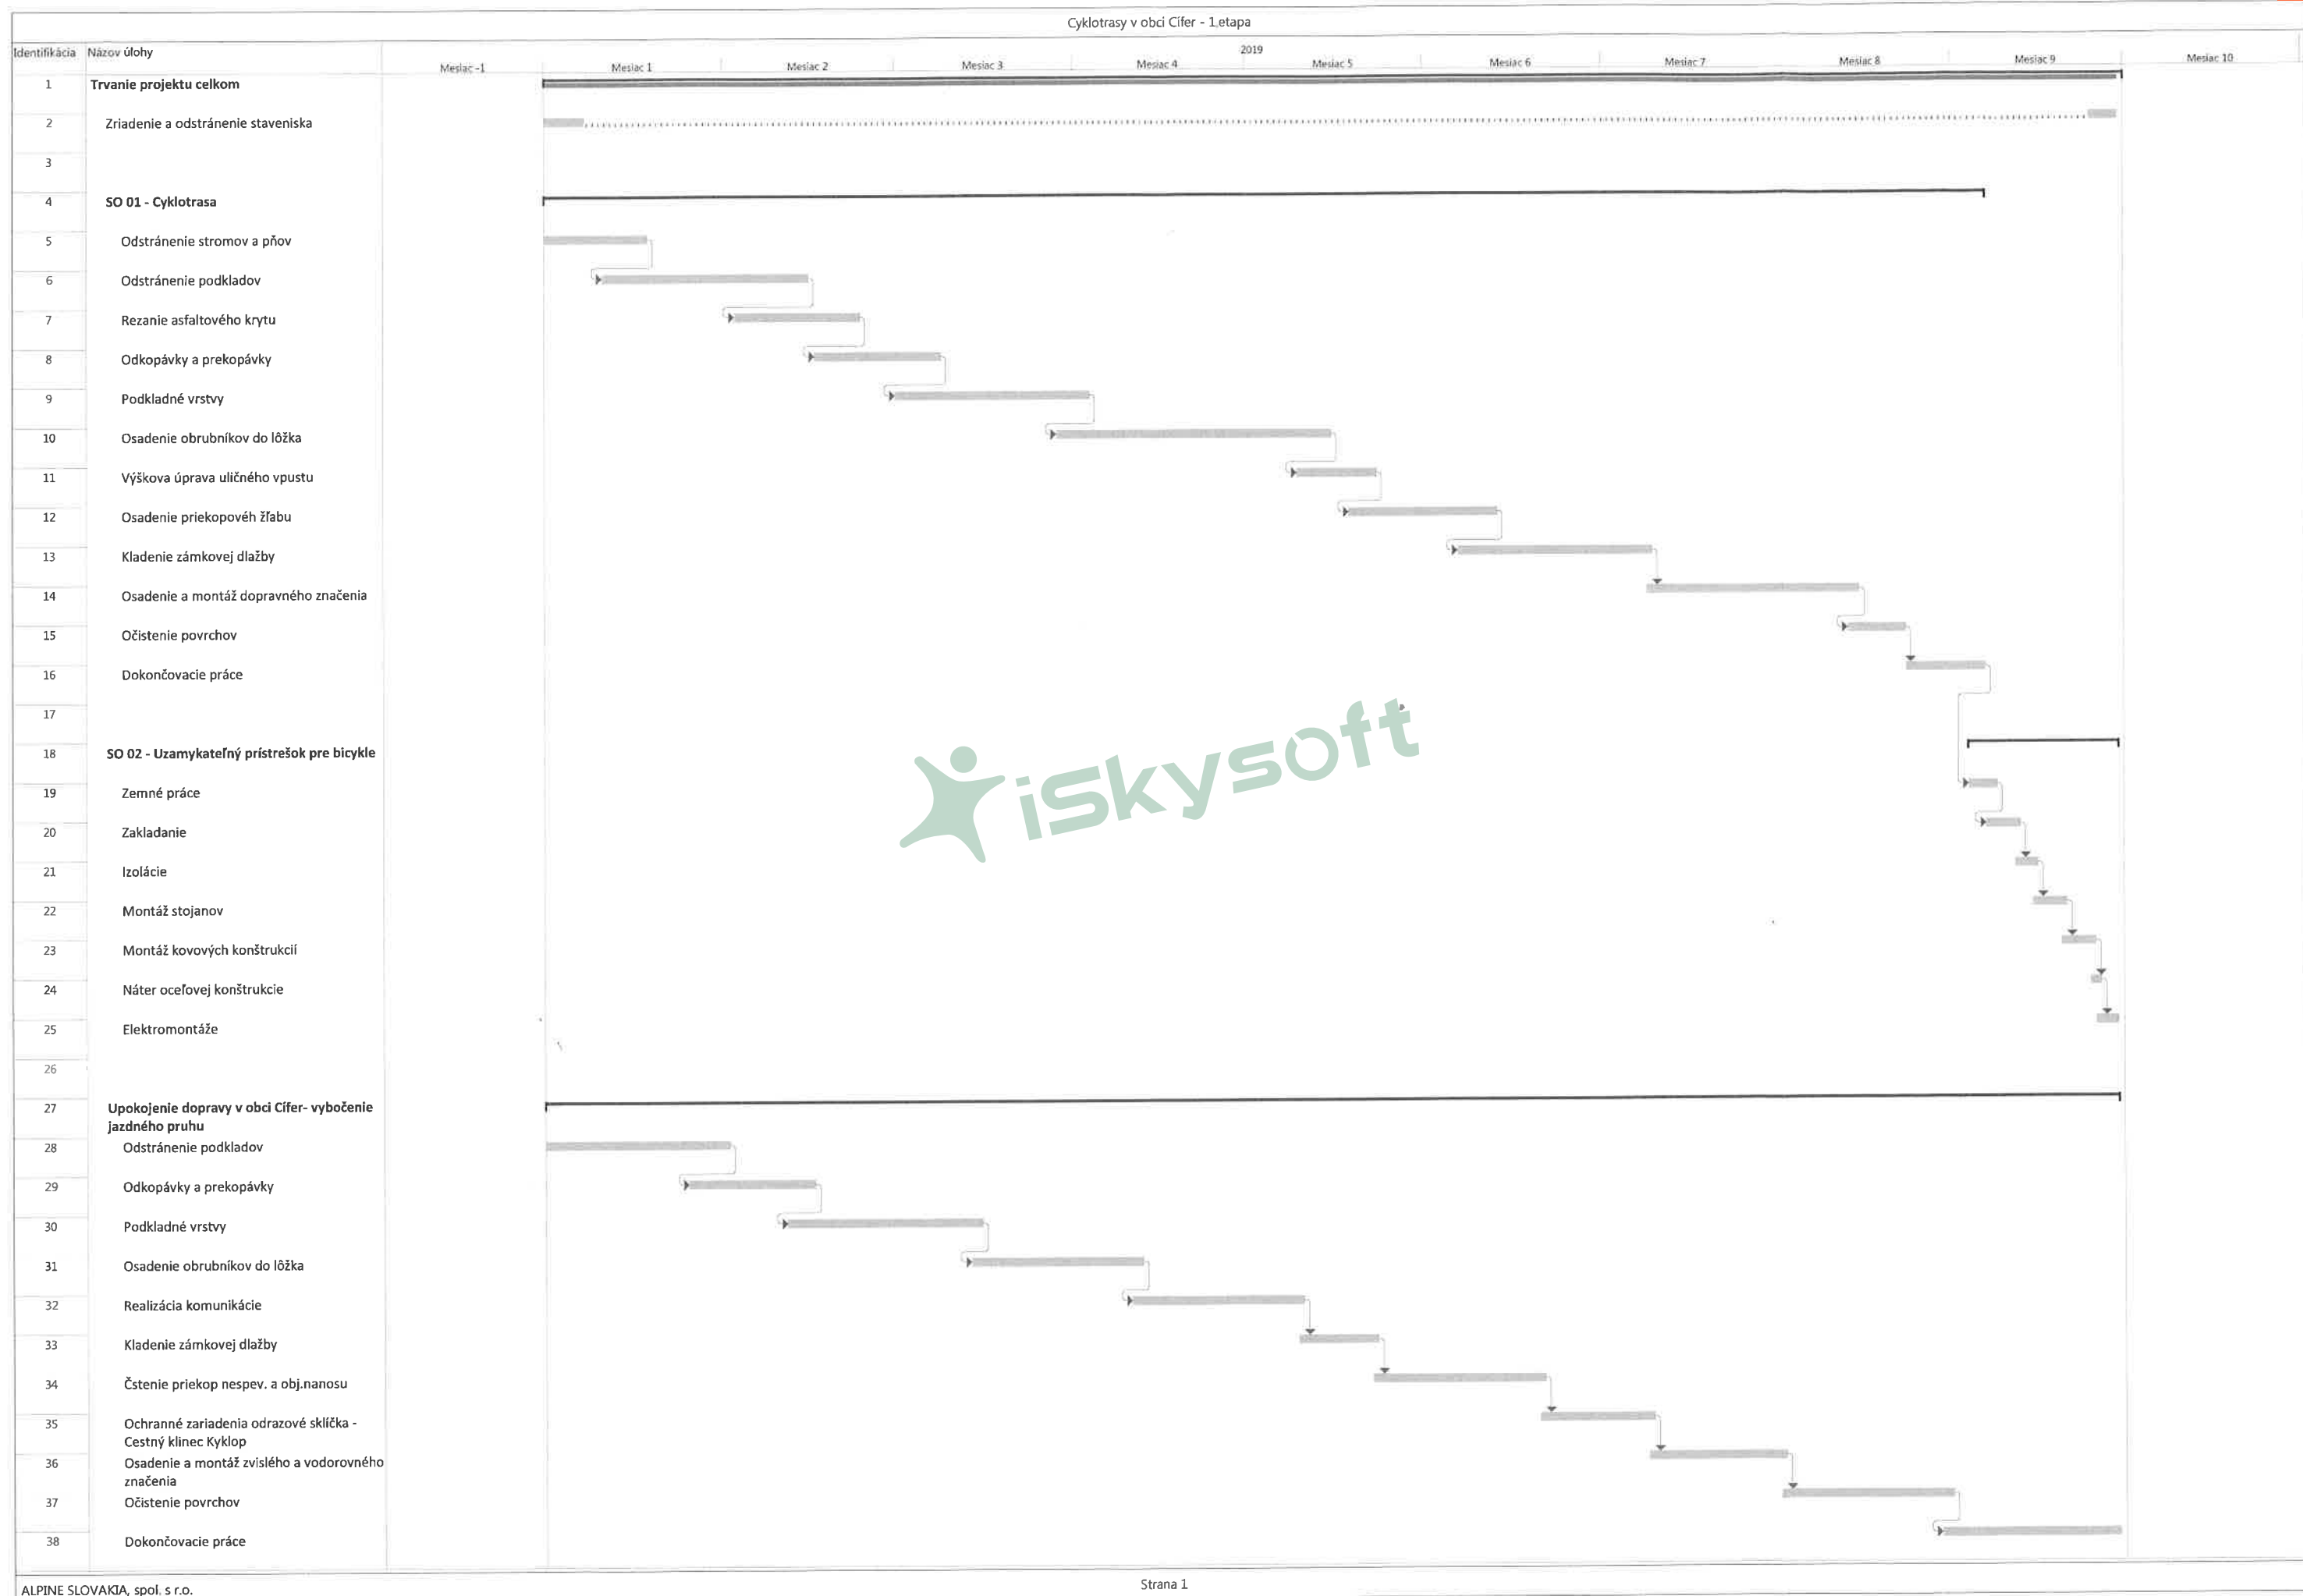

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	Cyklotrasy v obci Čífer - 1. etapa	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Čífer
Objednávateľ	Obec Čífer, nám. A. Hlinku 31, 91943	IČO	00312347
Projektant	Ing. Hana Fraňová	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Hradecký Rudolf, Ing. Válek Mária		

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR										
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	294 045,69	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,50%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	13 432,21	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	10 849,82	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		318 327,72	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 318 327,72 24 DPH 20,00 % z 318 327,72 63 665,54 25 Cena s DPH (r. 23-24) 381 993,26 E Prípochy a odpochy 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá določka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	---

Dátum a podpis Pečiatka 15.10.2018 	Pečiatka A) PINE SLOVAKIA, spol. s r. o. Vajnorská 324/90 821 07 Bratislava IČO: 34 112 103 DIČ: 2020358021 IČ DPH: SK2020358021
--	--

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Cyklotrasy v obci Cífer - 1.etapa
Objednávateľ: Obec Cífer, nám. A. Hlinku 31, 91943
Zhotoviteľ:

Dátum: 28.03.2018
Projektant: Ing.Hana Fraňová
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
678	Cyklotrasy v obci Cífer - 1.etapa	318 327,72	63 665,54	381 993,26	318 327,72	0,00	0,00
678001	SO-01 Cyklotrasa	288 611,78	57 722,36	346 334,14	288 611,78	0,00	0,00
678002	SO-02 Uzamykatelný prístrešok pre bicykle	29 715,94	5 943,19	35 659,13	29 715,94	0,00	0,00
<u>Celkom</u>		<u>318 327,72</u>	<u>63 665,54</u>	<u>381 993,26</u>	<u>318 327,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

iskysoft



ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
 Vičie hrdlo 324/90
 821 07 Bratislava
 IČO 34 112 103
 DIČ 2020358021
 IČ DPH SK2020358021

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Cyklotrasy v obci Cífer - 1.etapa	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Cyklotrasa	EČO	
Názov časti		Miesto	Cífer
Objednávateľ	Obec Cífer, nám. A. Hlinku 31, 91943	IČO	00312347
Projektant	Ing.Hana Fraňová	IČ DPH	
Zhotoviteľ		Dňa	
Rozpočet číslo	Spracoval		
	Hradečný Rudolf, Ing Váls Mária		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	288 611,78	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	3,50%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0.00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		288 611,78	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.ö.

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Včís. metro 324/90

821 01 Bratislava

IČO 34 112 103

DIČ 2020358021

IČ DPH SK2020358021

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	288 611,78
24	DPH 20,00 % z 288 611,78	57 722,36
25	Cena s DPH (r. 23-24)	346 334,14

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Cyklotrasy v obci Cífer - 1.etapa

Objekt: SO-01 Cyklotrasa

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Cífer, nám. A. Hlinku 31, 91943

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	288 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemné práce	43 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	5 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikácie	123 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rúrové vedenie	2 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	105 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Presun hmôt HSV	8 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>288 611,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

iskyssoft

ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.
 Vičie hrdlo 324/90
 821 07 Bratislava
 IČO 34 112 103
 DIČ: 2020358021
 IČ DPH: SK2020358031 ②

ZADANIE

Stavba: Cyklotrasy v obci Cífer - 1.etapa
 Objekt: SO-01 Cyklotrasa
 Časť:

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

288611,78

1

Zemné práce

43351,87

1	231	112101114	Vyrubanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	19,000	65,42	1242,98
2	231	112201114	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	19,000	42,31	803,89
3	221	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	224,210	8,55	1917,00
4	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	464,580	7,03	3266,00
5	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2	1610,250	3,34	5378,24
6	221	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.50 mm	m2	349,235	3,34	1166,44
7	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	494,250	3,44	1700,22
8	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	706,896	3,70	2615,52
9	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	187,660	3,56	668,07
10	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	1210,062	0,84	1016,45
11	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	178,745	0,84	150,15
12	001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	12100,620	0,39	4719,24
13	001	167102102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1210,062	10,16	12294,23
14	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	178,745	1,20	214,49
15	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1210,062	1,20	1452,07
16	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2178,112	0,00	0,00
17	001	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.150 mm	m2	1191,630	0,97	1155,88
18	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1191,630	0,83	989,05
19	231	183403131	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 1 až 2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1191,630	0,97	1155,88
20	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1191,630	0,13	154,91
21	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3583,890	0,07	250,87
22	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	1191,630	0,85	1012,89
23	005	0057211100	Trávové semeno	kg	5,362	5,11	27,40

4

Vodorovné konštrukcie

5454,06

24	321	457971112	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom	m2	3694,160	0,31	1145,19
25	693	6936654900	Separáčne, filtračné a spevňovacie geotextílie Geotiflex 300	m2	3989,693	1,08	4308,87

5

Komunikácie

123570,72

26	221	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	123,300	4,35	536,36
27	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	123,300	4,56	562,25
28	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	3694,160	6,57	24270,63
29	221	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm	m2	556,650	12,21	6796,70

30	221	572751111	Upravenie vytlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	15,600	77,86	1214,62
31	221	573191111	Náter infiltrračný katódnaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	1551,740	0,49	760,35
32	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	4250,810	0,46	1955,37
33	221	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. AC10 0, CA35/50 ,hr.40mm	m2	3694,160	7,24	26745,72
34	221	577141312	Betón asfaltový po zhutnení hr.50mm - doasfaltovanie	m2	1551,740	9,13	14167,39
35	221	577171225	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II AC 16P , CA35/50 , hr.80 mm	m2	3694,160	11,51	42519,78
36	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	123,300	12,58	1551,11
37	592	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	52,999	7,97	422,40
38	592	5922912900	Dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hrúbky 6 cm	m2	72,767	28,42	2068,04
8 Rúrové vedenie							2214,40
39	221	899331111	Výšková uprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	40,000	55,36	2214,40
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							105460,71
40	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	107,000	30,42	3254,94
41	404	4044522100	Značka dopravná	ks	103,000	48,67	5013,01
42	404	40446330001	Stĺpik na na zvislé dopravné značky	ks	76,000	24,34	1849,84
43	221	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt - termoplast - zelená retroreflexná farba	m2	208,970	21,90	4576,44
44	221	9157011111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt - termoplast - podfarbenie priechodcov pre chodcov červenou farbou	m2	69,470	21,90	1521,39
45	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	88,030	6,08	535,22
46	221	9157211111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - koridor pre cyklistov zn. V8c	ks	31,000	24,34	754,54
47	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	366,470	0,61	223,55
48	R	9157922	D+M reflexných dopravných gombíkov so železným jadrom	ks	73,000	26,77	1954,21
49	R	9157923	D+M parkovacích dorazových listů	ks	12,000	60,84	730,08
50	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	2390,480	10,11	24167,75
51	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	2414,385	1,59	3838,87
52	221	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	664,000	13,73	9116,72
53	592	5922903040	Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivý, hranatý, prechodový, prejazdový	ks	670,640	3,30	2213,11
54	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	105,530	0,00	0,00
55	221	919411111	D+M rámové priepustu IZM 200x150/120	ks	20,000	1220,37	24407,40
56	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm- pás šírky 250 mm	m	1396,940	4,19	5853,18
57	221	935111111	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	404,520	13,37	5408,43
58	592	5922764200	Tvárnica žlabovka plytká 200x80x500 mm	ks	809,040	4,34	3511,23
59	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	1551,740	0,17	263,80
60	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1551,740	0,17	263,80
61	015	953171001	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin alebo oceľového včítane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	40,000	18,49	739,60
62	552	5524333000	Poklop šacťy a šupátka	ks	40,000	131,59	5263,60
63	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2034,485	0,00	0,00
64	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	20344,850	0,00	0,00
65	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2034,485	0,00	0,00

66 013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2034,485	0,00	0,00
99		Presun hmôt HSV				8560,02
67 221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5219,526	1,64	8560,02

Celkom**288611,78**

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.
 sídlo: Hrdlo 322/90
 821 07 Bratislava
 IČO 34 112 103
 DIČ 2020358021
 IČ DPH SK2020358021 00


iSkysoft

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Cyklotrasy v obci Cífer - 1.etapa	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle	EČO	
Názov časti		Miesto	Cífer
Objednávateľ	Obec Cífer, nám. A. Hlinku 31, 91943	IČO	00312347
Projektant	Ing. Hana Fraňová	IČ DPH	
Zhotoviteľ		Dňa	
Rozpočet číslo	Spracoval		
	Hradečný Rudolf, Ing Váls Mária		

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant	D	Celkové náklady
Dátum a podpis	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	24	DPH 20,00 % z 29 715,94
	25	Cena s DPH (r. 23-24)
		35 659,13

Dátum a podpis	E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ	26	Dodávky objednávateľa
	27	Kízavá doložka
Dátum a podpis	28	Zvýhodnenie + -

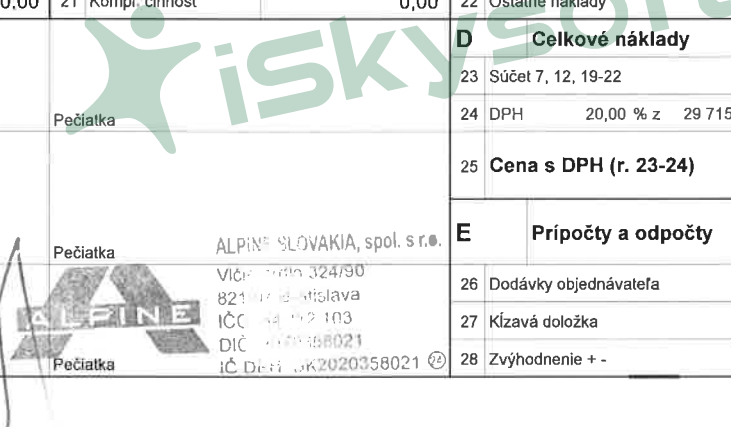

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasy v obci Cífer - 1.etapa

Objekt: SO-02 Uzamykatelný prístrešok pre bicykle

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Cífer, nám. A. Hlinku 31, 91943

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	5 433,91	0,00	0,00	0,00	0,000
1	Zemné práce	292,97	0,00	0,00	0,00	0,000
2	Zakladanie	1 361,02	0,00	0,00	0,00	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 055,11	0,00	0,00	0,00	0,000
99	Presun hmôt HSV	724,81	0,00	0,00	0,00	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	13 432,21	0,00	0,00	0,00	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	232,58	0,00	0,00	0,00	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	11 460,75	0,00	0,00	0,00	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	1 738,88	0,00	0,00	0,00	0,000
M	Práce a dodávky M	10 849,82	0,00	0,00	0,00	0,000
21-M	Elektromontáže	8 090,70	0,00	0,00	0,00	0,000
43-M	Montáž ocelových konštrukcií	2 759,12	0,00	0,00	0,00	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>29 715,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,000</u>

iskysort

ALPINE Slovakia, spol. s r.o.
 Vičie hrdlo 324/90
 821 07 Bratislava
 IČO 34 112 103
 DIČ 2020358021
 IČ DPH: SK2020358021

ZADANIE

Stavba: Cyklotrasy v obci Cífer - 1.etapa
 Objekt: SO-02 Uzamykatelný prístrešok pre bicykle
 Časť:

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					5433,91
1		Zemné práce					292,97
1 001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3					119,02
2 001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3					24,67
3 001	133201109	Príplatok k cenám za lepkivosť horniny					8,29
4 001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m					8,71
5 001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste					40,43
6 001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3					76,61
7 001	171201201	Oloženie sypaniny na skládky do 100 m3					15,24
8 001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné					0,00
2		Zakladanie					1361,02
9 002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku					140,84
10 011	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30					358,25
11 011	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce					116,16
12 011	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce					33,87
13 011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI					286,29
14 011	275321411	Betón základových páteí, železový (bez výstuže), tr.C 25/30					212,45
15 011	275351215	Debnenie základových páteí, zhotovenie-dielce					0,00
16 011	275351216	Debnenie základových páteí, odstránenie-dielce					0,00
17 011	275361821	Výstuž základových páteí z ocele 10505					213,16
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3055,11
18 R	911111111R	Montáž stojanov na bicykle so 45st. stáťim na 8 bicyklov s opornými oblúkmi					150,14
19	911111112R	Dodávka stojanov na bicykle so 45st. stáťim na 8 bicyklov s opornými oblúkmi					2036,90
20	911111113R	Servisný stojan na opravu bicyklov					868,07
99		Presun hmôt HSV					724,81
21 011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m					724,81
PSV		Práce a dodávky PSV					13432,21
711		Izolácie proti vode a vlhkosti					232,58
22 711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena					15,37
23 111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch					19,65
24 711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením					67,95
25 628	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35					101,61
26 711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením					12,10
27 628	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35					15,90
767		Konštrukcie doplnkové kovové					11460,75
28 767	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtovej siete spojených zváraním					868,58
29 159	1594112000R	Ťahokov MR/22x12x2/1,5/1000x2000					1085,28
30 767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg					7980,54

31	133	1333151200	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	t	0,039	1676,79	65,39
32	145	1457435500R	Profil štvorcový 40x3 mm	t	0,210	1816,68	381,50
33	145	1458439500R	Profil štvorcový 80x80x5	t	0,500	1725,43	862,72
34	145	1458333691R	P8-P10-P6- RD 15	t	0,105	2064,22	216,74

783 Dokončovacie práce - nátery

1738,88

35	R	783112110R	Náter ocelevej konštrukcie - žiarove pozinkovanie+náter	kg	915,200	1,90	1738,88
----	---	------------	---	----	---------	------	---------

M Práce a dodávky M

10849,82

21-M Elektromontáže

8090,70

36	R	211111111R	Montáž kamerového systému	ks	1,000	110,92	110,92
37		211111112R	Dodávka kamerového systému	ks	1,000	515,74	515,74
38	R	211111113R	Montáž elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,000	191,72	191,72
39		211111114R	Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,000	450,76	450,76
40	R	211111115R	Montáž softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,000	1650,37	1650,37
41		211111116R	Dodávka softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,000	3333,12	3333,12
42	R	211111117R	Montáž osvetlenia prístrešku	ks	1,000	106,76	106,76
43		211111118R	Dodávka osvetlenia prístrešku	ks	1,000	324,92	324,92
44	R	211111119R	Montáž solárneho panelu a príslušenstva Solar Frontier 165Wp	ks	3,000	87,67	263,01
45		211111120R	Dodávka solárneho panelu Solar Frontier 165Wp	ks	3,000	218,67	656,01
46		211111122R	Dodávka príslušenstva k solárnym panelom	ks	1,000	487,37	487,37

43-M Montáž oceľových konštrukcií

2759,12

47	943	430821105	Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 1,00 mm, hmot. 15,29 kg/m2	m2	26,200	29,28	767,14
48	138	1383873830R	Trapézový plech T160, 160/1,00 pozinkovaný -fasádne, strešné	m2	26,462	23,16	612,86
49	943	430844014R	Oplechovanie stien zvárané hr.2,00 mm	m2	27,810	18,89	525,33
50	137	1371468000	Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm	m2	30,591	27,91	853,79

Celkom

29715,94



ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
 Vičie hrdlo 324/90
 821 07 Bratislava
 IČO 34 112 103
 DIČ 2020358021
 IČ DPH SK2020358021

ZADANIE

Stavba: Upokojenie dopravy v obci Cífer- vybočenie jazdného pruhu

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum: 12. 3. 2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.40 mm, -0,10200t	m2	361,932	2,98	1 078,56
			"celá šírka vozovky" 55,94*6,47		361,932		
2	221	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.60 mm, -0,15300t	m2	180,966	3,71	671,38
			"rozšírený jazdný pruh" 55,94*6,47/2		180,966		
3	001	121101001	Dovoz ornice	m3	13,659	3,81	52,04
			"odstránenie ornice"-8,391		-8,391		
			"potrebná ornica"147*0,15		22,050		
			Súčet		13,659		
4	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,391	5,74	48,16
			"plocha rozšírenia v hr. 15cm" 55,94*0,15		8,391		
5	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	29,700	4,27	126,82
			"hr.novej komunikácie na ploche rozšírenia" 0,55*54		29,700		
6	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	29,700	0,32	9,50
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	29,700	1,17	34,75
8	R	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	504,900	0,39	196,91
			29,7*17		504,900		
9	001	167101101	m3	m3	29,700	2,37	70,39
10	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,700	0,00	0,00
11	231	180402111	Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine do 1:5	m2	151,403	0,85	128,69
12	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	5,880	5,11	30,05
			147*0,04		5,880		
13	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	54,000	0,84	45,36
14	001	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	147,000	1,07	157,29

5

Komunikácie

15	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	54,000	5,96	321,84
16	221	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	54,000	9,79	528,66
17	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	m2	54,000	0,49	26,46
18	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	660,712	0,46	303,93
			"plocha rozšírenia" 54		54,000		
			"nová plocha medzi ložnou a podkladom" 254,28		254,280		
			"plocha cesty bez ostrovčeka" 55,94*6,47-9,5		352,432		

ZADANIE

Stavba: Upokojenie dopravy v obci Cífer- vybočenie jazdného pruhu

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum: 12. 3. 2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Súčet		660,712		
19	221	577133111	Betón asfaltový modifik. po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.40mm	m2	406,432	8,79	3 572,54
			"plocha rozšírenia"54		54,000		
			"plocha celej vozovky bez ostrovčeka" 55,94*6,47-9,5		352,432		
			Súčet		406,432		
20	221	577151223	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžkový (ABL) hr.60 mm	m2	254,275	10,43	2 652,09
			"plocha rozšírenia" 54		54,000		
			"časť pruhu smer Trnava-preplátovanie"55,94*0,5		27,970		
			"pruh do centra bez plochy ostrovčeka" 55,94*3,25-9,5		172,305		
			Súčet		254,275		
21	221	577161114	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.70mm	m2	54,000	12,17	657,18
22	221	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2	m2	9,489	13,15	124,78
23	429	4298500345	Zámková dlažba 80mm farba sivá	m2	4,495	11,70	52,59
24	357	3570416690	Zámková dlažba 80mm farba červená	m2	4,994	13,82	69,02

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	221	912371111	Ochranné zariadenia odrazové sklička - Cestný klinec Kyklop	ks	19,000	24,34	462,46
			28,5/1,5		19,000		
26	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt a osadenie stĺpika	ks	10,000	36,50	365,00
27	404	4044715039	Dopravná značka kruhová, tr. 1, o700, + stĺpik a úpinky	ks	6,000	79,09	474,54
28	404	40447150391	Dopravná značka Z3b, tr. 1, + stĺpik a úpinky	ks	3,000	60,84	182,52
29	404	40447150392	Dopravná značka C29, tr. 1, 700x500+ stĺpik a úpinky	ks	1,000	73,01	73,01
30	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	20,930	2,43	50,86
31	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	37,175	8,52	316,73
			"stredová čiaraV13"0,5*41,85		20,925		
			"optické brzdy V16" 10*0,5*3,25		16,250		
			Súčet		37,175		
32	221	915x	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	2 027,18	2 027,18
33	221	916561111	Osadenie cestného obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	28,500	14,88	424,08
34	592	5921745000	Obrubník betónový nájazdový 22/25/15	ks	15,655	4,97	77,81
			15,5 * 1,01		15,655		
35	592	5921745001	Obrubník betónový bez skosenia 100/20/10	ks	7,070	3,30	23,33
			7 * 1,01		7,070		
36	592	5921745002	Obrubník betónový so skosením 100/26/15	ks	6,060	4,83	29,27
			6 * 1,01		6,060		
37	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,995	0,00	0,00
			(15,5+7+6)*0,07		1,995		
38	221	919731121	Vybúranie asfaltu pre uloženie zapusteného obrubníka	m3	0,123	257,50	31,67
			7*0,25*0,07		0,123		

ZADANIE

Stavba: Upokojenie dopravy v obci Cífer- vybočenie jazdného pruhu

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum: 12. 3. 2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
39	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,500	2,09	13,59
			"pruh v smere Trnava" 2*3,25		6,500		
40	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	62,440	2,93	182,95
			"pruh do obce" 55,94+2*3,25		62,440		
41	001	938902101	Cistenie priekop nespev. a obj.nanosu do 0, 15 m3/m	m	55,940	2,46	137,61
42	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	443,860	0,17	75,46
			"oba pôvodné pruhy bez ostrova" 55,94*6,5-9,5		354,110		
			"nová plocha" 54		54,000		
			"pruh do mesta, plocha pre optickú zábranu VDZ" 11*3,25		35,750		
			Súčet		443,860		
43	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	64,606	0,00	0,00
			"frézovanie v hr. 40mm" 0,102*361,94		36,918		
			"frézovanie asfaltu v hr. 60mm" 0,153*180,97		27,688		
			Súčet		64,606		

99

Presun hmôt HSV

44	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	147,082	1,52	223,56
----	-----	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkom

16 130,62



ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Víči hrdlo 321/90

821 07 Bratislava

IČO 34 112 103

DIČ 2020358021

IČ DPH SK2020358021 ②



ČESTNÉ VYHLÁSENIE
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe:

„Cyklotrasy v obci Cífer, 1. etapa“

Skupina uchádzačov:

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. – vedúci člen

Vičie hrdlo 324/90

821 07 Bratislava

ALPINE Bau CZ a.s. – člen


Jiráskova 613/13

Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí, ČR

týmto čestne vyhlasuje,

že práce na vyššie uvedenom diele zabezpečí vlastnými kapacitami bez využitia subdodávateľov.


 Ing. Juraj Pojezdál
 (na základe plnej moci)

V Bratislave, 15.10.2018



ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Vičie hrdlo 324/90

821 07 Bratislava

IČO 34 112 103

DIČ 2020358021

IČ DPH: SK2020358021 ②

Výpisy

10/23/18 07:16 Stránka

13

200 / 2225903656 / AL SK VUB				
Výpis	Dátum	IBAN	Počiatkový zostatok	
176 (Stránka 13)	10/22/18	SK22 0200 0000 0022 2590 3656		
Dátum splatnosti	Dátum spracovania	Účel platby	Vstupný text	Čísločka
10/22/18	10/22/18	VS:0034112103 KS:0000 SS:0000000000 /VS34112103/SS/KS zmluvna zabezpeka ALPINE SL EUR/ 40.135,00/ MCCT181022000008 Príkazea / Prijemca Účet partnera IBAN partnera Zákaznícka referencia KOP	zmluvna zabezpeka ALPINE S Obec Cifer 0200 0000003551609959 SK42 0200 0000 0035 5160 9959 9511439602227 210	-40,135.00
Debet celkom		Kredit celkom		Konečný zostatok
393,319.62		0.00		

