

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Cífer
Sídlo organizácie:	Námestie. A. Hlinku 31
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD. , starosta obce
IČO:	00312347
DIČ:	2021133697
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK74 0200 0000 0036 9222 1456
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Alena Olšová
b) technických:	Mgr. Michaela Strakošová

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov:	Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo:	Námestie A.Hlinku 169/31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
Zapísaná v:	Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
IČO:	55390048
DIČ:	2121997570
IČ DPH:	SK2121997570
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK68 0200 0000 0047 9382 1658
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Maroš Sagan, PhD.
b) technických:	
Číslo telefónu:	0915 930 737
Email:	

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

2.1 Táto zmluva sa uzatvára s cieľom realizácie stavby: **CÍFER – PÁC, rekonštrukcia mlynu na múzeum** v rámci projektu: **Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy**

2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu financovaného z nenávratného finančného príspevku na projekt:

kód projektu: NFP304020CKV5

názov projektu: Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy

názov aktivity: CÍFER – PÁC, rekonštrukcia mlynu na múzeum

výzva: INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 - VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2022/14

Predmet zmluvy je špecifikovaný v prílohe č. 1. a prílohe č. 2. tejto Zmluvy tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).

3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1 a č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:

- podľa projektovej dokumentácie – príloha č. 1;
- oceneného výkazu výmer – príloha č. 2.

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.

3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.

CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

- 5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	934 218,85	EUR
DPH 20%	186 843,77	EUR
Spolu	1 121 062,62	EUR

Slovom Miliónstodvadsaťjedentisícšesťdesiatdva EUR a šesťdesiatdva centov.

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.
- 5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom mesačne. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.8 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v

ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z nenávratného finančného príspevku.

- 5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) ITMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

- 5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:

- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávkach v dvoch vyhotoveniach;
- c) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.

- 5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 120 dní od prevzatia staveniska. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska.

- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémia, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podľa projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 Zmluvy).

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa

osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- h) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a

odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

- n) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.

8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

- 9.2 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Peter Bobek.
- 9.3 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.5 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.

- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
 - j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a. Kompletný stavebný denník;
 - b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 11.8. Uvedenie vád Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z nenávratného finančného príspevku z Programu cezhraničnej spolupráce CZ-SK a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

- Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. VIII, bod 7 tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sankcie/korekcie, ktorú mu udelí poskytovateľ NFP.

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy nebola poskytnutá dotácia na predmet plnenia a finančné možnosti objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;

- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
 - h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení.
- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné)

- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

 V Číferi, dňa 30.6.2023


Objednávateľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Starosta obce

V Číferi, dňa 30.6.2023

OBEČNÉ SLUŽBY ČÍFER, s.r.o.

 IČO: 55.390.048, DIČ: 2121997370
①

Zhotoviteľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Konateľ

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné)

Názov stavby:

**CÍFER- PÁC
REKONŠTRUKCIA MLYNU NA MÚZEUM**

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE



Handwritten signature in blue ink.

MIESTO STAVBY:
Cífer, časť Pác


STAVEBNÍK:
**Obecný úrad Cífer
Nám. A. Hlinku 31
919 43 Cífer**

GENERÁLNY PROJEKTANT:
**aarp, s.r.o.
Romanova 44
851 02 Bratislava**

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
Ing. arch. Radovan Panáček


DÁTUM:
august 2022

[8]

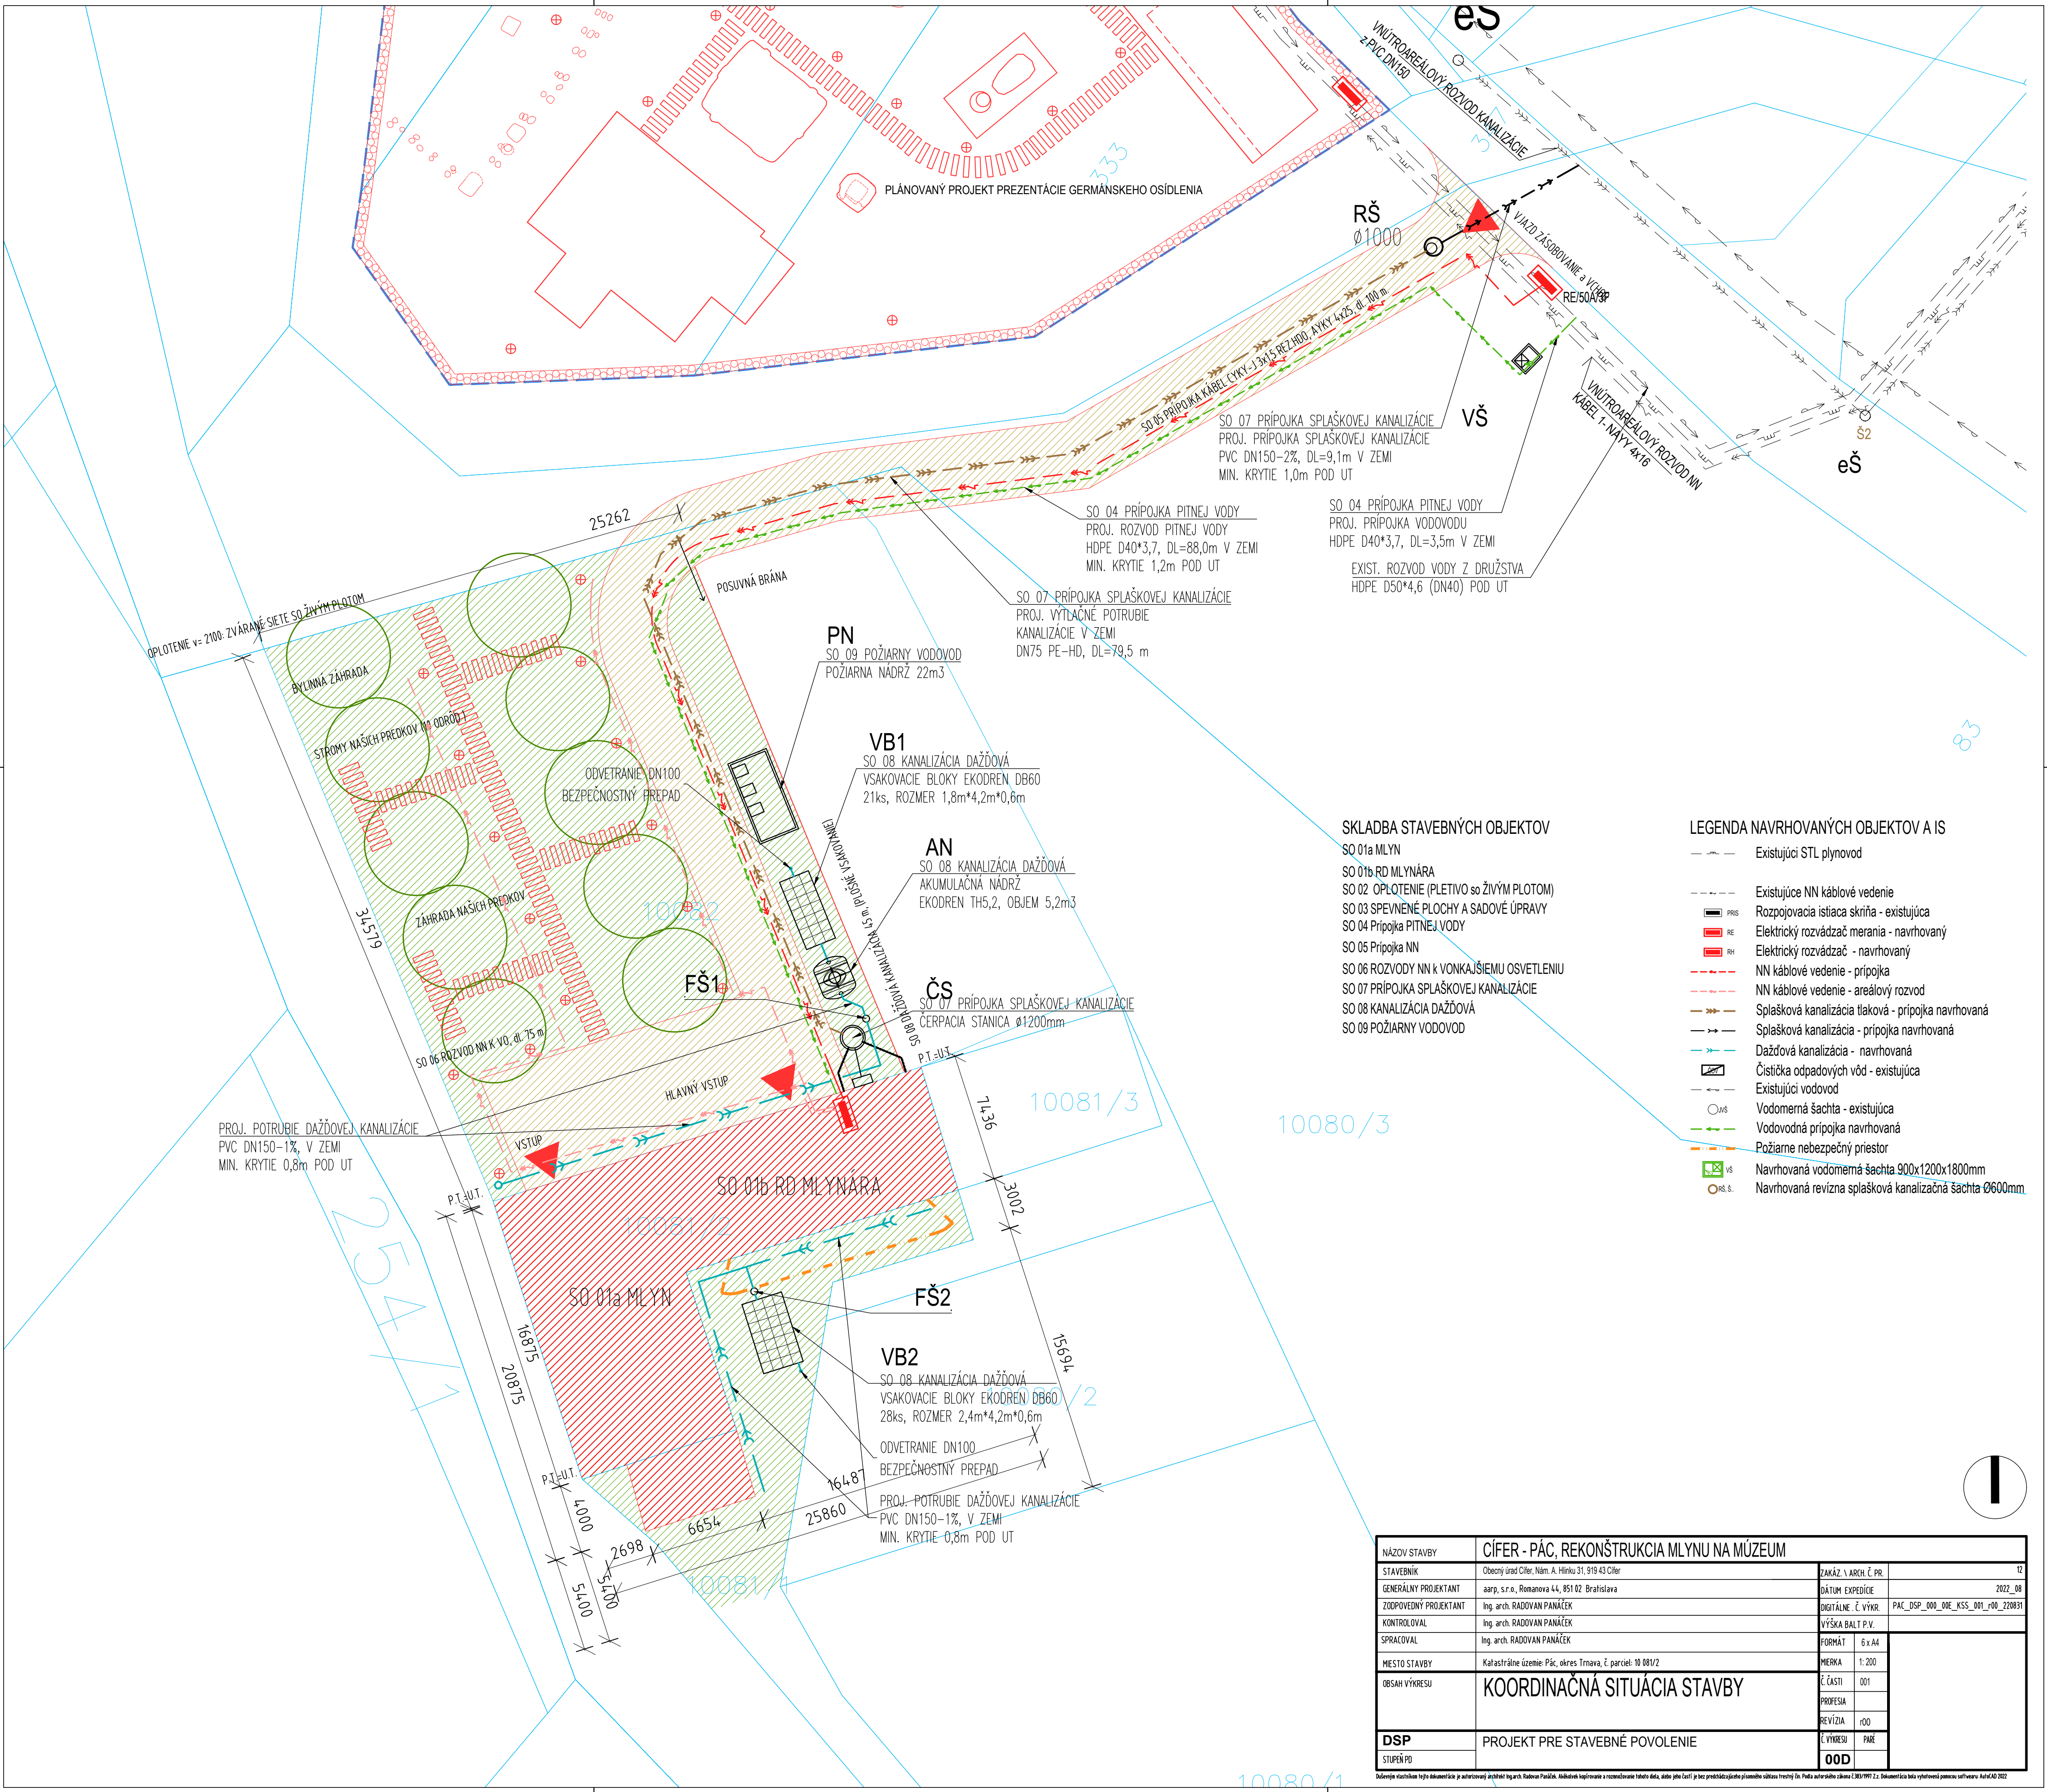

NÁZOV STAVBY	ČÍFER - PÁC, REKONŠTRUKCIA MLYNU NA MÚZEUM		
STAVENÍK	Obecný úrad Čífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Čífer	ZAKÁZ V ARCH. Č. PR.	12
GENERÁLNY PROJEKTANT	aarp, s.r.o., Romanova 44, 851 02 Bratislava	DÁTUM EXPEDÍCIE	2022_08
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. RADOVAN PANAČEK	DIGITÁLNE Č. VÝKR.	PAC_DSP_000_00E_KSS_001_r00_220831
KONTROLOVAL	Ing. arch. RADOVAN PANAČEK	VÝŠKA BALT P.V.	
SPRACOVAL	Ing. arch. RADOVAN PANAČEK	FORMÁT	6 x A4
MIESTO STAVBY	Katastrálne územie: Pác, okres Trnava, č. parcel: 10 081/2	MIERKA	1: 200
OBSAH VÝKRESU	KOORDINAČNÁ SITUÁCIA STAVBY	Č. ČASTI	001
		PROFESIA	
		REVÍZIA	r00
DSP	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	Č. VÝKRESU	PARE
STUPEŇ PD		OOD	

Dokladovanie vlastného listu dokumentácie je autorizovaný architekt Ing. arch. Radovan PANAČEK. Akékoľvek kopírovanie a rozmnožovanie tohoto diela, alebo jeho časti, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu trestný čin. Podľa autorského zákona č. 185/1997 Z.z. Dokumentácia bola vyhotovená pomocou softwaru AutoCAD 2022.

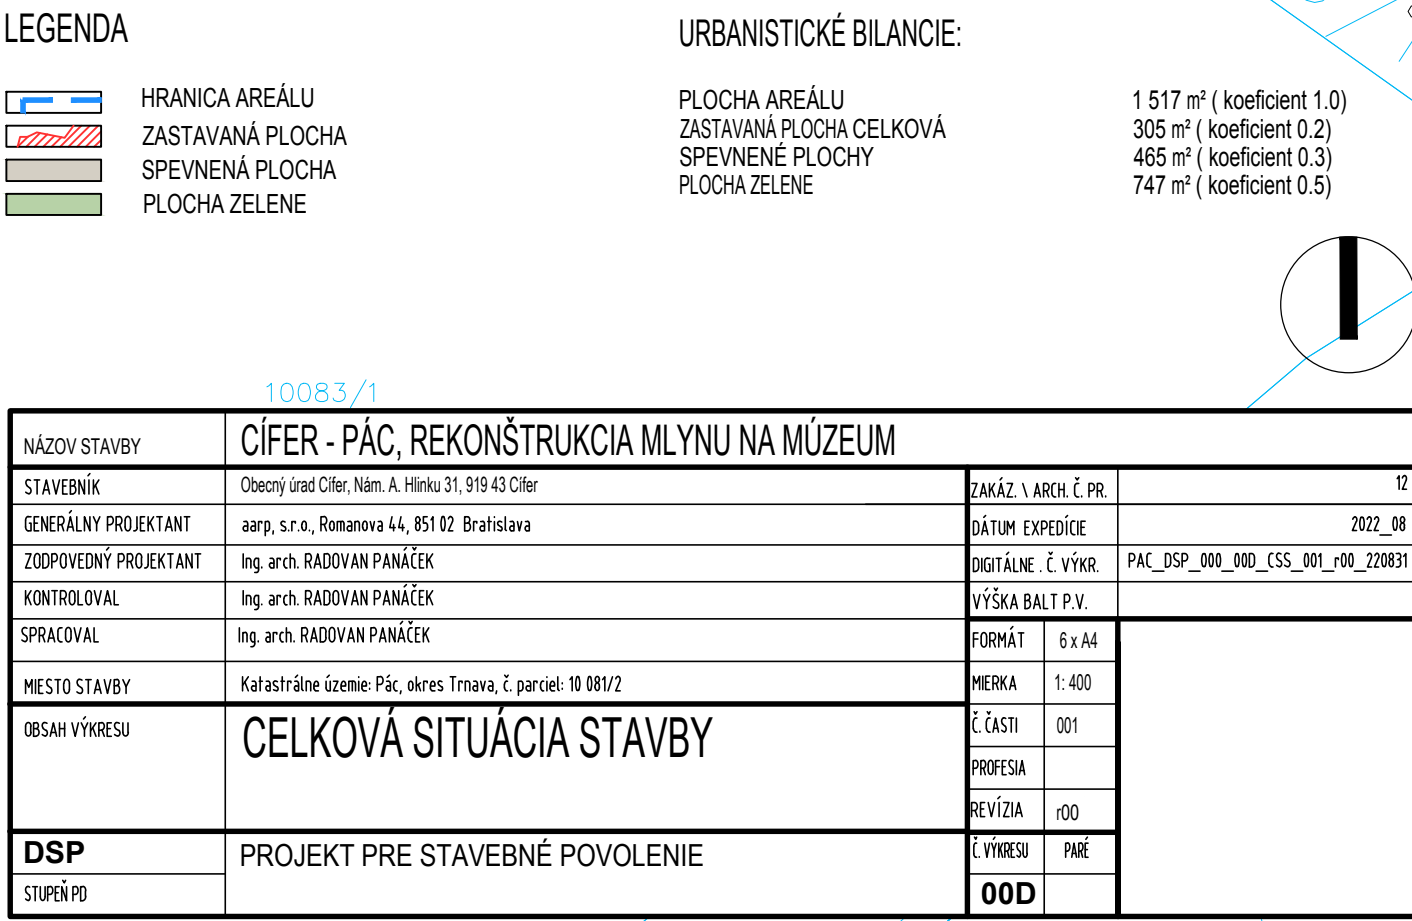

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum	JKSO	
		EČO	
		Miesto	k.ú.Pác, p.č. 10081/2
Objednávateľ	Obecný úrad Cífer	IČO	
Projektant	Ing.arch.R.Panáček		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Janák		
Rozpočet číslo		Dňa	14.06.2023
		Položiek	
		CPV	
		CPA	
		IČ DPH	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	104 884,31	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	274 857,93	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	239 520,67	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	228 035,44	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	56 910,00					18	VRN z rozpočtu		19 800,00
7	ZRN (r. 1-6)		904 208,35	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		19 800,00
20	HZS		10 210,50	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		934 218,85
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 934 218,85		186 843,77
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 121 062,62
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:

Dátum: 14.06.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
220727	Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum								
SO01	SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára	780 719,52	156 143,90	936 863,42	0,00	750 709,02	10 210,50	19 800,00	0,00
01	Búracie a stavebné práce	690 281,52	138 056,30	828 337,82	0,00	660 271,02	10 210,50	19 800,00	0,00
02	Zdravotechnika	9 384,00	1 876,80	11 260,80	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00
03	Vykurovanie	15 432,00	3 086,40	18 518,40	0,00	15 432,00	0,00	0,00	0,00
04	Vzduchotechnika	14 292,00	2 858,40	17 150,40	0,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00
05	Elektroinštalácia (slaboprúd, EPS, EZS)	17 616,00	3 523,20	21 139,20	0,00	17 616,00	0,00	0,00	0,00
06	Elektroinštalácia (silnoprúd)	33 714,00	6 742,80	40 456,80	0,00	33 714,00	0,00	0,00	0,00
SO02	Oplotenie	33 600,00	6 720,00	40 320,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
SO03	Spevnené plochy a sadové úpravy	68 857,33	13 771,47	82 628,80	0,00	68 857,33	0,00	0,00	0,00
SO04	Prípojka vody	9 750,00	1 950,00	11 700,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
SO05	Prípojka NN	5 580,00	1 116,00	6 696,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00
SO06	Prípojka kanalizácie	11 808,00	2 361,60	14 169,60	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
SO07	Dažďová kanalizácia	8 952,00	1 790,40	10 742,40	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00
SO08	Prívod požiarnej vody	14 952,00	2 990,40	17 942,40	0,00	14 952,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		934 218,85	186 843,77	1 121 062,62	0,00	904 208,35	10 210,50	19 800,00	0,00



ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:

Dátum: 14.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

291 776,197

1

Zemné práce

40 389,267

1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	174,440	93,742	16 352,354
2	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	52,332	18,740	980,702
3	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	11,200	119,570	1 339,184
4	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	11,200	11,835	132,552
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	185,640	5,962	1 106,786
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 299,480	0,599	778,389
7	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	11,200	11,993	134,322
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	334,152	22,425	7 493,359
9	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	142,400	42,919	6 111,666
10	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	256,320	23,252	5 959,953

2

Zakladanie

33 092,134

11	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	20,000	61,516	1 230,320
12	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	350,000	2,082	728,700
13	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	357,000	1,642	586,194
14	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	100,000	11,574	1 157,400
15	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	66,002	138,276	9 126,493
16	289471411.S	Vyplnenie trhlín v murive	m3	5,200	2 186,111	11 367,777
17	28947299r	Zošívanie trhlín	m	35,000	254,150	8 895,250

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

29 758,158

18	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	13,500	536,376	7 241,076
19	311231144.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 250x120x65 mm, na maltu MVC	m3	25,900	455,309	11 792,503
20	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	2,500	1 627,301	4 068,253
21	133830000100.S	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	2,700	2 465,306	6 656,326

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

71 760,126

22	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	25,400	2,217	56,312
23	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky ryhy	m2	63,000	14,841	934,983
24	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	862,450	4,635	3 997,456
25	612460366.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	m2	631,225	18,221	11 501,551
26	612466165.S	Vnútorný sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr. 30 mm	m2	231,225	55,663	12 870,677
27	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	25,400	2,221	56,413

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hlbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	548,300	5,437	2 981,107
29	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	548,300	3,186	1 746,884
30	622460366.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	m2	353,500	19,811	7 003,189
31	622466165.S	Vonkajší sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr. 30 mm	m2	95,300	57,025	5 434,483
32	622473255.S	Hydrofóbny impregnačný náter konštrukcií	m2	51,000	18,110	923,610
33	622473257.S	Čistiaci prostriedok na fasády, saponát bez fosfátov	m2	548,300	14,066	7 712,388
34	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	99,500	58,026	5 773,587
35	631312721.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 50 mm	m2	251,000	10,776	2 704,776
36	631316077.S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 120 mm	m2	251,000	22,256	5 586,256
37	631316113.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou, stredne ťažká prevádzka, hr. vsypu 2 mm	m2	251,000	8,876	2 227,876
38	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	251,000	0,198	49,698
39	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	288,650	0,689	198,880

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

84 491,371

40	938902071.S	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	1 661,750	4,396	7 305,053
41	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	516,500	5,775	2 982,788
42	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	516,500	28,567	14 754,856
43	962032231.S	Búranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	12,374	148,439	1 836,784
44	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	7,000	197,133	1 379,931
45	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,00600t	m2	251,000	7,352	1 845,352
46	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	4,160	16,583	68,985
47	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	4,200	21,330	89,586
48	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 410,750	3,798	5 358,029
49	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	231,144	29,499	6 818,517
50	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	231,144	9,260	2 140,393
51	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	231,144	17,950	4 149,035
52	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 080,296	0,585	1 216,973
53	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	231,144	13,314	3 077,451
54	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 311,440	1,496	3 457,914
55	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	231,144	6,369	1 472,156
56	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	231,144	69,000	15 948,936
57	979089714.S	Prenájom kontajneru	ks	46,000	172,500	7 935,000
58	981011313.S	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 20%, -0,35000t	m3	204,000	13,008	2 653,632

99

Presun hmôt HSV

32 285,141

59	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	703,043	45,922	32 285,141
----	-------------	---	---	---------	--------	------------

PSV

Práce a dodávky PSV

368 494,818

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

13 538,448

60	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	302,500	0,373	112,833
61	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,121	2 243,739	271,492
62	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	142,950	0,420	60,039
63	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,064	2 243,739	143,599

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
64	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	147,000	4,178	614,166
65	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	169,050	2,171	367,008
66	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	302,500	5,367	1 623,518
67	628320000200.S	Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	347,875	8,960	3 116,960
68	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	142,950	5,832	833,684
69	628320000200.S	Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	171,540	8,960	1 536,998
70	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	302,500	2,389	722,673
71	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	695,750	1,642	1 142,422
72	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	302,500	2,895	875,738
73	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	142,950	3,957	565,653
74	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	328,785	1,642	539,865
75	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	142,950	4,678	668,720
76	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	131,954	2,600	343,080

713

Izolácie tepelné

33 905,081

77	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	251,000	2,619	657,369
78	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	256,020	19,235	4 924,545
79	713131143.S	Montáž parotesnej fólie	m2	448,000	2,217	993,216
80	283290004300.S	Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou a lepiacou páskou, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	515,200	2,316	1 193,203
81	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	95,300	7,722	735,907
82	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	97,206	11,777	1 144,795
83	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	170,000	12,335	2 096,950
84	631650001900.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm pre šikmé strechy	m2	173,400	21,918	3 800,581
85	713161640.S	Zhotovenie nadkrokovovej izolácie obojstranne opatrená hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou hr. 80-120 mm	m2	278,000	10,812	3 005,736
86	283750005500.S	Nadkroková PIR izolácia hr. 100 mm obojstranne opatrená hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou	m2	283,560	48,069	13 630,446
87	311420000900.S	Vrut systémový s dvojitým závitom 7x 300 mm	ks	528,200	2,437	1 287,223
88	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	334,700	1,300	435,110

762

Konštrukcie tesárske

108 341,519

89	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	465,000	7,153	3 326,145
90	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	20,000	17,073	341,460
91	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	268,000	22,530	6 488,640
92	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	121,000	30,773	3 723,533
93	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	36,000	33,333	1 199,988
94	605120008000.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm	m3	9,063	1 084,830	9 831,814
95	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 792,000	2,198	3 938,816
96	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	672,000	3,340	2 244,480
97	605140002200.S	Laty zo smrekovca akosť I, prierez do 25 cm2, dl. 1000-1750 mm	m3	5,880	1 054,830	6 202,400
98	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	448,000	1,993	892,864
99	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	14,943	90,308	1 349,472
100	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	265,500	3,170	841,635

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	762812240.S	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz	m2	265,500	37,823	10 042,007
102	605460002800.S	Dosky hobľované z červeného smreku	m3	13,939	2 201,178	30 682,220
103	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	384,000	14,725	5 654,400
104	605120003100.S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	10,944	1 334,830	14 608,380
105	762822830.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,02500 t	m	384,000	6,010	2 307,840
106	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 036,761	4,500	4 665,425

763

Konštrukcie - drevostavby

18 574,655

107	763160002.S	Podkrovia SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD a krokových závesoch, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	448,000	41,214	18 463,872
108	998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	184,639	0,600	110,783

764

Konštrukcie klampiarske

27 223,604

109	764324514.S	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky r.š. 500 mm	m	76,000	85,982	6 534,632
110	764434504.S	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 500 mm	m	20,000	146,318	2 926,360
111	764354127.S	Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	76,000	81,562	6 198,712
112	764454124.S	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	m	58,000	96,606	5 603,148
113	764410360.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	16,000	39,084	625,344
114	764434505.S	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 600 mm	m	28,000	172,890	4 840,920
115	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	267,291	1,850	494,488

765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

48 392,964

116	765310107.S	Keramická krytina hladká, zložitých striech, sklon do 35°	m2	448,000	75,641	33 887,168
117	765310207.S	Hrebeň z hrebeňáčov pre krytinu hladkú, s použitím vetracieho pásu, sklon do 35°	m	38,000	69,760	2 650,880
118	765310387.S	Štitová hrana z okrajových škridiel pre krytinu hladkú	m	48,000	46,176	2 216,448
119	765311815.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej ułożenej na suchu do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	448,000	4,400	1 971,200
120	765901151.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 270 g/m2	m2	492,800	10,351	5 100,973
121	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	458,267	5,600	2 566,295

766

Konštrukcie stolárske

49 279,897

122	766621921.S	Oprava (obnova) okien	m2	17,825	518,394	9 240,373
123	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	25,415	203,320
124	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	23,108	184,864
125	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm	ks	8,000	414,796	3 318,368
126	766662911.S	Oprava (obnova) dverných kridiel	m2	2,000	524,284	1 048,568
127	766671002	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	9,000	112,261	1 010,349
128	611310006362	Strešné okno drevené kyvné VELUX GGL 306621 MK06, šxv 780x1180 mm, s diaľkovým ovládaním	ks	9,000	1 241,711	11 175,399
129	611380003300	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK06, šxv 780x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	9,000	114,525	1 030,725
130	611380006700	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 MK06, šxv 780x1880 mm	ks	9,000	75,063	675,567
131	611380008600	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK06, šxv 780x1180 mm	ks	9,000	32,665	293,985
132	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	8,000	71,908	575,264
133	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	8,000	171,367	1 370,936
134	766899r1	Montáž + Dodávka drev. schodiska	kpl	5,000	3 680,000	18 400,000
135	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	485,277	1,550	752,179

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
767		Konštrukcie doplnkové kovové	42 304,700			
136	767163045.S	Montáž zábradlia celoskleneného bez madla, výpiň bezpečnostné sklo, kotvenie do podlahy	m	25,000	62,767	1 569,175
137	553520001800.S	Zábradlie celosklenené, výpiň bezpečnostné sklo 8.2.8 číre, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, bez madla, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	25,000	287,500	7 187,500
138	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	83,480	24,797	2 070,054
139	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	87,654	2,425	212,561
140	283290006300	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	87,654	1,057	92,650
141	553410004.01	Vchodové dvere hliníkové 1200x2100	ks	1,000	1 897,500	1 897,500
142	553410004.02	Vchodové dvere hliníkové 2000x2250	ks	1,000	3 266,000	3 266,000
143	553410004.03	Okno hliníkové 1300x800	ks	4,000	506,000	2 024,000
144	553410004.04	Okno hliníkové 2000x1520	ks	2,000	1 449,000	2 898,000
145	553410004.05	Okno hliníkové 1000x1000	ks	3,000	517,500	1 552,500
146	553410004.06	Okno hliníkové 2000x2250	ks	3,000	2 587,500	7 762,500
147	55341099r	D + M Zasklená stena vo vstupe 3600+1800x3000	ks	1,000	10 580,000	10 580,000
148	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	411,124	2,900	1 192,260
771		Podlahy z dlaždíc	1 155,426			
149	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	18,300	25,578	468,077
150	597740001910.S	Dlaždice keramické	m2	18,666	34,500	643,977
151	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,121	3,900	43,372
781		Dokončovacie práce a obklady	6 153,723			
152	781445272.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 200x250 mm	m2	85,200	41,347	3 522,764
153	597640002100.S	Obkladačky keramické	m2	86,904	28,750	2 498,490
154	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,213	2,200	132,469
783		Nátery	14 431,127			
155	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	30,000	2,559	76,770
156	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	30,000	25,264	757,920
157	783271007.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	30,000	9,519	285,570
158	783601813.S	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní	m2	50,000	2,300	115,000
159	783625300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	50,000	20,547	1 027,350
160	783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	1 060,160	7,229	7 663,897
161	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 060,160	4,249	4 504,620
784		Maľby	5 193,674			
162	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	862,450	2,137	1 843,056
163	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	862,450	3,885	3 350,618
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby	10 210,500			
164	HZS000312	Demontáže, búracie a sekacie práce, výsprávky,	hod	450,000	22,690	10 210,500
VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	19 800,000			
165	001400031.S	Demontáž, repasovanie a spätná montáž pôvodných technologických zariadení	eur	1,000	19 800,000	19 800,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

690 281,515



✓

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:

Dátum: 14.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV** **9 384,000**

722 **Zdravotechnika - vnútorný vodovod** **9 384,000**

1	7221r	ZTI - vnútorná inštalácia	kpl	1,000	9 384,000	9 384,000
---	-------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkom **9 384,000**



[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:

Dátum: 14.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV** **15 432,000**

735 **Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá** **15 432,000**

1	73531r	UK	kpl	1,000	15 432,000	15 432,000
---	--------	----	-----	-------	------------	------------

Celkom **15 432,000**



ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:

Dátum: 14.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

14 292,000

769

Montáže vzduchotechnických zariadení

14 292,000

1	769pc	VZT	kpl	1,000	14 292,000	14 292,000
---	-------	-----	-----	-------	------------	------------

Celkom

14 292,000



42

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Elektroinštalácia (slaboprúd, EPS, EZS)

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:

Dátum: 14.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M	Práce a dodávky M	17 616,000
----------	--------------------------	-------------------

22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	17 616,000
-------------	---	-------------------

1	220pc	Slaboprúd, EPS, EZS	kpl	1,000	17 616,000	17 616,000
---	-------	---------------------	-----	-------	------------	------------

Celkom	17 616,000
---------------	-------------------



[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Elektroinštalácia (silnoprád)

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:

Dátum: 14.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 33 714,000

21-M Elektromontáže 33 714,000

1	210pc2	Elektroinštalácia - vnútorné rozvody a osvetlenie	kpl	1,000	17 244,000	17 244,000
2	210pc3	Elektroinštalácia - vonkajšie osvetlenie	kpl	1,000	8 886,000	8 886,000
3	210pc4	Bleskozvod	kpl	1,000	7 584,000	7 584,000

Celkom 33 714,000



Handwritten signature

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: Oplotenie

Dátum: 14.6.2023

Celkom	33 600,000
---------------	-------------------



ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:

Dátum: 14.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 42 504,040

1 Zemné práce 22 500,000

1	18040r	Sadové úpravy	m2	750,000	30,000	22 500,000
---	--------	---------------	----	---------	--------	------------

5 Komunikácie 20 004,040

2	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	140,000	27,334	3 826,760
3	564782411.S	Podklad pre mlátovú cestu z kameniva hrubého drveného fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 300 mm, plochy do 200 m2	m2	350,000	29,248	10 236,800
4	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	140,000	42,432	5 940,480

PSV Práce a dodávky PSV 26 353,292

772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 26 353,292

5	772506240.S	Kladenie dlažby z kameňa	m2	140,000	63,157	8 841,980
6	583840010900.S	Doska obkladová kamenná leštená B, stupeň 280, hrúbka 50 mm, z usadených hornín	m2	145,600	120,270	17 511,312

Celkom 68 857,332



ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: Prípojka vody

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:

Dátum: 14.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **9 750,000**

8 **Rúrové vedenie** **9 750,000**

1	871r2	Prípojka vodovodná	kpl	1,000	9 750,000	9 750,000
---	-------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkom **9 750,000**



10

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: Prípojka NN

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:

Dátum: 14.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M	Práce a dodávky M	5 580,000
----------	--------------------------	------------------

21-M	Elektromontáže	5 580,000
-------------	-----------------------	------------------

1	210pc1	Prípojka NN	kpl	1,000	5 580,000	5 580,000
---	--------	-------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkom	5 580,000
---------------	------------------



Handwritten signature in blue ink.

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: Prípojka kanalizácie

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:
Dátum: 14.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV					11 808,000
------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

8	Rúrové vedenie					11 808,000
----------	-----------------------	--	--	--	--	-------------------

1	871r3	Prípojka kanalizácie	kpl	1,000	11 808,000	11 808,000
---	-------	----------------------	-----	-------	------------	------------

Celkom						11 808,000
---------------	--	--	--	--	--	-------------------



ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:

Dátum: 14.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **8 952,000**

8 **Rúrové vedenie** **8 952,000**

1	871r4	Dažďová kanalizácia	kpl	1,000	8 952,000	8 952,000
---	-------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkom **8 952,000**



710

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
Objekt: Prívod požiarnej vody

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval:

Dátum: 14.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

14 952,000

8

Rúrové vedenie

14 952,000

1	871r1	Prívod požiarnej vody	kpl	1,000	14 952,000	14 952,000
---	-------	-----------------------	-----	-------	------------	------------

Celkom

14 952,000



[Handwritten signature]
